


巨理町エリア版<H30, 12月号> 仙台土木事務所が実施している復旧・復興事業の進捗

◆宮城県仙台土木事務所では被災の大きかった沿岸部の本格的な復旧・復興に全力で取り組んでいるところですが、巨理町の復興まちづくり計画に関連し、当所が実施している事業の進捗状況について、お知らせいたします。



巨理町復興整備計画

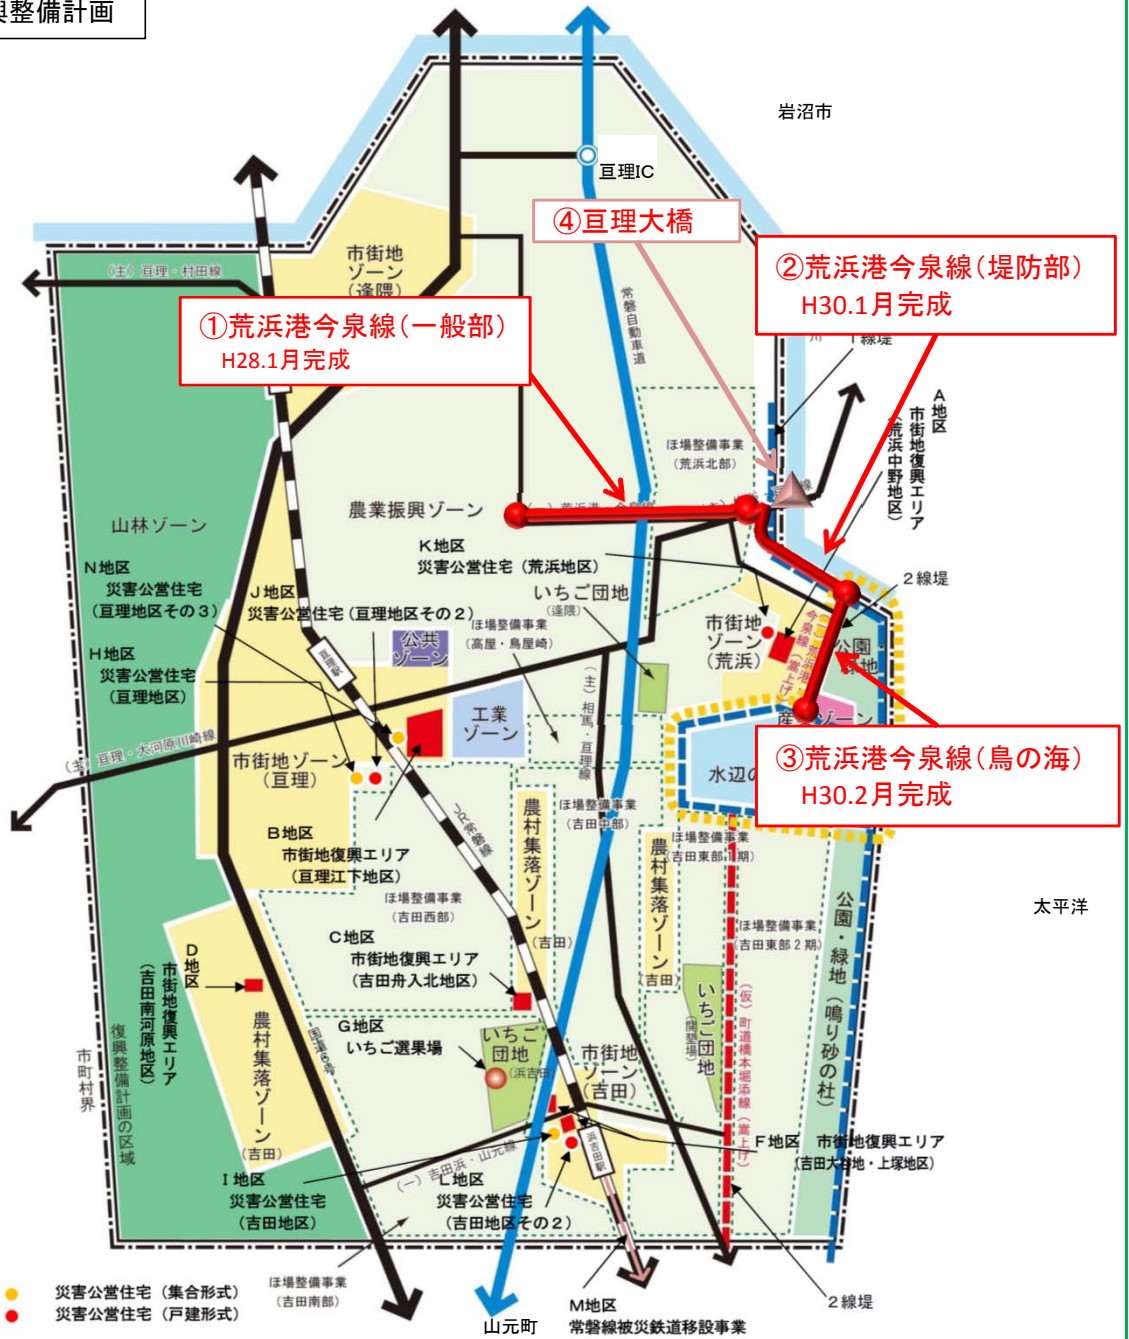

●主要事業一覧

【単位：%】

| 番号 | 路線名/河川名 | 工区名 | 事業目的 | 工事概要 | 進捗率 |
|----|---------|------|----------------|-------------------|-----|
| 1 | 荒浜港今泉線 | 一般部 | 復興(避難道路) | L=1,600m, W=11.5m | 100 |
| 2 | 荒浜港今泉線 | 堤防部 | 復興(避難道路) | L=1,750m, W=12.0m | 100 |
| 3 | 荒浜港今泉線 | 鳥の海 | 復興(避難道路, 多重防御) | L=750m, W=11.5m | 100 |
| 4 | 塩釜巨理線 | 巨理大橋 | 復興(耐震補強) | L=663.2m, RC巻立等 | 85 |

※主要事業のみ掲載しており、この他にも各種事業を実施しています。

| | | | | |
|---|--------|-----|------|----------------------------------|
| 1 | 荒浜港今泉線 | 一般部 | 工事概要 | 延長=1,600.0m 幅員=11.5m (2車線片側歩道付き) |
|---|--------|-----|------|----------------------------------|

完成予想図

【平常時】

【非常時】

着工前

【H28.1月完成】

完成済 平成28年1月15日に完成供用しました。

| | | | | |
|---|--------|-----|------|----------------------------------|
| 2 | 荒浜港今泉線 | 堤防部 | 工事概要 | 延長=1,750.0m 幅員=12.0m (2車線片側歩道付き) |
|---|--------|-----|------|----------------------------------|

完成予想図

着工前

【H28.12月】

完成済 平成30年1月末に完成しました。

| | | | | |
|---|--------|-----|------|--------------------------------|
| 3 | 荒浜港今泉線 | 鳥の海 | 工事概要 | 延長=750.0m 幅員=11.5m (2車線片側歩道付き) |
|---|--------|-----|------|--------------------------------|

完成予想図

【平常時】

【非常時】

着工前

【H28.12月】

完成済 平成30年2月末に完成しました。

| | | | | |
|---|-------|------|------|------------------------------|
| 4 | 塩釜巨理線 | 巨理大橋 | 工事概要 | L=663.2m、支承交換、縁端拡幅、塗装塗替、RC巻立 |
|---|-------|------|------|------------------------------|

完成予想図

予防保全

点検によりコンクリートに軽微なひびわれを発見

きちんと点検し、損傷が深刻化する前に修繕を実施します

着工前

【H29.3月】

◆現状（今こんな事やっています）
 全8橋脚中6橋脚の補強工事が完了しており、H30年5月に残りの橋脚2基の仮締切を設置し、現在は仮設構台を設置しています。

| | | | | |
|---|--------|-----|------|----------------------------------|
| 1 | 荒浜港今泉線 | 一般部 | 工事概要 | 延長=1,600.0m 幅員=11.5m (2車線片側歩道付き) |
|---|--------|-----|------|----------------------------------|

NEXT



| | | | | |
|---|--------|-----|------|----------------------------------|
| 2 | 荒浜港今泉線 | 堤防部 | 工事概要 | 延長=1,750.0m 幅員=12.0m (2車線片側歩道付き) |
|---|--------|-----|------|----------------------------------|

NEXT



完成済 平成30年1月末に完成しました。

| | | | | |
|---|--------|-----|------|--------------------------------|
| 3 | 荒浜港今泉線 | 鳥の海 | 工事概要 | 延長=750.0m 幅員=11.5m (2車線片側歩道付き) |
|---|--------|-----|------|--------------------------------|

NEXT



完成済 平成30年2月末に完成しました。

| | | | | |
|---|-------|------|------|------------------------------|
| 4 | 塩釜巨理線 | 巨理大橋 | 工事概要 | L=663.2m、支承交換、縁端拡幅、塗装塗替、RC巻立 |
|---|-------|------|------|------------------------------|

NEXT



◆今後（来年の夏頃にはこんな感じになる見込みです）
今後、橋脚(2基)の巻立やフーチングの増厚をして、H31年6月の出水期前に完成させる予定です。

空白のページ



宮城県土木部
