

現在：7工区施工中
完成：4工区

川内沢ダムPR動画「見えるダム事業」公開中！



川内沢ダム建設事業全体平面図

【②川内沢ダム取水放流設備工事 施工状況】



川内沢ダム管理事務所等新築工事
(株)渡辺工務店
R6.9.12~R7.8.29
【進捗率 40%】 ④

川内沢ダム管理設備新設工事
富士通 Japan(株)
R6.10.18~R8.3.25
【進捗率 45%】 ③


川内沢ダム取水放流設備工事
奥田建設(株)
R5.10.6~R8.3.25
【進捗率 19%】 ②

川内沢ダム本体工事
西松・奥田・グリーン企画特定JV
R4.10.20~R9.3.31
【進捗率 45%】 ①

【現時点の見どころ】

- ①川内沢ダム本体工事 施工状況
- ②川内沢ダム取水放流設備工事 施工状況
- ④川内沢ダム管理事務所等新築工事 施工状況

【④川内沢ダム管理事務所等新築工事 施工状況】

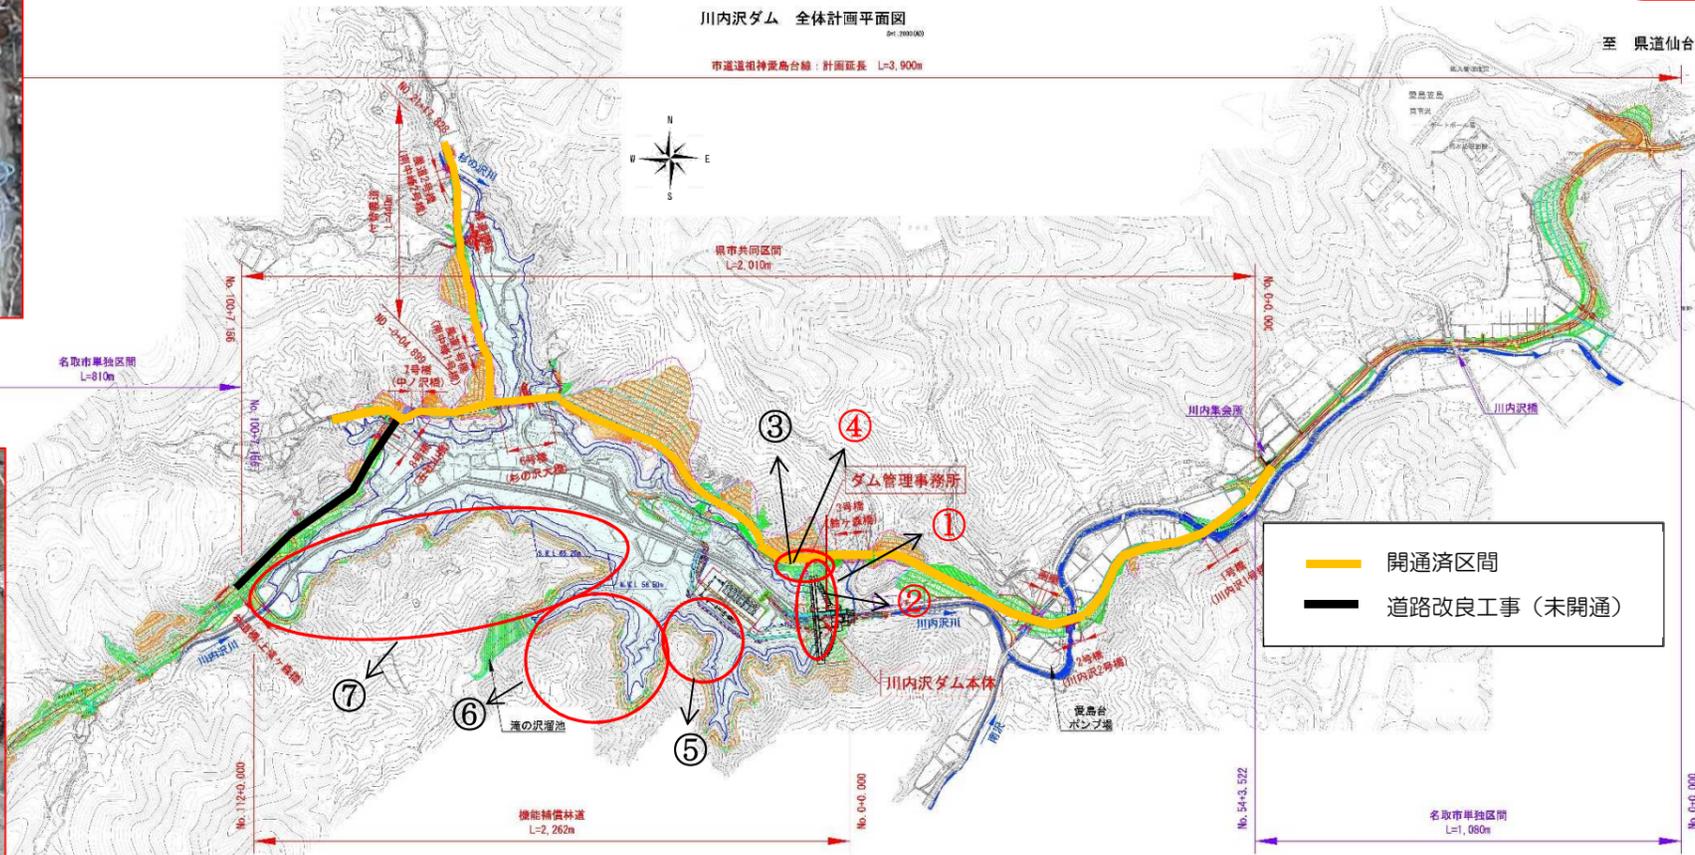


川内沢ダムイメージキャラクター「川内あひ」

(R6補)林道改良工事(その4)
(株)橋本店
R7.3.25~R8.3.31
【進捗率 0%】 ⑤

【①川内沢ダム本体工事 施工状況】



【川内沢ダムコンクリート打設 進捗状況 46%】

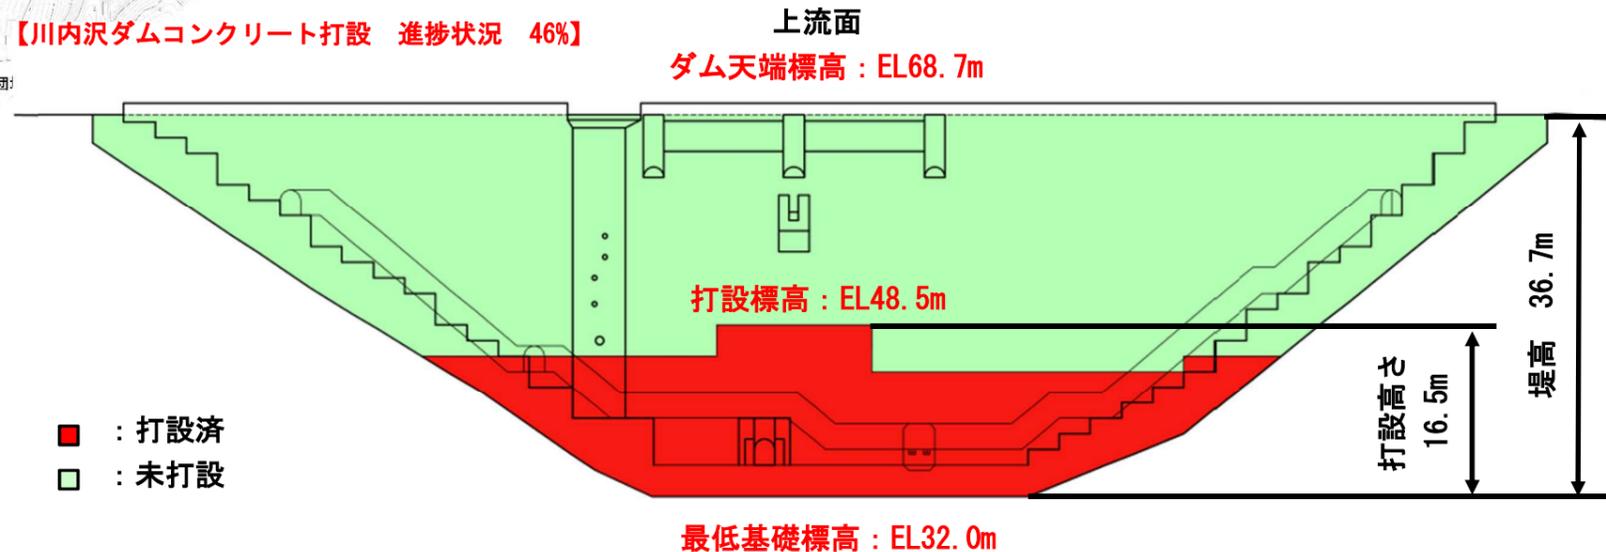

(R6補)林道改良工事(その5)
奥田建設(株)
R7.3.25~R8.3.31
【進捗率 1%】 ⑥

(R6補)林道改良工事(その6)
グリーン企画建設(株)
R7.3.25~R8.3.31
【進捗率 1%】 ⑦
