

【①川内沢ダム本体工事 骨材貯蔵施設施工状況!】



【①川内沢ダム本体工事 骨材貯蔵施設施工状況!】



【①川内沢ダム本体工事 右岸基礎掘削状況!】




【②付替市道6号橋上部工工事 桁施工状況!】



川内沢ダム建設事業全体平面図

川内沢ダム取水放流設備工事 奥田建設(株) R5.10.6~R8.3.25 【R5.10.5 契約】 ⑤	(R5)付替市道舗装工事 (株)和建设 R5.7.11~R6.3.29 【進捗率 21%】 ④	(R4 補)農道改良工事 (株)宮城林産 R5.3.28~R5.12.22 【進捗率 65%】 ③	(R4)付替市道6号橋上部工工事 ライフティック(株) R4.10.27~R5.12.28 【進捗率 96%】 ②
---	--	--	--

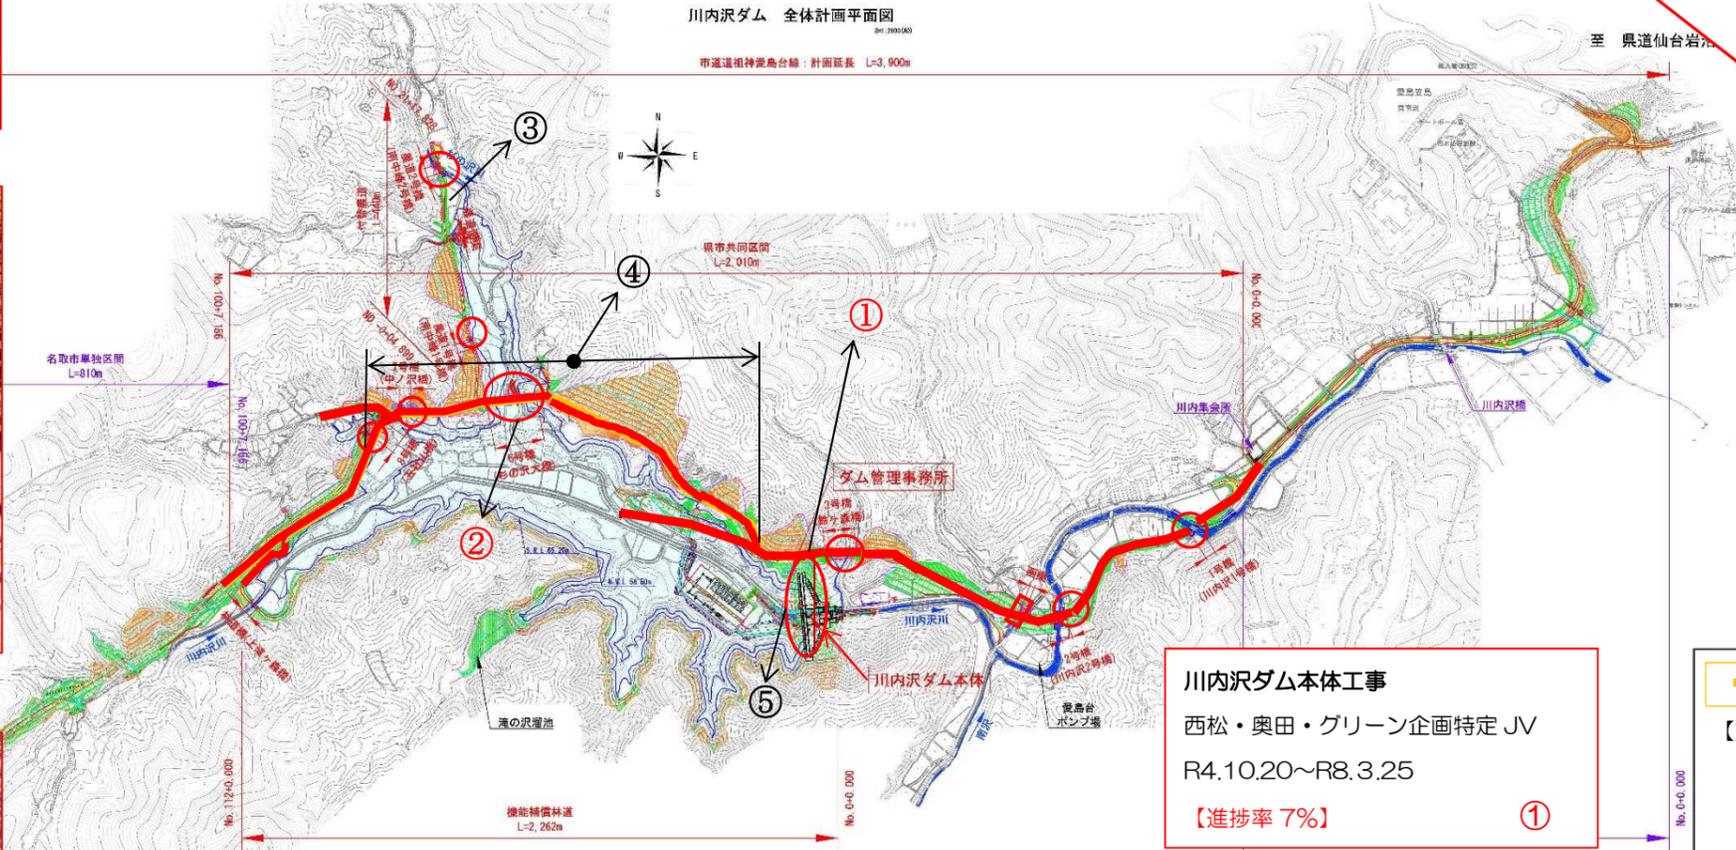

現在：5工区5業者施工中!

【11月末の見所】
 ①川内沢ダム本体工事 骨材貯蔵施設施工状況!
 ①川内沢ダム本体工事 右岸基礎掘削状況!
 ②付替市道6号橋上部工工事 桁施工状況!



ダム建設位置

付替道路全景(ダム建設位置~8号橋)
