


川内沢ダム建設事業全体平面図

現在：8工区施工中
完成：1工区

川内沢ダムPR動画「見えるダム事業」公開中！




【①川内沢ダム本体工事 打設状況！】

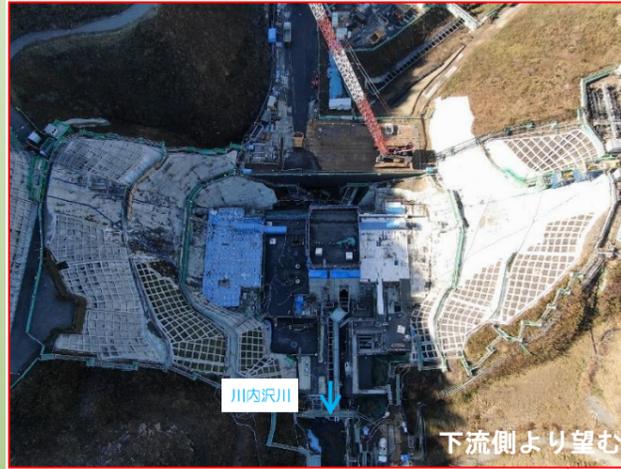


川内沢ダム管理事務所等新築工事 (株)渡辺工務店 R6.9.12~R7.8.29 【進捗率 17%】 ④	川内沢ダム管理設備新設工事 富士通 Japan(株) R6.10.18~R8.3.25 【進捗率 2%】 ③	川内沢ダム取水放流設備工事 奥田建設(株) R5.10.6~R8.3.25 【進捗率 17%】 ②	川内沢ダム本体工事 西松・奥田・グリーン企画特定JV R4.10.20~R8.3.25 【進捗率 38%】 ①
---	---	--	--

【現時点の見どころ】

- ①川内沢ダム本体工事 打設状況！
- ②川内沢ダム取水放流設備工事 施工状況！
- ⑤付替農道改良外工事 施工状況！
- ⑧林道改良工事(その3) 施工状況！
- ⑨付替市道舗装工事(その2) 完成！

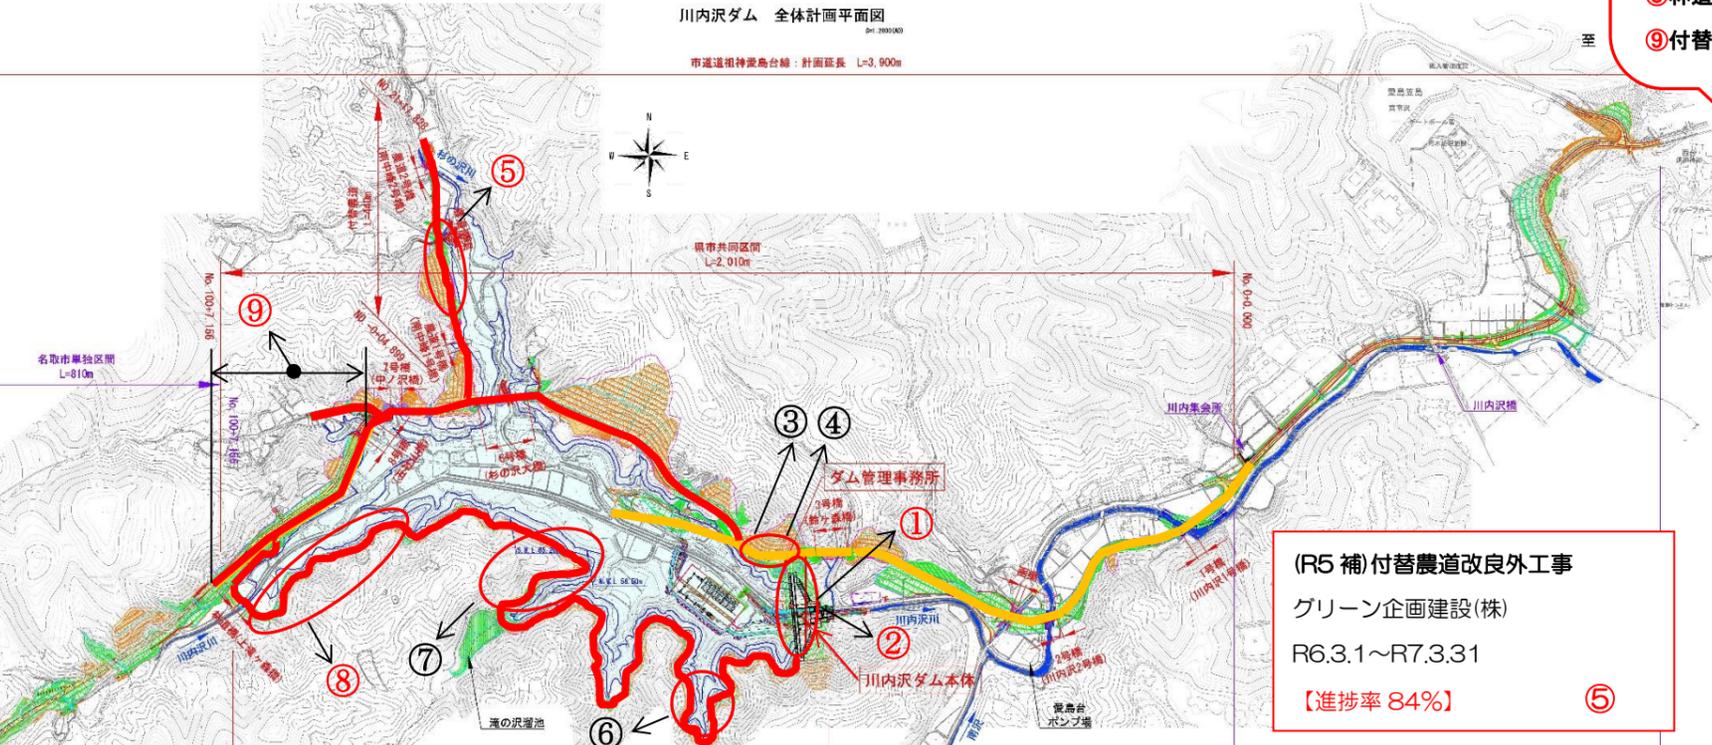

【①川内沢ダム本体工事 打設状況！（拡大）】

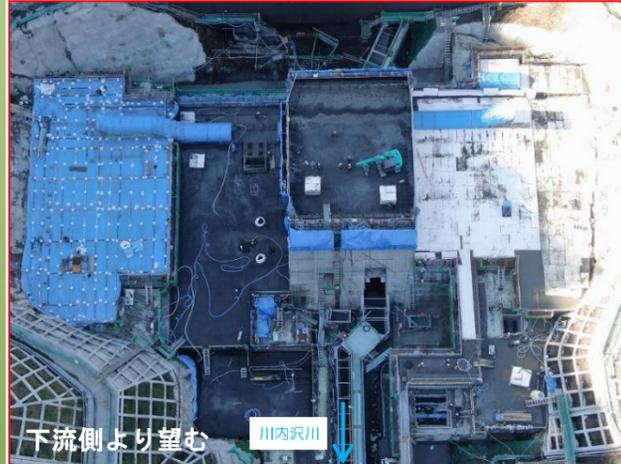

(R5 補)付替市道舗装工事(その2) (株)ワタケン R6.7.10~R6.12.27 【完成】 ⑨	(R5 補)林道改良工事(その3) (株)センショウ・テック. R6.3.5~R7.3.31 【進捗率 81%】 ⑧	(R5 補)林道改良工事(その2) 奥田建設(株) R6.3.1~R7.3.31 【進捗率 37%】 ⑦	(R5 補)林道改良工事(その1) (株)橋本店 R6.3.1~R7.3.31 【進捗率 70%】 ⑥
--	---	---	--



川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」

【②川内沢ダム取水放流設備工事 施工状況！】



【⑨付替市道舗装工事(その2) 施工状況！】



【⑧林道改良工事(その3) 施工状況！】



【⑤付替農道改良外工事 施工状況！】

