

川内沢ダムPR動画「見えるダム事業」公開中！



<アクセスはこちらから>

現在：8工区施工中

# 川内沢ダム建設事業全体平面図

## 【①川内沢ダム本体工事 施工状況】



川内沢ダム管理事務所等新築工事  
(株)渡辺工務店  
R6.9.12~R7.8.29  
【進捗率 23%】 ④

川内沢ダム管理設備新設工事  
富士通 Japan(株)  
R6.10.18~R8.3.25  
【進捗率 11%】 ③


川内沢ダム取水放流設備工事  
奥田建設(株)  
R5.10.6~R8.3.25  
【進捗率 17%】 ②

川内沢ダム本体工事  
西松・奥田・グリーン企画特定JV  
R4.10.20~R8.3.25  
【進捗率 39%】 ①

### 【現時点の見どころ】

- ①川内沢ダム本体工事 施工状況
- ④川内沢ダム管理事務所等新築工事 施工状況
- ⑤付替農道改良外工事 施工状況
- ⑥林道改良工事(その1) 施工状況
- ⑦林道改良工事(その2) 施工状況
- ⑧林道改良工事(その3) 施工状況

## 【④川内沢ダム管理事務所等新築工事 施工状況】

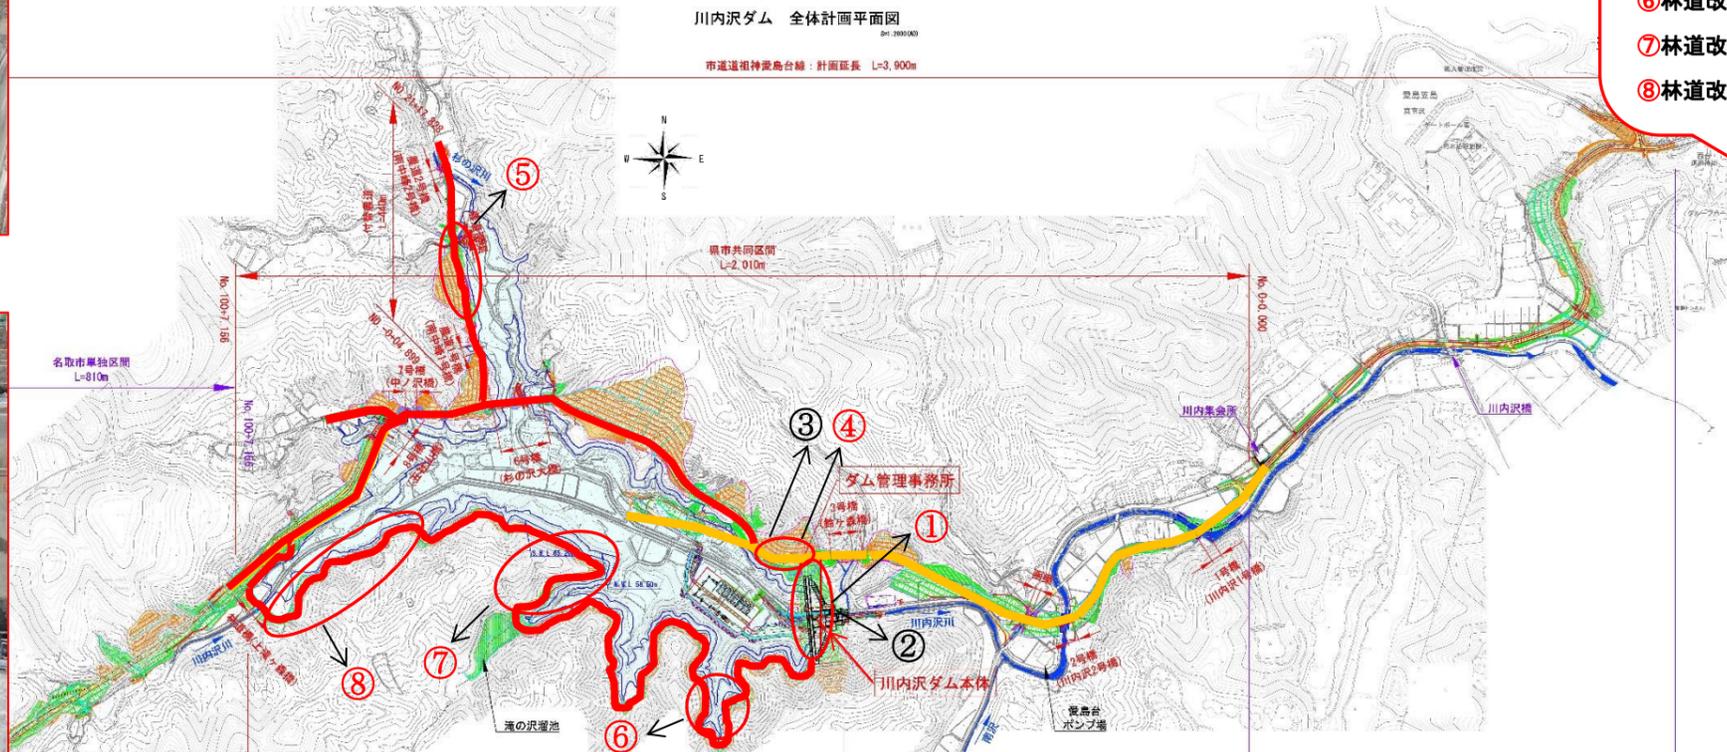

## 【⑤付替農道改良外工事 施工状況】



(R5 補)林道改良工事(その3)  
(株)センショウ・テック.  
R6.3.5~R7.3.31  
【進捗率 87%】 ⑧

(R5 補)林道改良工事(その2)  
奥田建設(株)  
R6.3.1~R7.3.31  
【進捗率 59%】 ⑦

(R5 補)林道改良工事(その1)  
(株)橋本店  
R6.3.1~R7.3.31  
【進捗率 79%】 ⑥

(R5 補)付替農道改良外工事  
グリーン企画建設(株)  
R6.3.1~R7.3.31  
【進捗率 92%】 ⑤

— 開通済区間  
— 道路改良工事

## 【⑧林道改良工事(その3) 施工状況】



## 【⑦林道改良工事(その2) 施工状況】



## 【⑥林道改良工事(その1) 施工状況】

