

現在：15工区10業者施工中！

川内沢ダム建設事業全体平面図

【1月末の見所】

- ① 函渠工の本体完了！
- ③ 3号橋上部工工事の桁架設完了！
- ⑨ 林道橋工事の完成！
- ⑬ ダム仮設工外工事の伐採作業本格化！



川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」

【⑨林道橋 工事完成！】



橋梁下部工工事（7号橋,8号橋）



付替道路全景（ダム建設位置～8号橋）



ダム建設位置



【⑬ダム仮設工外工事「伐採作業本格化！」】



【②函渠工工事「本体完了！」】

(R3)7号橋上部工工事
東日本コンクリート(株)
R3.11.11～R4.7.29
【進捗率 8%】 ⑭

(R3)8号橋上部工工事
ライブディック(株)
R3.11.11～R4.9.30
【進捗率 3%】 ⑮

(R2)8号橋下部工工事
(株)環境施設
R3.6.17～R4.1.31
【進捗率 78%】 ⑥

(R3)林道橋工事
(株)石井土木
R3.7.13～R4.1.31
【完成】 ⑨

(R3)道路改良工事(その2)
グリーン企画建設(株)
R3.10.8～R5.1.31
【進捗率 8%】 ⑩

(R3)ダム仮設工外工事
奥田建設(株)
R3.11.5～R5.2.28
【進捗率 3%】 ⑬

(R3)農道橋下部工工事
(株)石井土木
R3.7.30～R4.3.31
【進捗率 42%】 ⑧

(R3)6号橋下部工工事
(株)深松組
R3.6.30～R4.3.31
【進捗率 45%】 ④

(R3)道路改良工事(その3)
(株)深松組
R3.10.5～R5.3.24
【進捗率 12%】 ⑪



(R2)3号橋上部工工事
東日本コンクリート(株)
R3.5.19～R4.2.28
【進捗率 66%】 ③

(R2)道路改良工事(その2)
(株)橋本店
R3.3.9～R4.3.31
【進捗率 69%】 ①

(R3)道路改良工事
星造園土木(株)
R3.7.13～R4.3.31
【進捗率 65%】 ⑦

(R3)舗装工事
(株)佐藤渡辺東北支店
R3.10.12～R5.1.31
【進捗率 1%】 ⑫

(R2)函渠工工事
グリーン企画建設(株)
R3.2.18～R4.2.28
【進捗率 92%】 ②

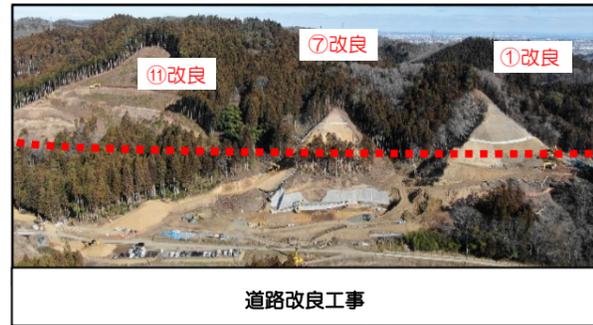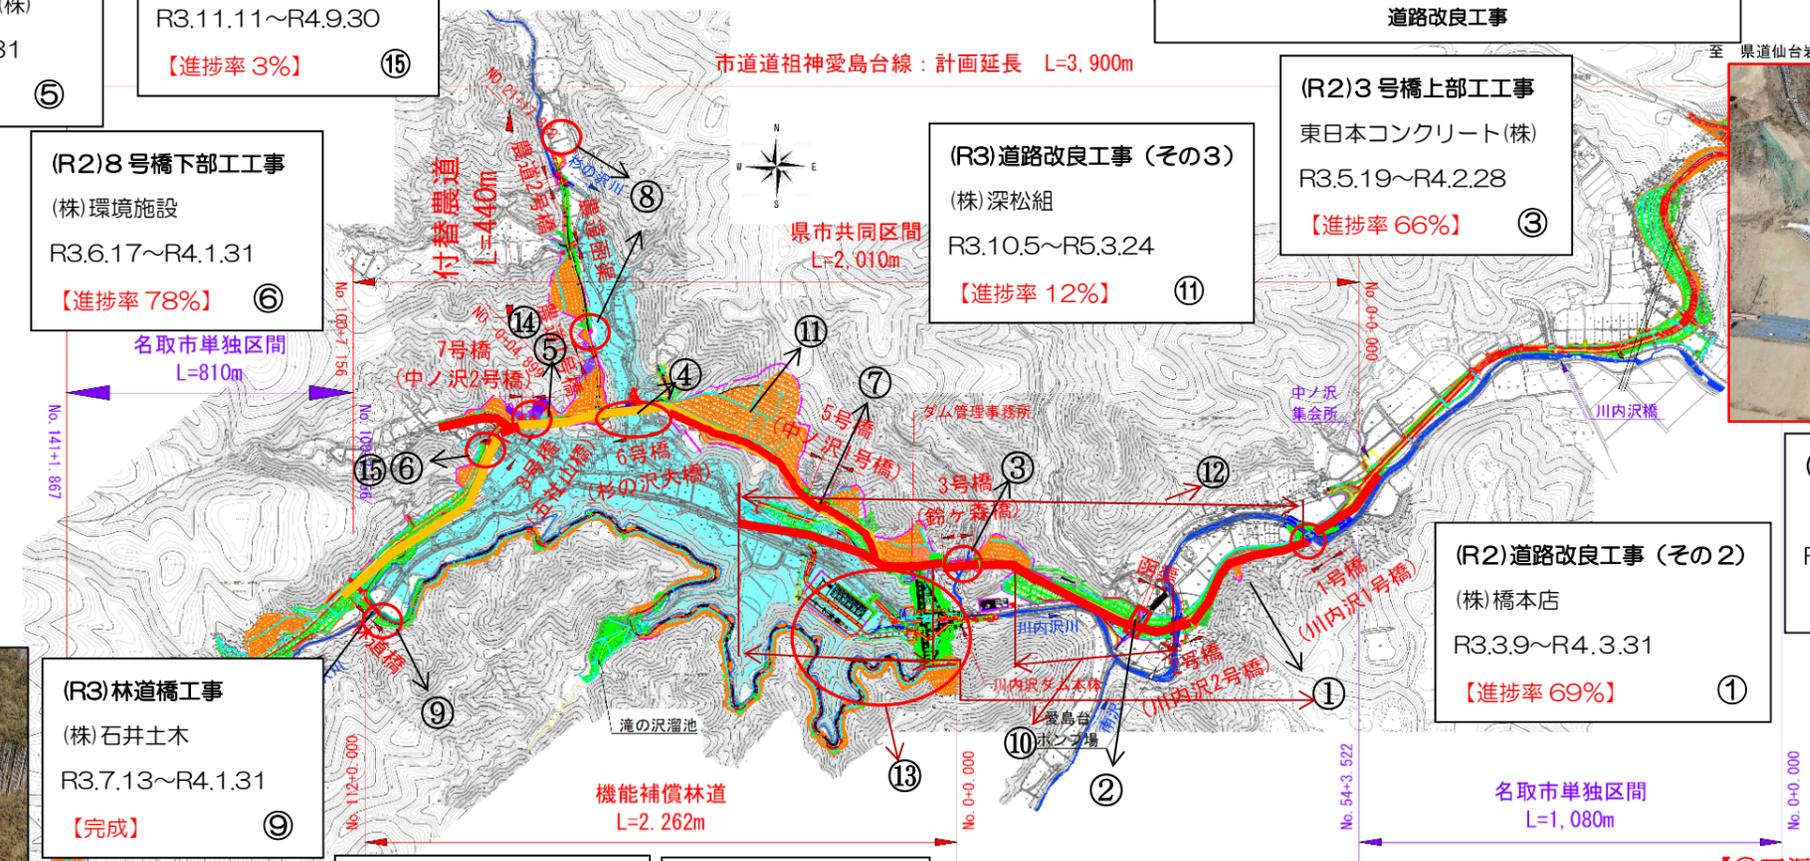

道路改良工事



【③3号橋上部工工事「桁架設完了！」】

— 付替市道 L=2,010m
— 【施工中】 道路改良工事
○ 橋梁工事
