

川内沢ダム建設事業全体平面図

現在：11工区7業者施工中！  
完成：1工区1業者

【①6号橋下部工工事の完成！】



【④道路改良工事(その3)  
14段のうち上から9段目まで掘削完了！】



【⑥ダム仮設工工事の右岸頂部掘削本格化！】



(R3補)道路改良工事(その4)  
奥田建設(株)  
R4.4.11~R5.3.31  
【進捗率63%】 ⑧

(R3)8号橋上部工工事  
ライブディック(株)  
R3.11.11~R4.12.12  
【進捗率82%】 ⑦

(R3補)林道改良外工事  
グリーン企画建設(株)  
R4.4.1~R5.3.31  
【進捗率31%】 ⑫

(R3)道路改良工事(その3)  
(株)深松組  
R3.10.5~R5.3.24  
【進捗率52%】 ④

(R3)農道橋下部工工事  
(株)石井土木  
R3.7.30~R4.11.30  
【進捗率80%】 ②

(R3補)農道改良外工事  
(株)深松組  
R4.4.1~R5.3.31  
【進捗率6%】 ⑩

(R3)舗装工事  
(株)佐藤渡辺東北支店  
R3.10.12~R5.1.31  
【進捗率25%】 ⑤

(R3)6号橋下部工工事  
(株)深松組  
R3.6.30~R4.9.30  
【完成！】 ①



(R3補)農道2号橋上部工工事  
ライブディック(株)  
R4.3.24~R5.2.28  
【進捗率1%】(工事一部中止中) ⑪

(R3補)道路改良工事(その5)  
(有)渋谷組  
R4.4.1~R5.3.31  
【進捗率36%】 ⑨

(R3)ダム仮設工外工事  
奥田建設(株)  
R3.11.5~R5.2.28  
【進捗率40%】 ⑥

(R3)道路改良工事(その2)  
グリーン企画建設(株)  
R3.10.8~R5.1.31  
【進捗率67%】 ③


【③道路改良工事(その2) アンカー式補強土壁工】

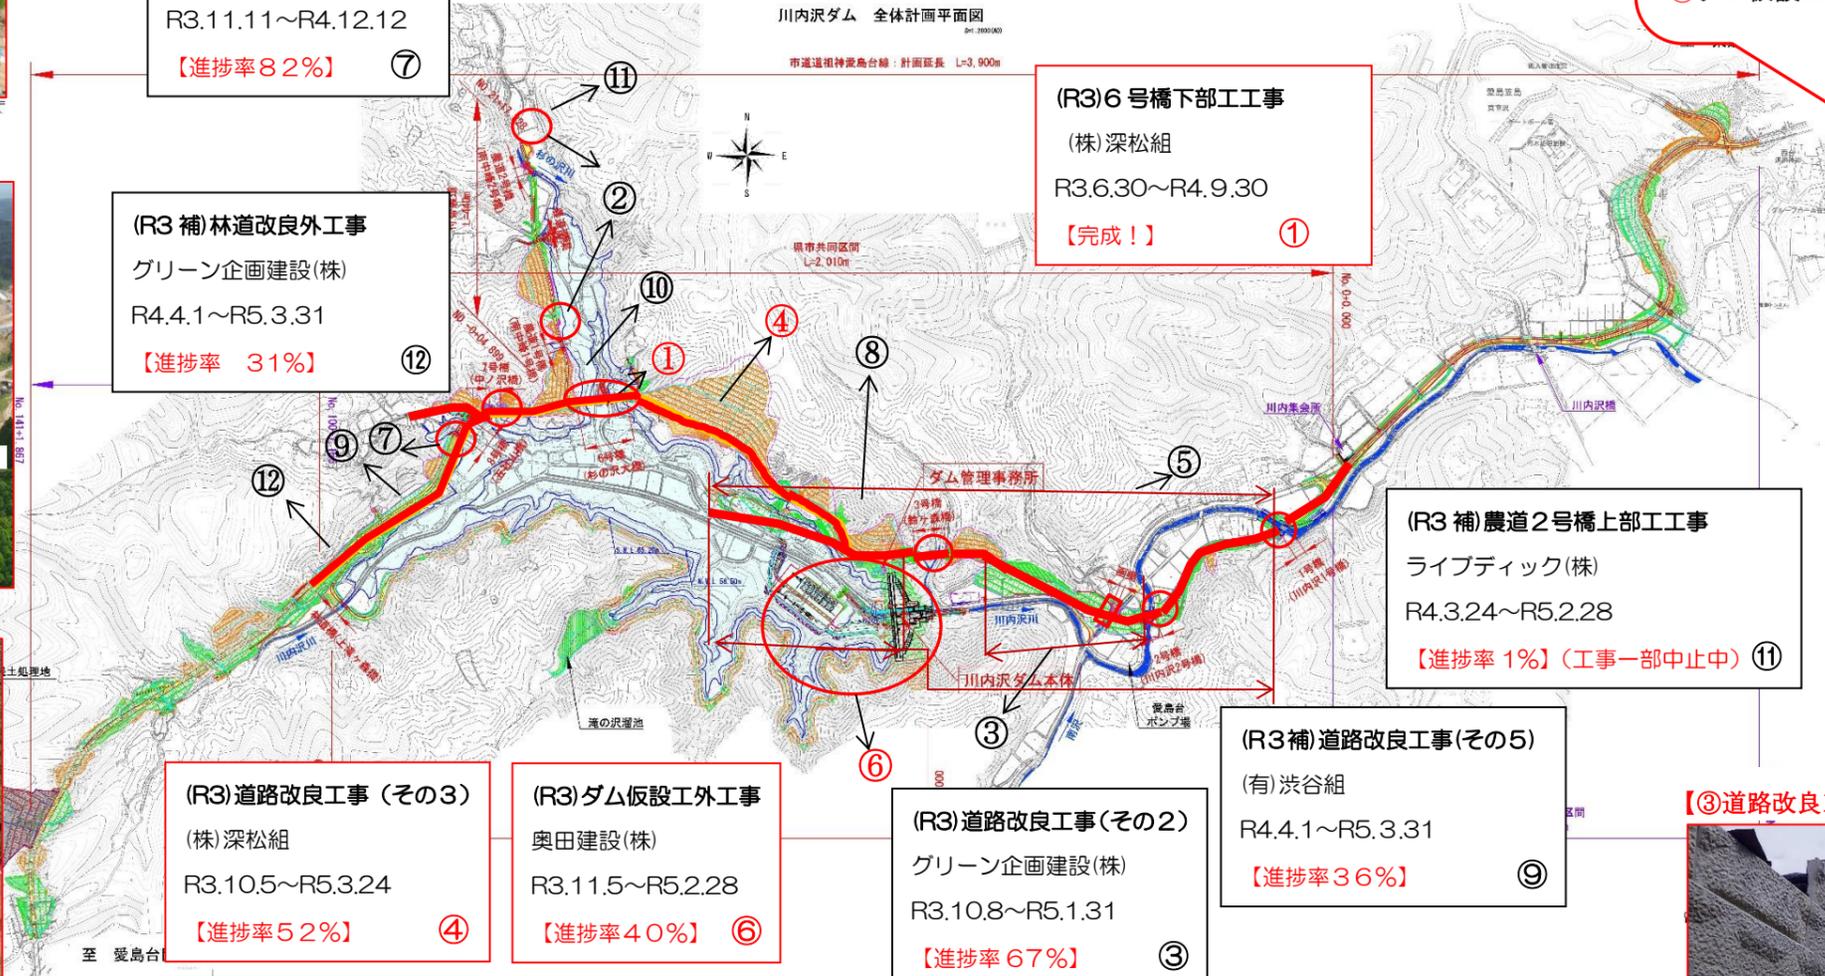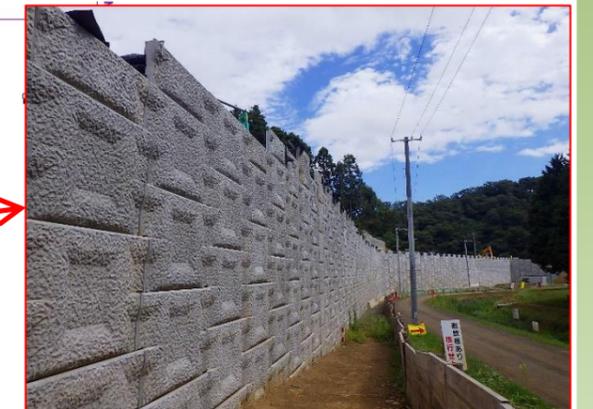

【9月末の見所】  
①6号橋下部工工事の完成！  
④道路改良工事(その3)は14段のうち上から9段目まで掘削完了！  
⑥ダム仮設工工事の右岸頂部掘削本格化！



川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」

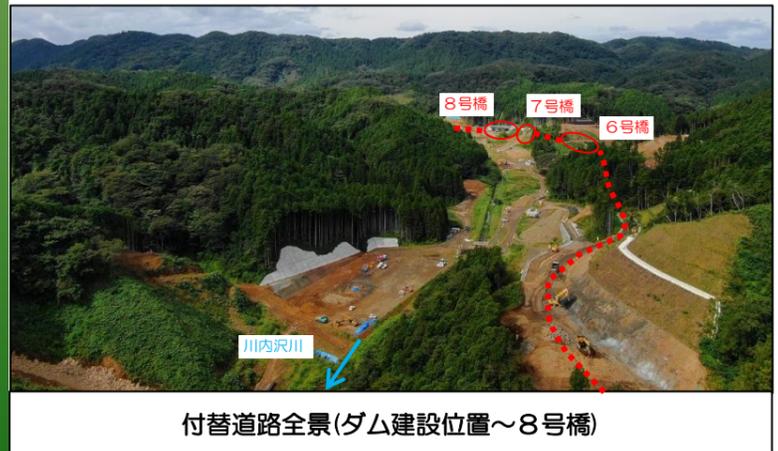

付替道路全景(ダム建設位置~8号橋)



ダム建設位置



付替道路全景(2号橋~函渠~3号橋手前)

