

現在：14工区8業者施工中！

川内沢ダム建設事業全体平面図

【⑦道路改良工事(その4)は係船搬路工完了！】



(R3補)道路改良工事(その4)
奥田建設(株)
R4.4.11~R5.3.31
【進捗率74%】 ⑦

(R3)農道橋下部工工事
(株)石井土木
R3.7.30~R4.11.30
【進捗率94%】 ①

(R3 補)農道改良外工事
(株)深松組
R4.4.1~R5.3.31
【進捗率15%】 ⑨

(R3)舗装工事
(株)佐藤渡辺東北支店
R3.10.12~R5.1.31
【進捗率29%】 ④

【10月末の見所】
⑦道路改良工事(その4)は係船搬路工完了！
⑨農道改良外工事の掘削本格化！
⑫ダム本体工事：「西松・奥田・グリーン
企画特定JV」と本契約締結！

【⑨農道改良外工事の掘削本格化！】



(R3 補)林道改良外工事
グリーン企画建設(株)
R4.4.1~R5.3.31
【進捗率49%】 ⑪

川内沢ダム本体工事
西松・奥田・グリーン企画特定JV
R4.10.20~R8.3.25
【10月19日日本契約締結】 ⑫

(R4)付替市道6号橋上部工工事
ライブディック(株)
R4.10.27~R6.3.31
【10月26日契約】 ⑬



【③道路改良工事(その3) 道路改良工事】



(R3)道路改良工事(その3)
(株)深松組
R3.10.5~R5.3.24
【進捗率62%】 ③


(R3)ダム仮設外工事
奥田建設(株)
R3.11.5~R5.2.28
【進捗率43%】 ⑤

(R3)道路改良工事(その2)
グリーン企画建設(株)
R3.10.8~R5.1.31
【進捗率76%】 ②

(R3補)道路改良工事(その5)
(有)渋谷組
R4.4.1~R5.3.31
【進捗率42%】 ⑧

(R3 補)農道2号橋上部工工事
ライブディック(株)
R4.3.24~R5.3.31
【進捗率1%】(工事一部中止中)
※11月1日から工事再開 ⑩

【⑫ダム本体工事：「西松・奥田・
グリーン企画特定JV」と本契約締結！】

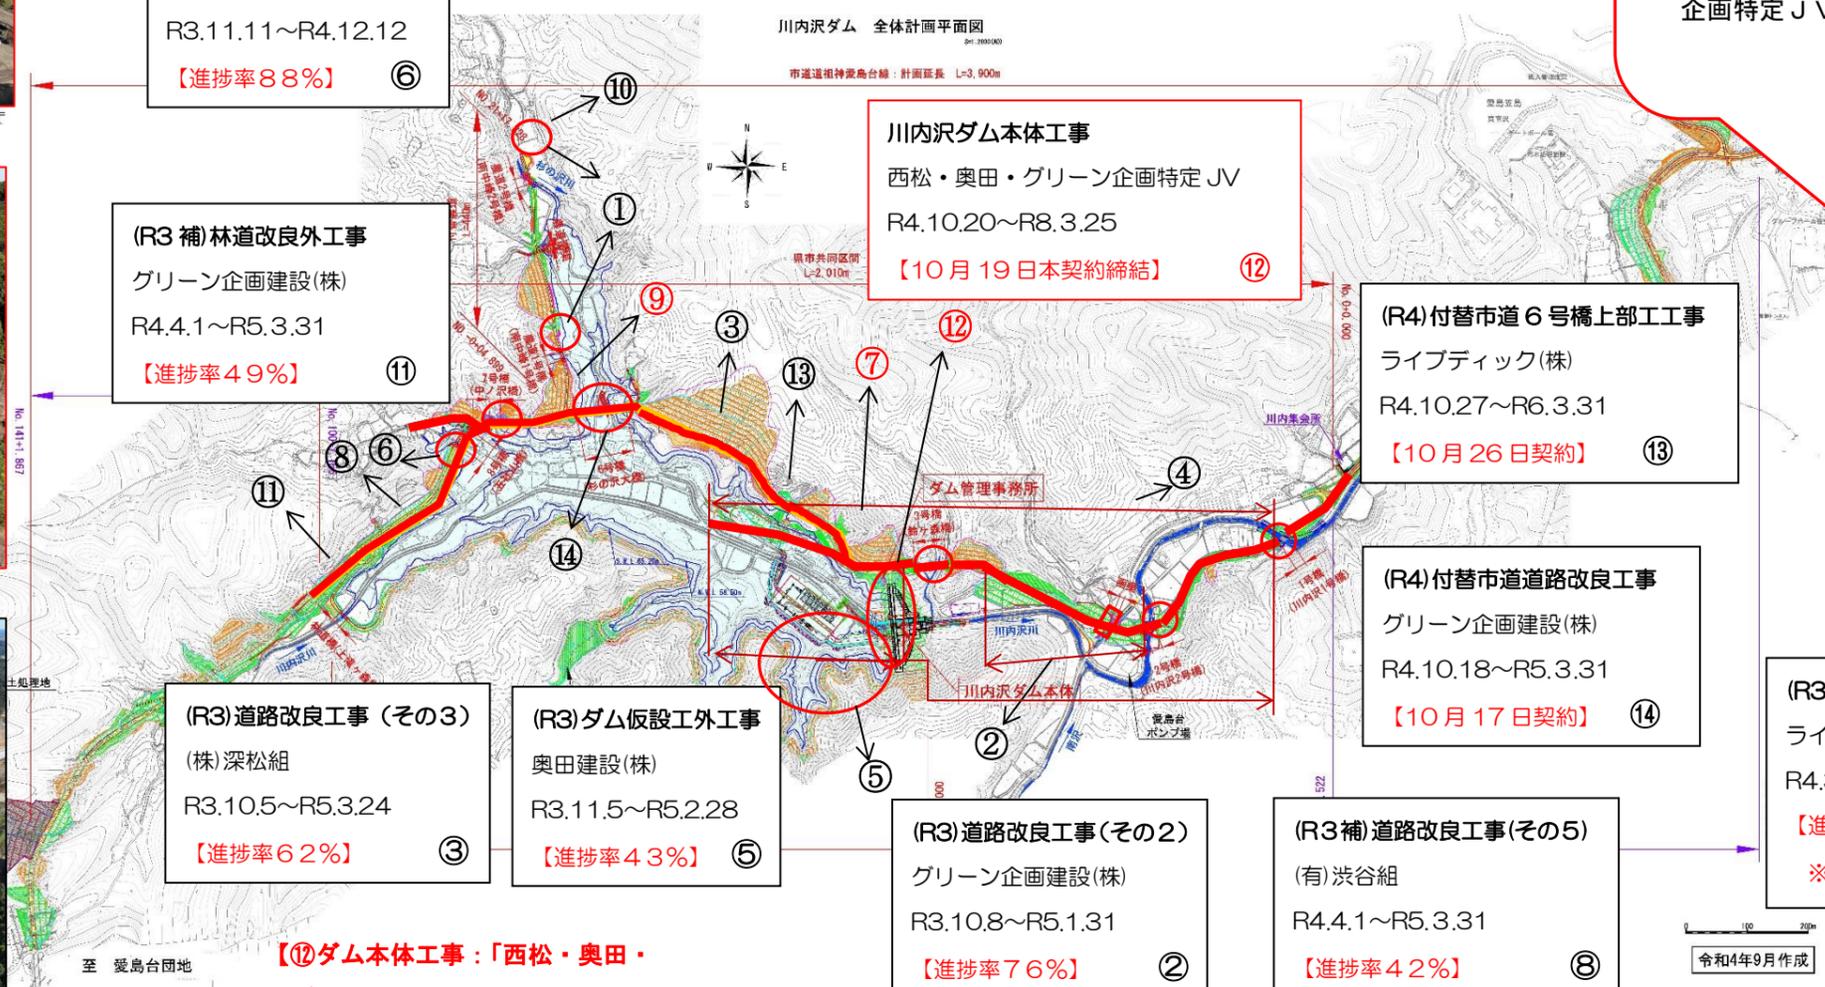

付替道路全景(ダム建設位置~8号橋)



ダム建設位置



付替道路全景(2号橋~函渠~3号橋手前)

付替市道 L=2,010m

【施工中】

- 道路改良工事 (Red line)
- 橋梁工事 (Red circle)
- 函渠工工事 (Red square)

令和4年9月作成
