

川内沢ダム建設事業全体平面図

現在：6工区6業者施工中！

【③川内沢ダム本体工事 転流工の施工状況！】



【③川内沢ダム本体工事 転流工の施工状況！】



(R4 補)農道改良工事
(株)宮城林産
R5.3.28~R5.10.31
【進捗率1%】 ⑥

(R3 補)農道改良外工事
(株)深松組
R4.4.1~R5.6.30
【進捗率92%】 ②

(R4)付替市道道路改良工事
グリーン企画建設(株)
R4.10.18~R5.6.30
【進捗95%】 ⑤


川内沢ダム本体工事
西松・奥田・グリーン企画特定JV
R4.10.20~R8.3.25
【進捗率2%】 ③

【5月末の見所】

- ①ダム仮設工外工事 鉄筋挿入工の施工状況！
- ①ダム仮設工外工事 林道の施工状況！
- ③川内沢ダム本体工事 転流工の施工状況！



川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」

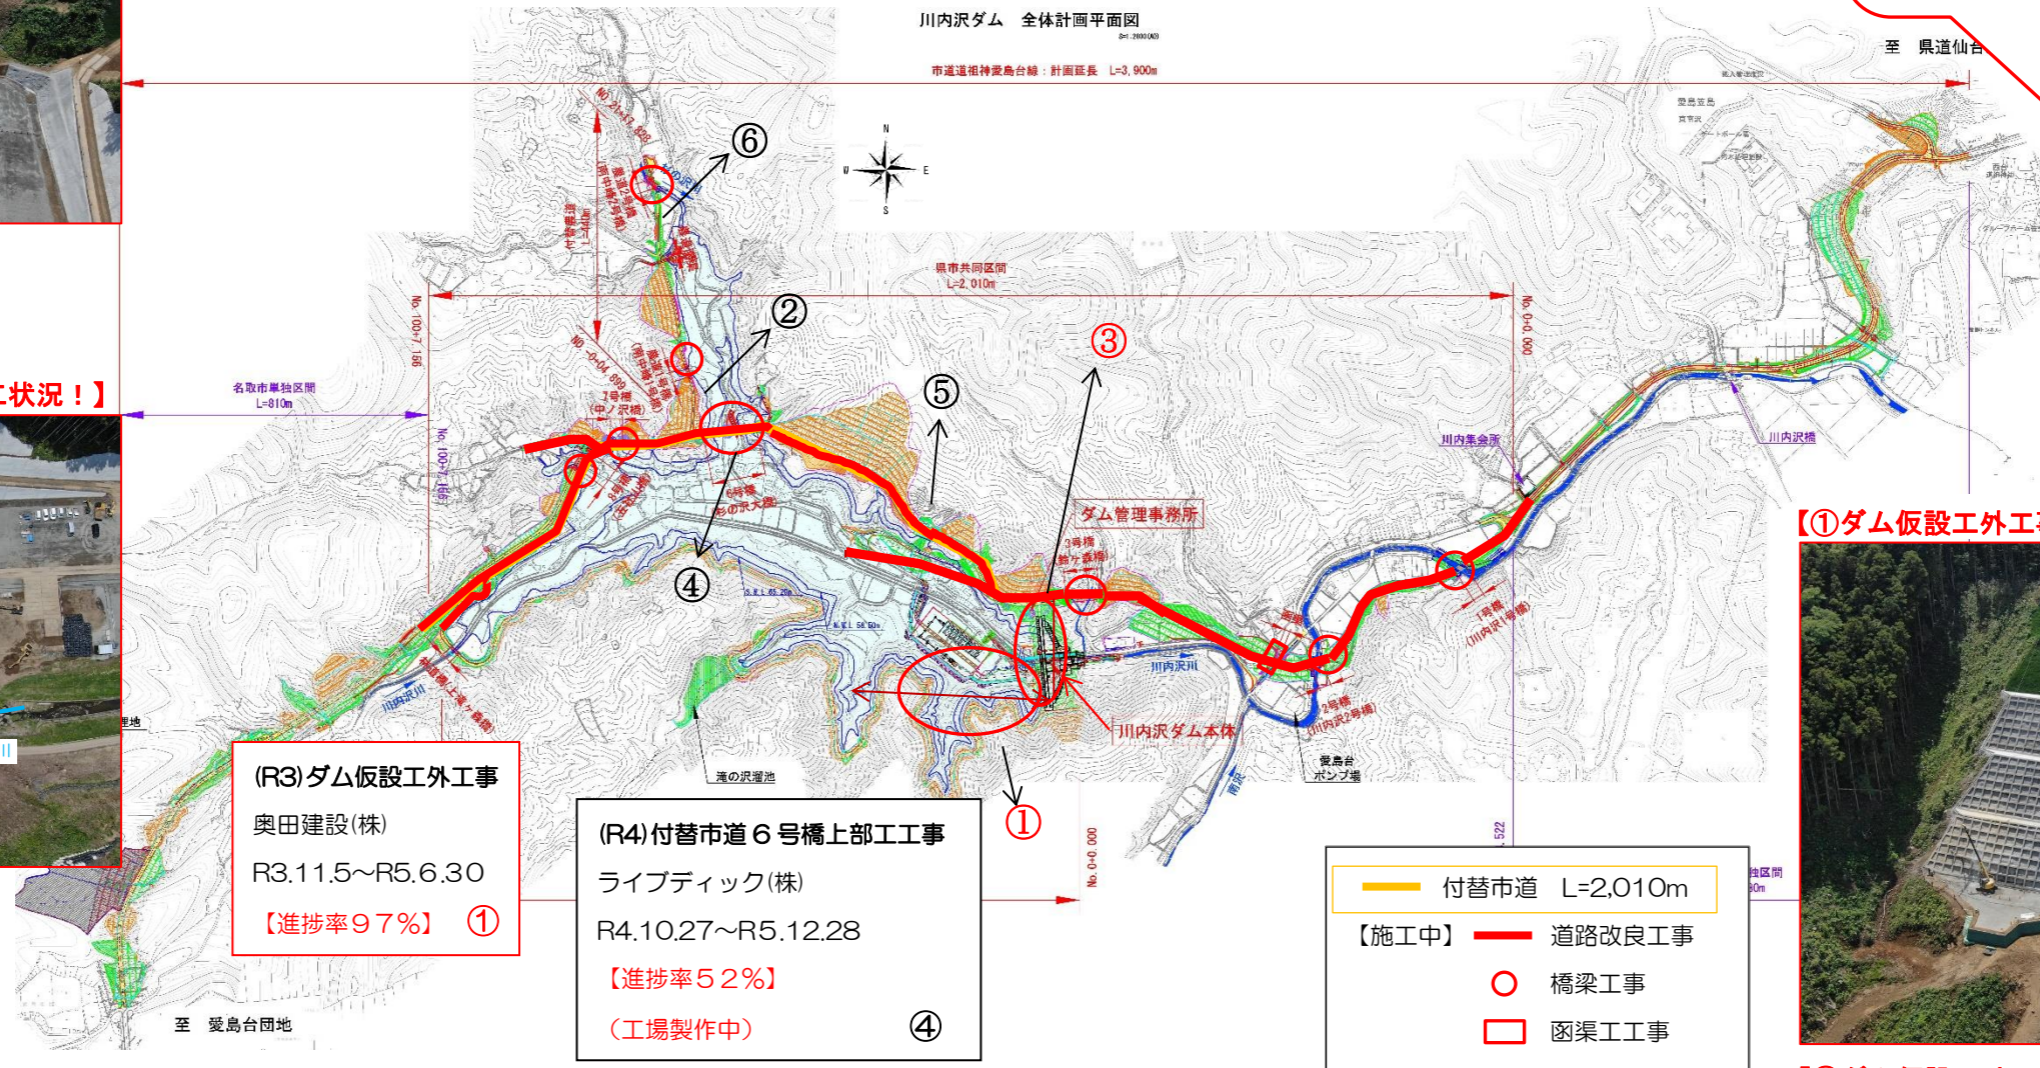

(R3)ダム仮設工外工事
奥田建設(株)
R3.11.5~R5.6.30
【進捗率97%】 ①

(R4)付替市道6号橋上部工工事
ライブディック(株)
R4.10.27~R5.12.28
【進捗率52%】
(工場製作中) ④

【①ダム仮設工外工事 鉄筋挿入工の施工状況！】




【①ダム仮設工外工事 林道の施工状況！】



付替道路全景(ダム建設位置~8号橋)



ダム建設位置

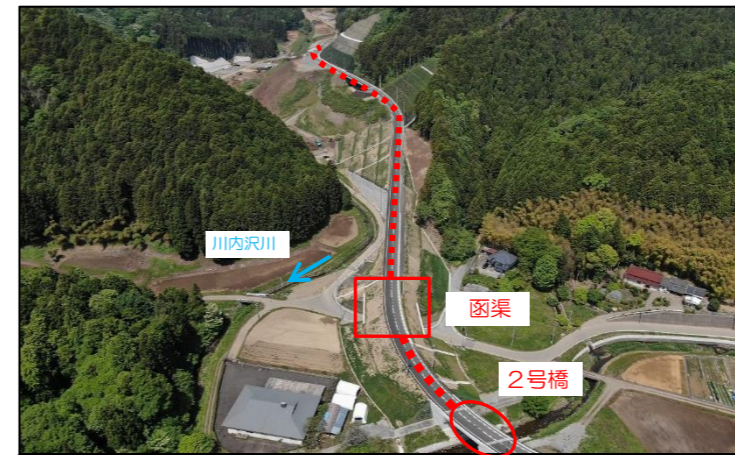

付替道路全景(2号橋~函渠~3号橋手前)
