# 神山川の桜並木に関する説明会

場所: 気仙沼中央公民館(条南分館集会室) 平成28年8月31日(水) 午後6時30分~

## 宮城県気仙沼土木事務所








#### 神山川復旧断面

1-1

(神山川橋~条南中学校付近)

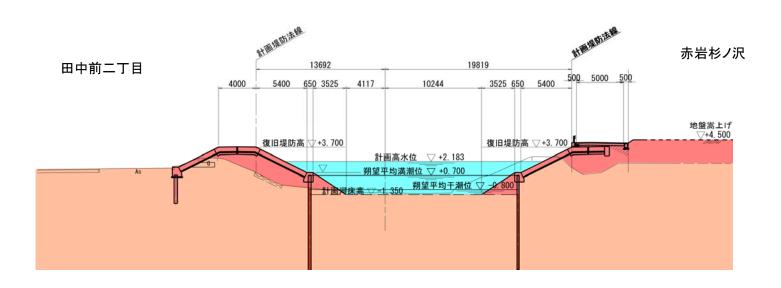

※高さは、場所によって違いが生じます

【宮城県気仙沼土木事務所】

🗫 宮城県



Miyagi Prefectural Government 🖫

# これまでの経緯

平成28年3月23日

工事説明会において桜の伐採について説明させていた だき, 地元から了承をいただきました。

平成28年5月18日

「神山川の桜保存を望む市民の会」から4,712名の署名をいただきました。



宮城県では、河川の安全性を確保しつつ、桜を保存することができる方法について検討を進めてきました。





### 検討案(1)


既存の桜の周りに盛土し、計画天端高を確保する




新たに盛土をすると、根腐れを起こして枯れてしまう 天端被覆ができないため、出水時に堤体が洗掘を受ける



既存の桜の背後に矢板護岸を施工する

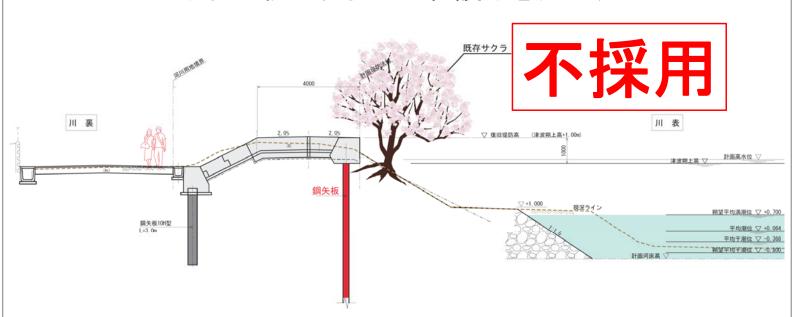

矢板を施工する際に枝が支障となり、また根を切断してしまう

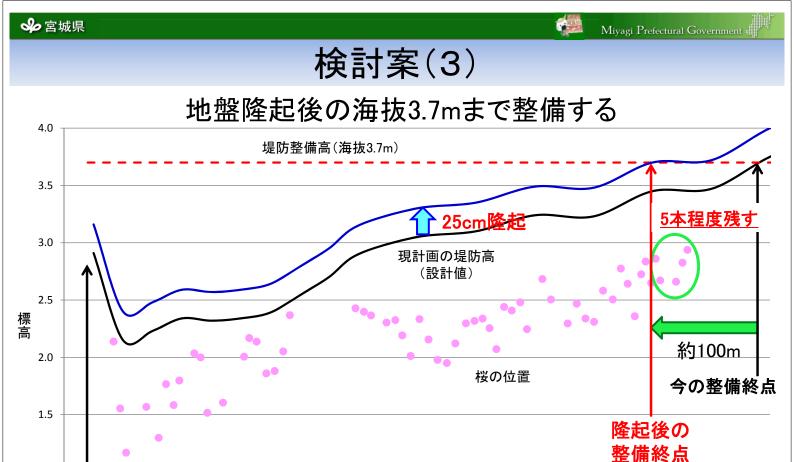

🖇 宮城県

1.0

0.5

神山川橋



さかなの駅

Miyagi Prefectural Government 🗓

### 課題と今後のスケジュール

(国土地理院の見解)

「25cmの隆起」は平成28年2月時点でのあくまでも 目安の高さ

平成29年2月末(予定)

国土地理院が隆起後の標高を公表



公表された結果を受けて、改めて整備範囲を検討します。





# 工事施工スケジュール

#### 前回説明会(H28.3.23)⇒今秋から伐採・施工を開始する

平成28年			平成29年											
10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
桜仂	<b>找</b> 採					矢板工	• 築堤コ	• 被覆	Ι					7

(平成30年6月頃まで)



#### 今回⇒国土地理院の結果を受けて来春以降に伐採・施工を開始

				:				_ ,							
	7	平成28年	Ę	平成29年											
10	0月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
			<b>18</b> 1	量結果公	\ <sub>±</sub> 🔸				桜	伐採		矢板工	• 築堤エ	•被覆	
			炽	里心木	A 274							•			$\qquad \qquad \searrow$

(平成31年2月頃まで)

平成29年3月頃、改めて工事範囲などに関して説明の場を設けさせていただきます。
