


大河原土木事務所

令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況

【令和4年3月末現在】

※赤字は前月との比較

公共土木施設 着手率 100% 完成率 83%
 (道路,河川,砂防, 受託) (+9pt)



復旧・復興事業の概要
 期間 R1～R4年度
 工事費 約151億円
 事業箇所数: 320箇所

項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)
道路 災害復旧工事 着手率 100% 完成率 81% (+7pt) 事業箇所数: 93箇所 期間 R1～R3 工事費 約40億円	50% 100% 着手率 93箇所 完成率 75箇所 (+6箇所)	災害関連 緊急砂防工事 着手率 100% 完成率 0% 事業箇所数: 15箇所 期間 R1～R4 工事費 約52億円	50% 100% 着手率 15箇所 完成率 0%	受託工事 (町道古田峠線) 着手率 100% 完成率 57% (+14pt) 事業箇所数: 7箇所 期間 R1～R3 工事費 約2億円	50% 100% 着手率 7箇所 完成率 4箇所 (+1箇所)
河川 災害復旧工事 着手率 100% 完成率 97% (+11pt) 事業箇所数: 193箇所 期間 R1～R3 工事費 約50億円	50% 100% 着手率 193箇所 完成率 187箇所 (+21箇所)	災害関連工事 (丸森梁川線) 着手率 100% 完成率 0% 事業箇所数: 1箇所 期間 R1～R4 工事費 約4億円	50% 100% 着手率 1箇所 完成率 0%	土砂災害 対策道路事業 (丸森霊山線) 着手率 100% 完成率 0% 事業箇所数: 11箇所 期間 R3～R4 工事費 約3億円	50% 100% 着手率 11箇所 完成率 0%

※ 丸森霊山線・丸森梁川線の一部は関連工事との調整によりR4完成見込

【令和4年3月末現在】

大河原土木事務所 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況（市町別）

災害復旧事業						
市町名	道路災害復旧工事			河川災害復旧工事		
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	進捗率	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	進捗率
白石市	18 【3億円】	18 100% 18 100%	100%	43 【13億円】	43 100% 37 86%	86%
角田市	15 【3億円】	15 100% 14 93%	93%	38 【11億円】	38 100% 38 100%	100%
藤王町	1 【0.2億円】	1 100% 1 100%	100%	19 【4億円】	19 100% 19 100%	100%
七ヶ宿町	0			18 【2億円】	18 100% 18 100%	100%
村田町	4 【0.3億円】	4 100% 4 100%	100%	17 【3億円】	17 100% 17 100%	100%
川崎町	7 【2億円】	7 100% 7 100%	100%	25 【5億円】	25 100% 25 100%	100%
丸森町	48 【31億円】	48 100% 31 65%	65%	33 【12億円】	33 100% 33 100%	100%
合計	93 【40億円】	93 100% 75 81%	81%	193 【50億円】	193 100% 187 97%	97%

関連事業		
市町名	災害関連緊急砂防工事	
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）
丸森町	15 【52億円】	15 100% 0 0%
	災害関連工事（丸森梁川線）	
	1 【4億円】	1 100% 0 0%
	受託工事（町道 古田峠線）	
7 【2億円】	7 100% 4 57%	
土砂災害対策道路事業（丸森雲山線）		
11 【3億円】	11 100% 0 0%	
合計	34 【61億円】	34 100% 4 12%

※ 大河原町及び柴田町については、道路及び河川災害復旧工事が無いため、一覧表から除いている。

大河原土木事務所

令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

川崎町 支倉川 27号



川崎町 支倉川 28号



白石市 白石川 47号



蔵王町 松川 61号



着手前

施工中

完成

大河原土木事務所

令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

角田市 尾袋川 67号



角田市 尾袋川 69号



角田市 高倉川 81号



村田町 一本松川 136号



着手前

施工中

完成

大河原土木事務所

令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

角田市 小田川 155号



白石市 斎川 174号



白石市 谷津川 183号



白石市 高田川 205号



着手前

施工中

完成

大河原土木事務所

令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真


白石市 高田川 206号



白石市 児捨川 209号



白石市 大太郎川 216号

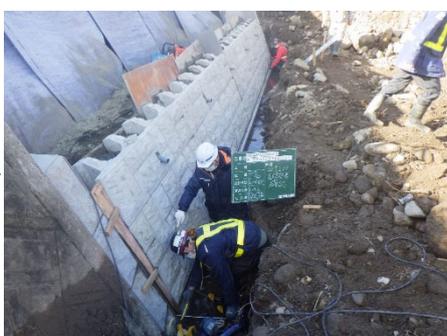

白石市 大太郎川 217号



着手前

施工中

完成

大河原土木事務所

令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

角田市 (一)越河角田線 650号



角田市 (一)大河原高倉線 673号



角田市 (一)大河原高倉線 677号



角田市 (一)大河原高倉線 678号



着手前

施工中

完成

大河原土木事務所

令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

角田市 (一)大河原高倉線 679号



角田市 (一)大河原高倉線 680号



着手前

施工中

完成
