

東日本大震災からの復旧・復興事業の進捗状況(令和8年3月末現在)について

復旧・復興事業を実施している369か所の内、約99%の366か所で完成済み


海岸堤防(防潮堤)の復旧・復興状況について

(R8年3月末)

区分	事業者	復旧・復興計画		箇所完了		実完成延長 【km】 (E)	実完成率 【%】 (E/B)
		箇所数 (A)	延長 【km】 (B)	箇所数 (C)	延長 【km】 (D)		
農地海岸	国・県	98	26.2	98	26.2	26.2	100%
漁港海岸	国・県・市・町	145	78.6	142	76.0	78.4	99%
建設海岸	国・県	66	61.9	66	61.9	61.9	100%
港湾海岸	県	37	52.6	37	52.6	52.6	100%
治山	国・県	23	13.5	23	13.5	13.5	100%
合計		369	232.8	366	230.2	232.6	99%

・表中の黒字アンダーラインは、前回(R7.3月末時点)からの変更になります。
 ・表中の「箇所完了(延長)」と「実完成延長」は下記のとおりです。
 「箇所完了(延長)」 = 完了した箇所数(完了)した合計延長
 「実完成延長」 = 「箇所完了(延長)」 + 施工中の箇所において部分的に完成した合計延長

気仙沼市 拡大図

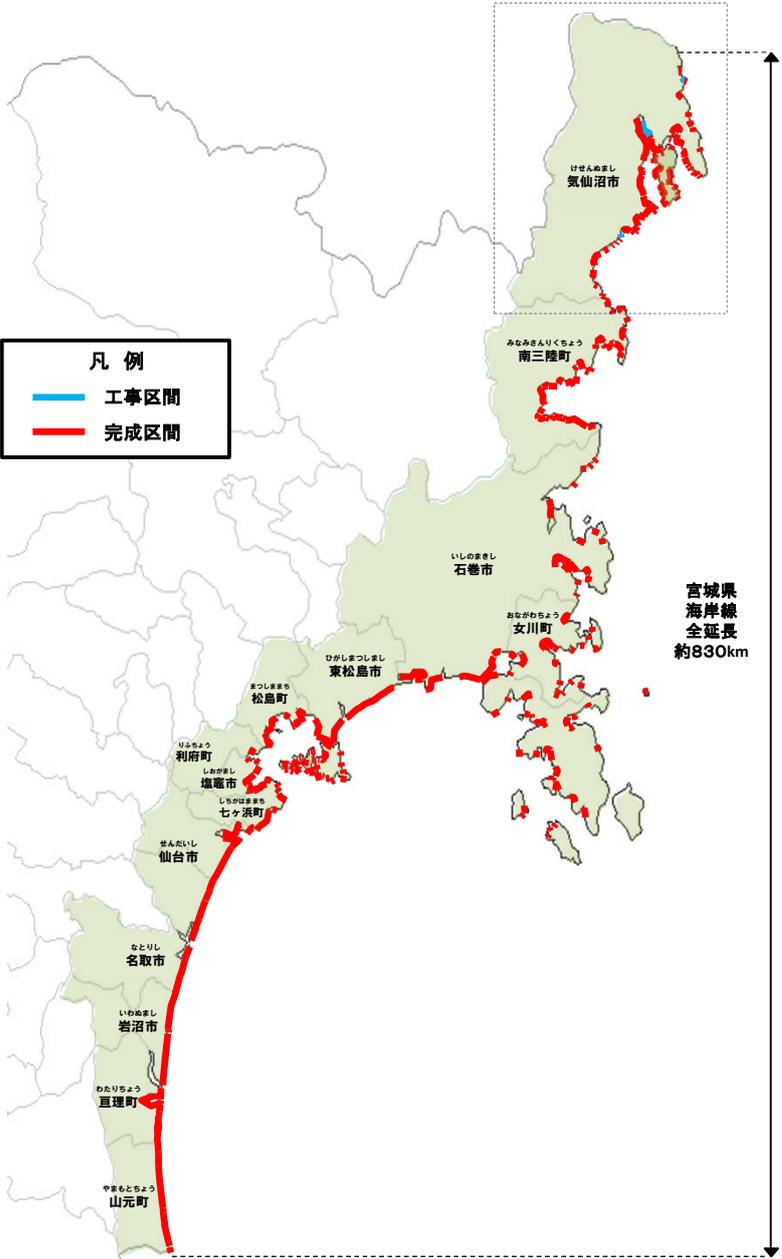

宮城県
海岸線
全延長
約830km

気仙沼市 気仙沼漁港海岸 港町・魚市場前・潮見町地区 (完成) 漁港



気仙沼市 気仙沼漁港海岸 大浦・浪板地区 (施工中) 漁港



気仙沼市 日門漁港海岸 日門地区 (施工中) 漁港



海岸堤防（防潮堤）の復旧・復興状況について

（R8年3月末）

区分	事業者	復旧・復興計画		箇所完了		実完成延長 【km】 (E)	実完成率 【%】 (E/B)
		箇所数 (A)	延長 【km】 (B)	箇所数 (C)	延長 【km】 (D)		
農地海岸	国・県	98	26.2	98	26.2	26.2	100%
漁港海岸	国・県・市・町	145	78.6	<u>142</u>	<u>76.0</u>	<u>78.4</u>	99%
建設海岸	国・県	66	61.9	66	61.9	61.9	100%
港湾海岸	県	37	52.6	37	52.6	52.6	100%
治山	国・県	23	13.5	23	13.5	13.5	100%
合計		369	232.8	<u>366</u>	<u>230.2</u>	<u>232.6</u>	99%

- ・表中の黒字アンダーラインは、前回(R7.3月末時点)からの変更になります。
- ・表中の「箇所完了(延長)」と「実完成延長」は下記のとおりです。
 「箇所完了(延長)」=完了した箇所での施工(完了)した合計延長
 「実完成延長」 =「箇所完了(延長)」+施工中の箇所において部分的に完成した合計延長
