


出島架橋事業だより

Vol.3
令和5年3月

日頃より、町道女川出島線の出島架橋事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
出島架橋工事は、女川町の依頼を受け宮城県が進めております。
近隣の皆様へ、令和5年1月22日より実施していました出島架橋の上部工部材の海上輸送が完了したのでお知らせいたします。

工事場所

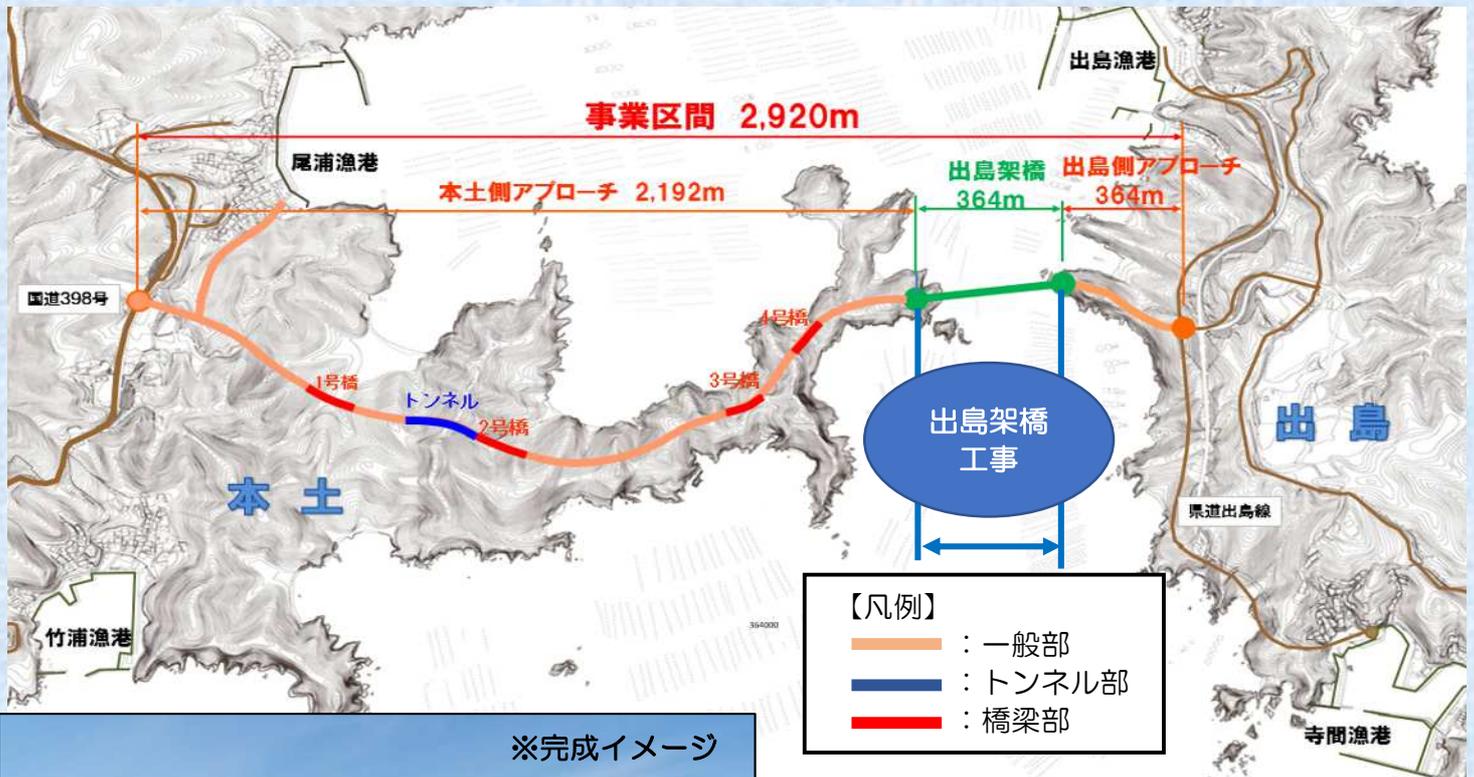

※完成イメージ



※完成イメージ



橋梁諸元

橋長	364.0m	鋼材重量	約4,100t
有効幅員	6.50m	橋梁形式	鋼中路式
アーチ支間	306.0m		アーチ橋

お問い合わせはこちらまで

★出島架橋本体工事に関して★

宮城県 東部土木事務所
〒986-0850 石巻市あゆみ野五丁目7番地
電話：0225-98-3157

★事業全体に関して★

女川町 建設課 土木係
〒986-2265 牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
電話：0225-54-3131

裏面には
「進捗状況と今後の予定」
の記載があります。

上部工部材 海上輸送完了

水切り状況

重量
約130 t

撮影：R5.1.30




場内運搬状況

250 t まで運べる特殊台車を使用

撮影：R5.1.30



海上輸送されてきた上部工部材を750 t 吊級クレーンで水切り（陸揚げ）を行いました。

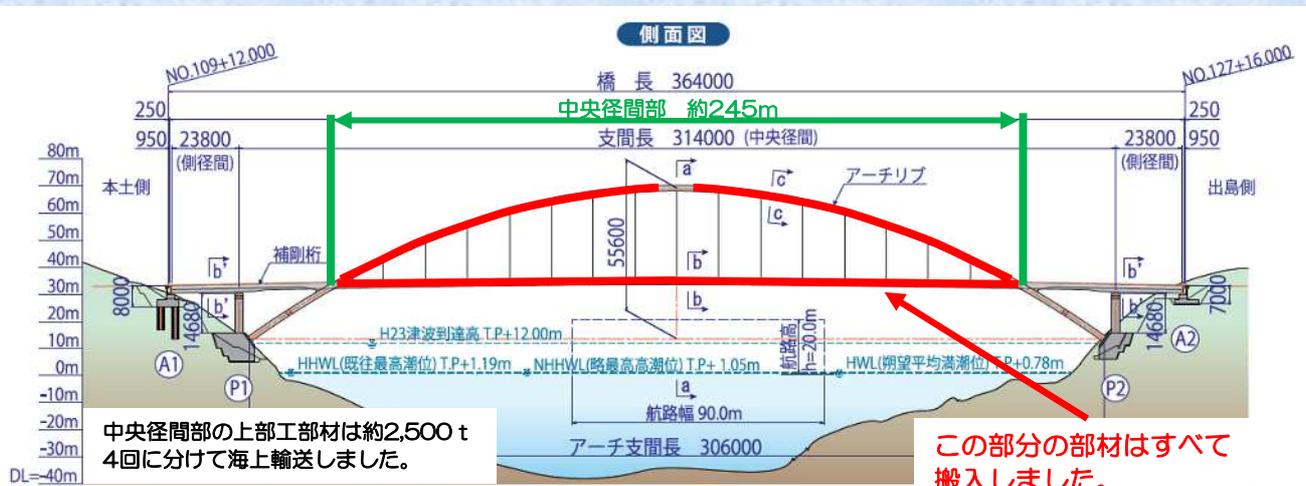

女川港石浜ヤードの状況

500t吊級
クローラークレーン

女川港石浜ヤード



今後の予定

進捗率：全体 54% 上部工：工場製作 94%、現地工事 10%
(R5.2月末現在) 下部工：現地工事 70%

●上部工●

運ばれてきた上部工部材（補剛桁・アーチリブ）の組立・溶接・塗装を行います。また、令和5年4月より架設位置周辺にて海上バント（橋桁をささえる仮の受台）の設置準備作業を開始し、令和5年秋頃の架設を目指します。

●下部工●

P1橋脚、P2橋脚の完成を令和4年度末を目標に施工を進めており、その後本土側並びに出島側の橋台を施工する予定です。
