


# 出島架橋事業だより

日頃より、町道女川出島線の出島架橋事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。当事業のうち、「出島架橋本体工事」は、女川町から依頼を受け、宮城県が施工を進めています。この度、女川港石浜ヤードで地組立をしていた中央径間アーチ部について、閉合が完了しました。また、架橋地点では橋脚が完成するとともに、「海上バント」のバント杭の施工を開始しました。

## 工事場所

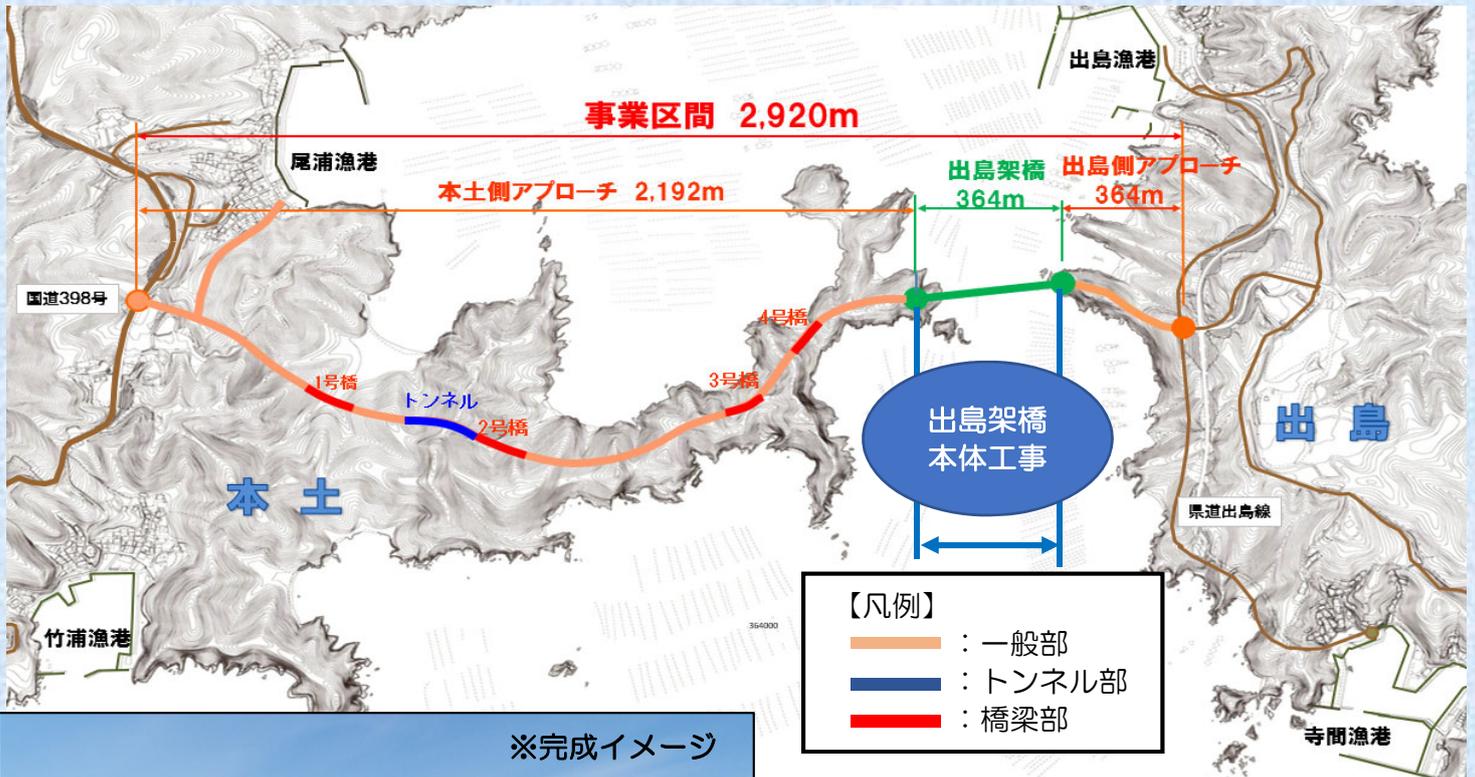

※完成イメージ



※完成イメージ



### 橋梁諸元

橋長	364.0m	鋼材重量	約4,100t
有効幅員	6.50m	橋梁形式	鋼中路式
7-7支間	306.0m		アーチ橋

## お問い合わせはこちらまで

### ★出島架橋本体工事に関して★

宮城県 東部土木事務所  
〒986-0850 石巻市あゆみ野五丁目7番地  
電話：0225-98-3145

### ★事業全体に関して★

女川町 建設課 土木係  
〒986-2265 牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1  
電話：0225-54-3131


裏面には  
「進捗状況と今後の予定」  
の記載があります。

# 工事の進捗状況

## アーチ閉合状況



## P1橋脚 完成

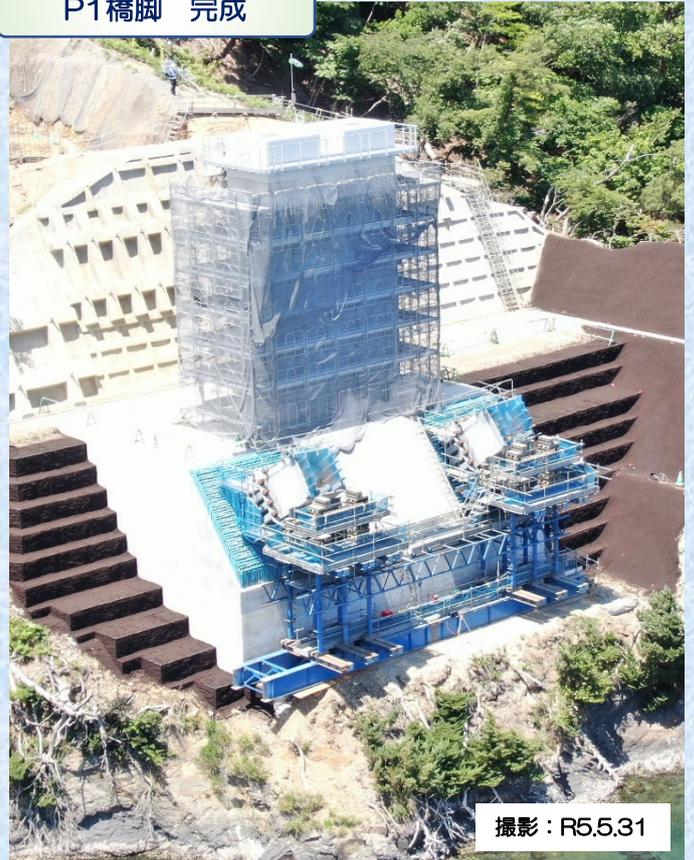

## バント杭打設状況



P1橋脚、P2橋脚が完成しました。  
引き続き、橋台の施工を進めます。

## 女川港石浜ヤードの状況



## 今後の予定

進捗率：全体 59%  
(R5.5月末現在)

上部工：工場製作 94%、現地工事 21%  
下部工：現地工事 79%

### ●上部工●

女川港石浜ヤードでは、引き続き、中央径間部の現場溶接・現場塗装を進めます。  
また、架橋地点では、引き続き、海上バントの設置作業を進めます。

### ●下部工●

架橋地点において、引き続き、本土側及び出島側の橋台の施工を進めます。  
なお、橋台の完成は、令和5年7月を予定しています。
