


出島架橋事業だより

日頃より、町道女川出島線の出島架橋事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。当事業のうち、「出島架橋本体工事」は、女川町から依頼を受け、宮城県が施工を進めています。昨年11月に架設した橋体同士との現場溶接が完了したため、仮設材の撤去を実施しています。また、今月から海上バント（橋体を支える仮の支柱）の解体・撤去作業を開始します。

工事場所

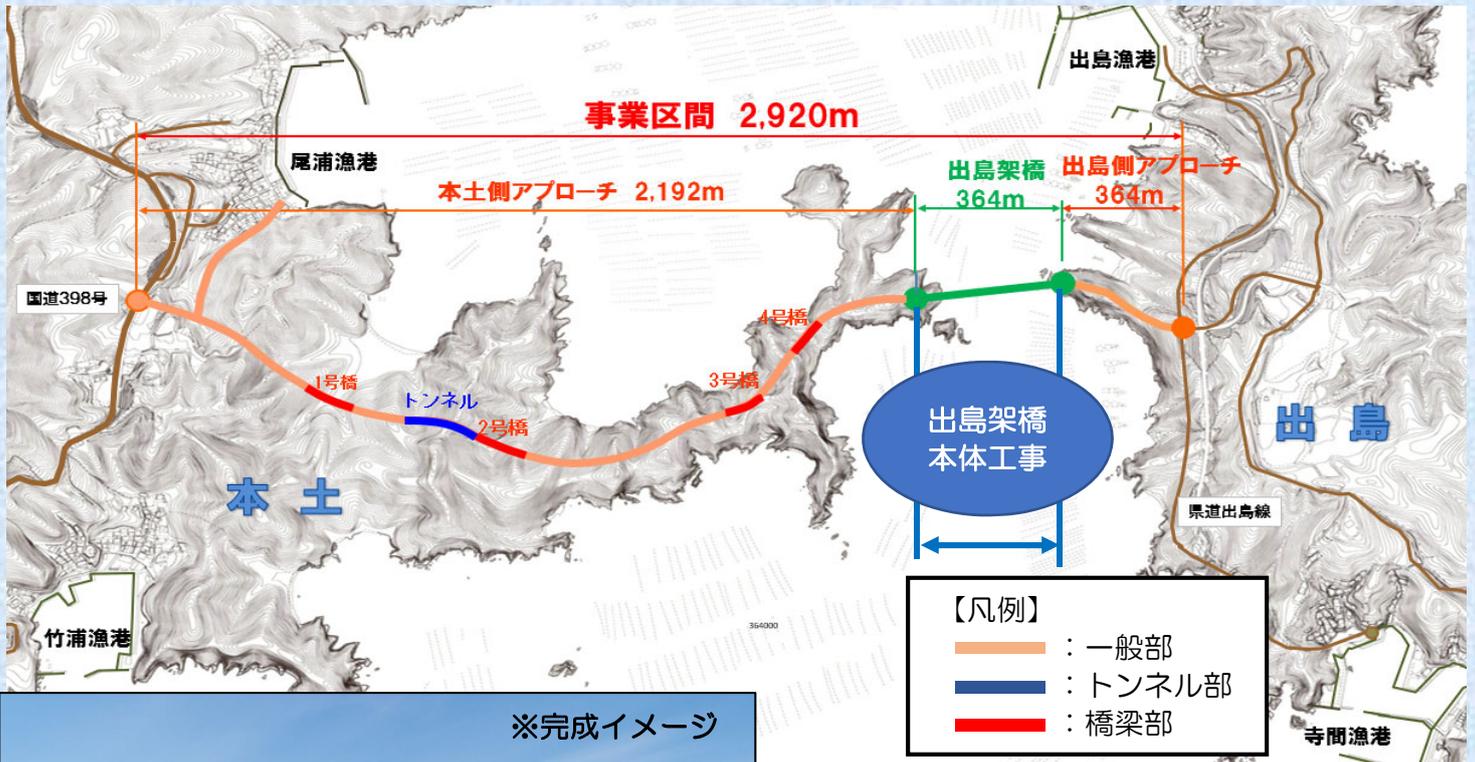

※完成イメージ



※完成イメージ



橋梁諸元

橋長	364.0m	鋼材重量	約4,100t
有効幅員	6.50m	橋梁形式	鋼中路式
アチ支間	306.0m		アーチ橋

お問い合わせはこちらまで

★出島架橋本体工事に関して★

宮城県 東部土木事務所
〒986-0850 石巻市あゆみ野五丁目7番地
電話：0225-98-3145

★事業全体に関して★

女川町 建設課 土木係
〒986-2265 牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
電話：0225-54-3131

女川町公式サイト
(You Tube)


★架設ライブ配信



裏面には
「進捗状況と今後の予定」
の記載があります。

工事の進捗状況

架設作業 直後

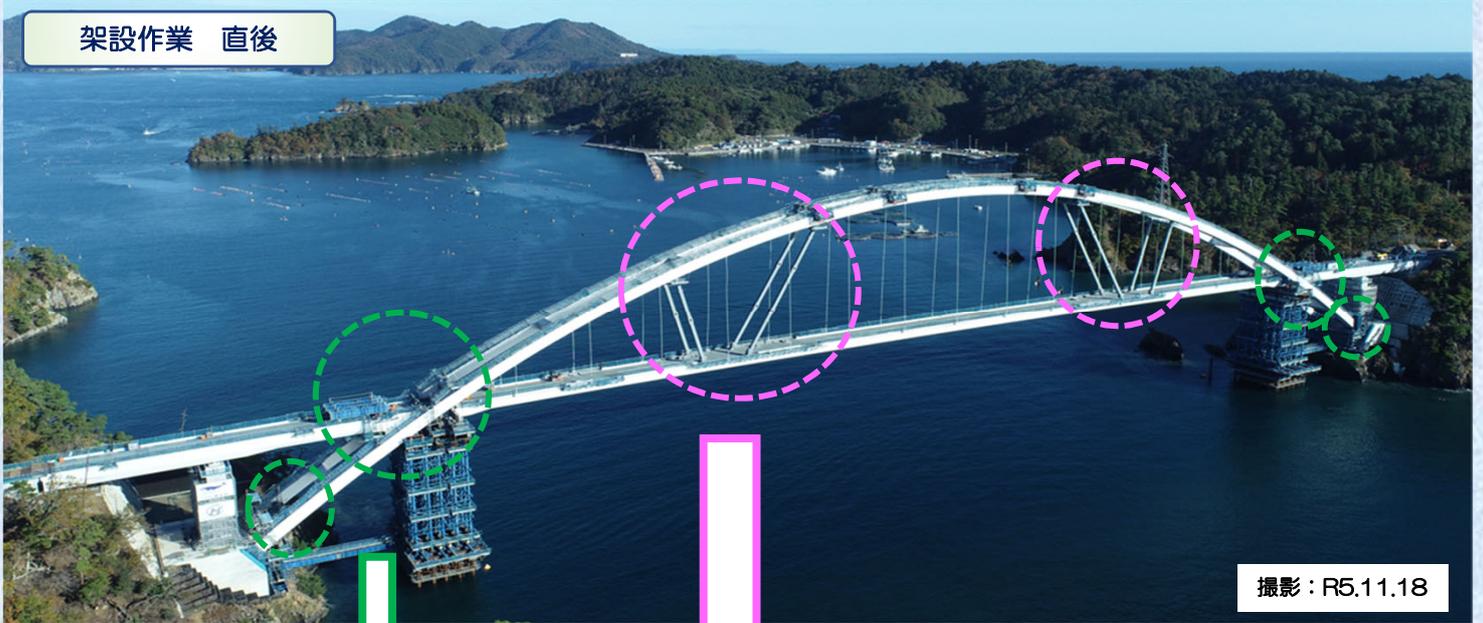


撮影：R5.11.18

現状

仮支材の撤去完了

架設継手部 現場溶接完了

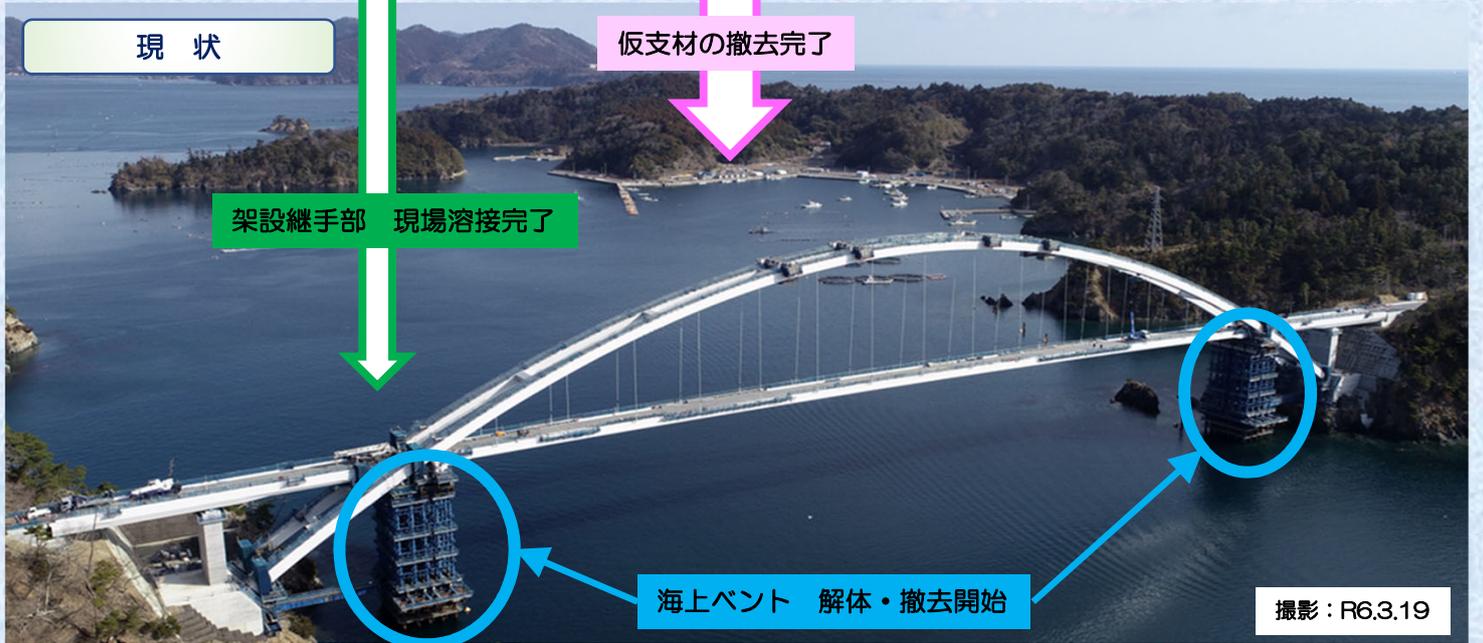

撮影：R6.3.19

今後の予定

進捗率：全体 90%
(R6.3月末現在)

上部工：工場製作 100%、現地工事 89%
下部工：現地工事 96%

「海上バント」の解体・撤去を橋面上（橋の道路部）に設置した大型クレーンやクレーン付き台船を使用して実施します。
また、橋面上では橋の両端部への伸縮装置の設置や通行車両が安全に走行するための地覆や車両防護柵の設置準備を行います。

