


東日本大震災からの災害復旧事業と復興に向けた  
 「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」の進捗状況について

土木部では、東日本大震災の教訓を踏まえた復旧・復興を図るため、最重点項目として「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」を推進しており、公共土木施設の災害復旧事業の他、津波対策、復興まちづくり事業、復興住宅の整備について、平成25年2月末現在の進捗状況を別紙のとおりまとめた。

1 公共土木施設の災害復旧事業（県事業）

- 公共土木施設全体の災害復旧事業の復旧完了箇所を含む着手率は、箇所ベースで約87%、金額ベースで約26%となっている。
- 内陸部では、箇所ベースで約99%、金額ベースで約88%の着手率となっている。道路・橋梁、河川、砂防施設災害について、概ね全ての箇所に着手しており、平成25年度には全て完了する予定である。
- 沿岸部では、箇所ベースで約80%、金額ベースで約24%の着手率になっている。
- 沿岸部の道路橋梁施設の箇所ベースの着手率は、先月から11割プラスの約85%となっており、施設の復旧完了率も高めている。
- 下水道処理施設については、既に全ての施設の復旧工事に着手しており、今年3月までには被災した沿岸2流域の下水道処理施設について、完全復旧する見込みとなっている。

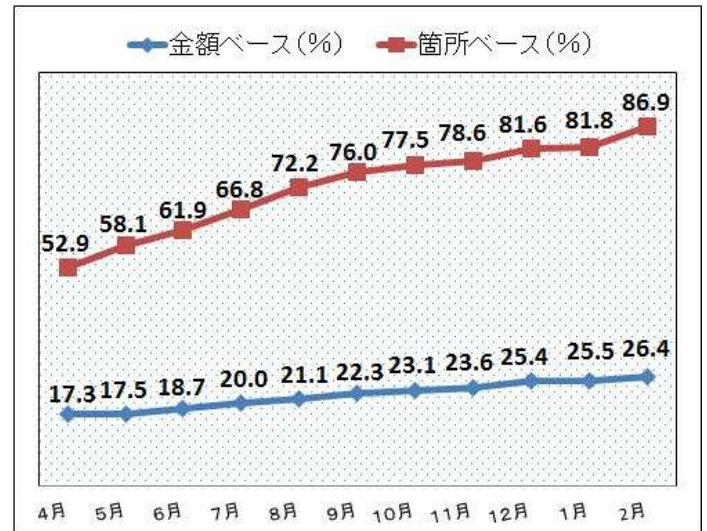

公共土木施設の災害復旧工事全体（県事業）の  
 事業着手率の推移（平成24年度）

なお、県南浄化センター（岩沼市）汚泥燃料化施設については、主要機器類の据え付けが完了し、完全復旧に向けての試運転調整を開始した。

- 河川、海岸施設は復旧工事に順次着手しており、今後、本格復旧の一層の進捗を図っていく。

なお、仙台塩釜港石巻港区においては、2月12日に雲雀野中央埠頭荷捌地の災害復旧工事が完了し、2月19日には、完成した中島3号岸壁の供用を開始した。

仙台塩釜港各港区で荷役に利用される上屋は、震災で大きく被災したが、上屋6棟(仙台港区1棟、塩釜港区4棟、石巻港区1棟)の復旧工事に年度内に着手する。

左：応急復旧後  
 右：復旧後



2月1日 山元町太陽ニュータウン町道・浅生原下宮前南線（県が山元町より受託）

左：応急復旧後  
 右：復旧後



2月26日（主）気仙沼本吉線 被災5箇所の本復旧工事完了



2月26日 県南浄化センター汚泥燃料化施設 試運転開始



仙台塩釜港石巻港区 中島3号岸壁

# 公共土木施設の復旧工事の進捗状況 (公共土木施設災害復旧事業：県事業)

○「次世代に豊かさを引き継ぐことのできる持続可能なみやぎの県土づくり」の理念のもと、県民の命と生活を守り、震災を乗り越え、更なる発展につなげる県土づくりを目指して取り組んでいます。

項目 (最大被害等)	(着手済み) / (復旧費)	着手率	項目 (最大被害等)	(着手済み) / (復旧費)	着手率
道路・橋梁施設 (復旧工事)	<p>金額ベース 箇所ベース</p>	金額ベース 約48% 箇所ベース 約91%	下水道施設 (復旧工事)	<p>金額ベース 箇所ベース</p>	金額ベース 約97% 箇所ベース 約100%
被災箇所数: 道路 1,437箇所 橋梁 128箇所		復旧事業の概要 期間 H23~27年度 復旧費 約842億円	被災箇所数: 121箇所		復旧事業の概要 期間 H23~25年度 復旧費 約402億円
河川施設 (復旧工事)	<p>金額ベース 箇所ベース</p>	金額ベース 約4% 箇所ベース 約90%	港湾施設 (復旧工事)	<p>金額ベース 箇所ベース</p>	金額ベース 約34% 箇所ベース 約63%
被災箇所数: 278箇所		復旧事業の概要 期間 H23~27年度 復旧費 約2,420億円	被災箇所数: 292箇所		復旧事業の概要 期間 H23~27年度 復旧費 約884億円
海岸保全施設 (復旧工事)	<p>金額ベース 箇所ベース</p>	金額ベース 約16% 箇所ベース 約62%	<b>公共土木施設</b> (道路、橋梁、河川、海岸、砂防、下水道、港湾、公園)  <b>金額・箇所着手率</b> <b>【H25.2.28現在】</b>	<p>金額ベース 箇所ベース</p>	金額ベース 約26% 箇所ベース 約87%
被災箇所数: 74施設		復旧事業の概要 期間 H23~27年度 復旧費 約797億円		被災箇所数: 2,352箇所	
砂防・地滑・急傾斜施設 (復旧工事)	<p>金額ベース 箇所ベース</p>	金額ベース 約98% 箇所ベース 約89%	沿岸部 金額ベース 約24% 箇所ベース 約80%		
被災箇所数: 9施設		復旧事業の概要 期間 H23~24年度 復旧費 約8億円	内陸部 金額ベース 約88% 箇所ベース 約99%		

# 土木部最重点項目 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築の推進

平成25年2月末現在

市町名	津波対策				復興まちづくり事業				復興住宅の整備			
	土木部所管 河川災害復旧事業		土木部所管 海岸(建設・港湾)災害復旧事業		防災集団移転促進事業		土地区画整理事業		災害公営住宅			
	箇所数	上段:済・率(応急工事を含む工事着手) 下段:済・率(本格工事着手)	箇所数	上段:済・率(応急工事を含む工事着手) 下段:済・率(本格工事着手)	計画地区数	上段:済・率(事業計画同意) 下段:済・率(造成工事着手)	計画地区数	上段:済・率(都市計画決定) 下段:済・率(事業認可)	計画戸数	上段:済・率(事業着手) 下段:済・率(建築工事着手)		
気仙沼市	7	7 100.0% 1 14.3%	27	15 55.6% 0 0.0%	43	41 95.3% 0 0.0%	3	2 66.7% 0 0.0%	※3 2,000	730 36.5% 0 0.0%		
南三陸町	10	8 80.0% 0 0.0%	6	4 66.7% 1 16.7%	27	27 100.0% 2 7.4%	1	1 100.0% 0 0.0%	930	84 9.0% 84 9.0%		
石巻市	8	6 75.0% 2 25.0%	22	15 68.2% 4 18.2%	56	48 85.7% 9 16.1%	15	7 46.7% 2 13.3%	4,000	1,119 28.0% 149 3.7%		
女川町	1	0 100.0% 0 0.0%	6	4 66.7% 3 50.0%	22	22 100.0% 4 18.2%	1※2	1 100.0% 1 100.0%	945	200 21.2% 200 21.2%		
東松島市	4	4 100.0% 1 25.0%	7	5 71.4% 2 28.6%	7	7 100.0% 7 100.0%	5	2 40.0% 2 40.0%	1,010	197 19.5% 0 0.0%		
松島町	1	0 0.0% 0 0.0%	11	0 0.0% 0 0.0%					52	40 76.9% 0 0.0%		
利府町									25	25 100.0% 0 0.0%		
塩竈市			22	6 27.3% 0 0.0%	2	2 100.0% 0 0.0%	2	2 100.0% 0 0.0%	300	71 23.7% 31 10.3%		
七ヶ浜町			17	6 35.3% 1 5.9%	5	5 100.0% 1 20.0%	4	0 0.0% 0 0.0%	222	222 100.0% 0 0.0%		
多賀城市	1	1 100.0% 0 0.0%					1	0 0.0% 0 0.0%	532	160 30.1% 0 0.0%		
仙台市	2	2 100.0% 1 50.0%	3	2 66.7% 2 66.7%	14	14 100.0% 5 35.7%	1	0 0.0% 0 0.0%	3,000	1,206 40.2% 455 15.2%		
名取市	3	3 100.0% 0 0.0%	1	1 100.0% 1 100.0%	1	1 100.0% 0 0.0%	1	1 100.0% 0 0.0%	(1,000)	0 0.0% 0 0.0%		
岩沼市	3	3 100.0% 0 0.0%	2	2 100.0% 2 100.0%	2	2 100.0% 2 100.0%			224	224 100.0% 0 0.0%		
亘理町					5	5 100.0% 0 0.0%			520	400 76.9% 0 0.0%		
山元町	2	2 100.0% 0 0.0%	2	2 100.0% 2 100.0%	3	3 100.0% 0 0.0%			600	90 15.0% 50 8.3%		
その他6市町(※1)									347	207 59.7% 40 11.5%		
合計	42	36 85.7% 5 11.9%	126	62 49.2% 18 14.3%	187	177 94.7% 30 16.0%	34	16 47.1% 5 14.7%	15,000	4,975 33.2% 1,009 6.7%		

※1:登米市, 栗原市, 大崎市, 大郷町, 涌谷町, 美里町

※津波復興拠点整備事業は、8市町10地区が計画され、うち5地区が都市計画決定済みとなっている。

※2:女川町は事業認可を2箇所取得しているが、1地区として計上している。

※3:計画戸数合計15,000戸は、宮城県復興住宅計画における整備目標。( )書きは県の試算値。

グラフ中の■は先月に対する増加分を示す

# 災害公営住宅の整備状況について

災害公営住宅の整備状況(事業着手したもの 平成25年2月28日現在)

※下線部は、前回公表時(平成25年1月31日時点)からの変更点 ※網掛けの地区・団地は、今回追加

No	市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定(年度)	進捗状況
1	仙台市	田子西地区	176 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
2		荒井東地区(一期)	197 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
3		鹿野地区	70 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
4		若林西地区	152 戸	買い取り(民間)	H25	設計着手
5		北六番丁地区	12 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
6		上原地区	30 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
7		鶴ヶ谷第二地区	30 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
8		荒井東地区(二期)	100 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
9		通町地区	150 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
10		霊屋地区	100 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
11		霊屋下地区	40 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
12		落合地区	110 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
13		芦の口地区	39 戸	買い取り(民間)	H25	設計(改修)着手
14	石巻市	黄金浜地区	60 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
15		吉野町一丁目地区	160 戸	直接建設(県受託)	H27	設計着手
16		黄金浜(北)地区	100 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
17		大街道西二丁目地区	20 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
18		大街道北二丁目地区	40 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
19		中央一丁目地区	50 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
20		駅前北通り一丁目地区	60 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
21		泉町四丁目地区	30 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
22		中里一丁目地区	30 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
23		新蛇田地区	350 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
24		新沼地区	30 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
25		筒場地区	40 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
26		根上松地区	20 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
27		沖六勺(万石浦A)地区	35 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
28		沖六勺(万石浦B)地区	26 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
29		中里七丁目地区	20 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
30		南中里一丁目地区	48 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
31	塩竈市	伊保石地区	31 戸	買い取り(UR)	H25	工事着手
32		錦町地区	40 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
33	気仙沼市	南郷地区(南気仙沼小学校跡地)	160 戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
34		四反田地区	70 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
35		鹿折地区	200 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
36		南気仙沼地区	300 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
37	多賀城市	桜木地区	160 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
38	岩沼市	玉浦西地区	224 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
39	登米市	迫地区	30 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
40		中田地区	9 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
41		東和地区	5 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
42		豊里地区	6 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
43	栗原市	若柳地区	10 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
44		栗駒地区	4 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
45		高清水地区	1 戸	直接建設(市)	H25	設計着手

No	市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定 (年度)	進捗状況
46	東松島市	鳴瀬給食センター跡地地区	21 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
47		矢本東保育所移転跡地地区	20 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
48		小松谷地地区	156 戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
49	大崎市	鹿島台地区	45 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
50		田尻地域	5 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
51	亶理町	荒浜地区	100 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
52		下茨田地区	125 戸	直接建設(県受託)	H27	協定締結
53		上浜街道地区	125 戸	直接建設(県受託)	H27	協定締結
54		吉田地区	50 戸	直接建設(町)	H27	設計着手
55	松島町	磯崎華園地区	17 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
56		磯崎美咲の丘地区	23 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
57	山元町	新山下駅周辺地区第1期	50 戸	直接建設(県受託)	H25	工事着手
58		新山下駅周辺地区第2期	40 戸	直接建設(県受託)	H25	設計着手
59	七ヶ浜町	菖蒲田浜地区	105 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
60		松ヶ浜地区	32 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
61		花淵浜地区	50 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
62		吉田浜地区	10 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
63		代ヶ崎浜地区	25 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
64	利府町	加瀬地区	25 戸	直接建設(町)	H25	設計着手
65	大郷町	中村地区	4 戸	直接建設(町)	H26	設計着手
66	涌谷町	洪江地区	28 戸	直接建設(町)	H26	設計着手
67		六軒町裏地区	8 戸	直接建設(町)	H26	設計着手
68		中江南地区	12 戸	直接建設(町)	H27	設計着手
69	美里町	牛飼地区	24 戸	直接建設(町)	H25	工事着手
70		中埜地区	6 戸	直接建設(町)	H25	工事着手
71		練牛地区	10 戸	直接建設(町)	H25	工事着手
72	女川町	女川町民陸上競技場跡地地区	200 戸	買い取り(UR)	H25	工事着手
73	南三陸町	入谷桜沢地区	42 戸	買い取り(UR)	H25	工事着手
			9 戸	買い取り(民間)	H25	工事着手
74		歌津名足地区	28 戸	買い取り(UR)	H25	工事着手
			5 戸	買い取り(民間)	H25	工事着手
計	20市町	74地区	4,975 戸			

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

(工事着手状況)

市町数	地区数	計画戸数
7 市町	17 地区	1,009 戸

(整備手法別集計) ※事業着手したもの

	県受託	UR買い取り	市町直接建設	民間買い取り	民間借り上げ
市町数	7 市町	6 市町	9 市町	3 市町	1 市
地区数	21 地区	16 地区	29 地区	5 地区	5 地区
計画戸数	1,707 戸	1,461 戸	1,297 戸	361 戸	149 戸

※各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukuiuu/>
