

## 東日本大震災からの復旧・復興事業の進捗状況

(平成26年9月末現在)


公共土木施設の災害復旧事業の進捗状況及び土木部最重点項目の「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」を推進するための津波対策、復興まちづくり事業、復興住宅の整備について、平成26年9月末現在の状況を以下のとおりまとめた。

### 1 公共土木施設の災害復旧事業（県事業）

- 公共土木施設全体 2,322箇所のうち、**2,173箇所**（全体の約94%）に着手しており、そのうち**1,844箇所**（全体の約79%）が完成している。なお、金額ベースでは着手率が約64%、完成率が約21%となっている。

#### <内陸・沿岸部別>

- 内陸部では、808箇所の**全てにおいて着手**しており、そのうち**804箇所**（全体の約99%）が完成している。なお、金額ベースでは着手率が約90%、完成率が約88%となっている。
- 沿岸部では、1,514箇所のうち、**1,365箇所**（全体の約90%）に着手しており、そのうち**1,040箇所**（全体の約69%）が完成している。なお、金額ベースでは着手率が約62%、完成率が約18%となっている。

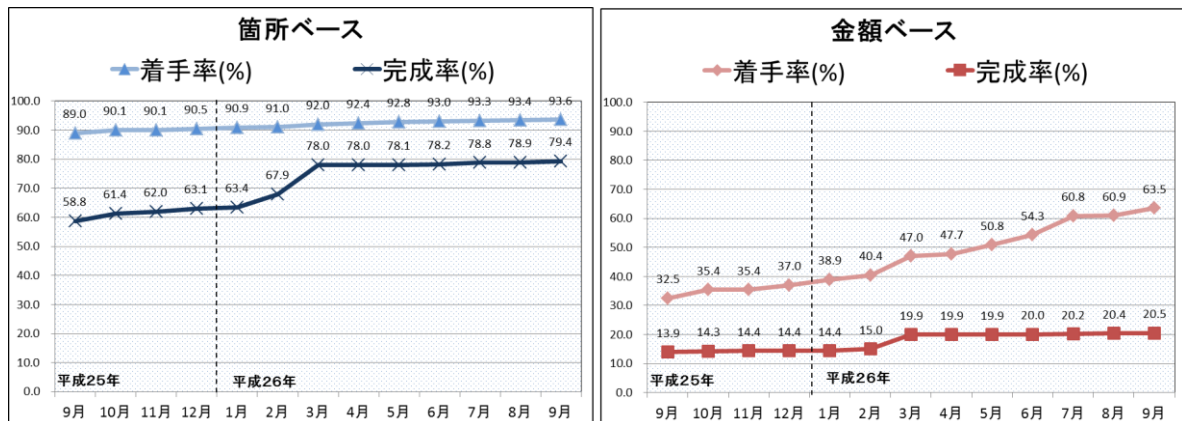

公共土木施設の災害復旧工事全体（県事業）の着手率・完成率（%）の推移

### 2 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築

#### (1) 津波対策

##### <河川災害復旧事業>

- 津波対策箇所42箇所のうち、**30箇所**（全体の約71%）について、本格復旧工事に着手している。

##### <海岸（建設・港湾）災害復旧事業>

- 津波対策箇所126箇所のうち、**57箇所**（全体の約45%）について、本格復旧工事に着手している。



女川 護岸工事状況（女川町）



菖蒲田海岸 堤防工事状況（七ヶ浜町）



五間堀川 被災した構造物の取壊し状況（岩沼市）

## (2) 復興まちづくり事業

### <防災集団移転促進事業>

- 12市町195地区で計画されており、**全地区で大臣同意**を得ている。
- 造成工事着手地区数は、県全体で12市町**191地区**（全体の約98%）となっている。
- 住宅等建築工事可能※地区数は、新たに名取市の1地区、女川町の2地区が増え、県全体で10市町**38地区**（全体の約20%）となっている。

（※住宅等建築工事可能とは、土地を購入又は借地し、建築工事の準備が整った状態のことを示す）



戸倉地区 造成工事状況（南三陸町）

### <土地区画整理事業>

- 10市町34地区で計画されており、都市計画決定及び事業認可地区は、県全体で10市町**28地区**（全体の約82%）となっている。
- 工事着工地区数は、県全体で8市町**23地区**（全体の約68%）となっている。



新山下駅周辺地区 造成工事状況（山元町）

### <津波復興拠点整備事業>

- 8市町12地区で計画されており、事業認可地区数は、気仙沼市、南三陸町（2地区）、女川町、塩竈市、多賀城市、山元町（2地区）の**8地区**（全体の約67%）となっている。
- 工事着工地区数は、気仙沼市、南三陸町（2地区）、女川町、山元町（2地区）の**6地区**（全体の50%）となっている。

## (3) 災害公営住宅の整備

- 現時点の整備計画戸数15,561戸のうち、21市町220地区、**12,573戸**の整備に着手（8月末比+267戸）し、うち、21市町148地区、**7,859戸**は工事着手（8月末比+868戸）している。
- 工事完了戸数は、14市町47地区、**1,794戸**（8月末比+43戸）となっている。
- 整備手法別の事業着手状況は、

・ 県受託	9市町	30地区	2,591戸
・ 独立行政法人都市再生機構の買い取り	8市町	33地区	3,161戸
・ 市町直接建設	12市町	44地区	1,980戸
・ 民間買い取り	10市町	116地区	4,692戸
・ 民間借り上げ	1市	5地区	1,49戸

となっている。



大須地区（石巻市）



出島地区（女川町）

# 公共土木施設の復旧工事の進捗状況

(公共土木施設災害復旧事業：県事業)

【平成26年9月末現在】

○「次世代に豊かさを引き継ぐことのできる持続可能なみやぎの県土づくり」の理念のもと、県民の命と生活を守り、震災を乗り越え、更なる発展につなげる県土づくりを目指して取り組んでいます。

項目 (最大被害等)	項目 (着手・完成) / (復旧箇所・復旧費)	進捗率	項目 (最大被害等)	項目 (着手・完成) / (復旧箇所・復旧費)	進捗率
<b>道路・橋梁施設 (復旧工事)</b> 復旧事業の概要 期間 H23～27年度 復旧費 約842億円	(着手・完成) / (復旧箇所・復旧費) 被災箇所数: 道路 1,421箇所 橋梁 125箇所	箇所ベース 着手率 約97% 完成率 約90% 金額ベース 着手率 約60% 完成率 約46%	<b>下水道施設 (復旧工事)</b> 復旧事業の概要 期間 H23～25年度 復旧費 約402億円	(着手・完成) / (復旧箇所・復旧費) 被災箇所数: 121箇所	箇所ベース 着手率 100% 完成率 100% ※ 金額ベース 着手率 100% 完成率 100%
<b>河川施設 (復旧工事)</b> 復旧事業の概要 期間 H23～27年度 復旧費 約2,420億円	被災箇所数: 274箇所	箇所ベース 着手率 約95% 完成率 約77% 金額ベース 着手率 約56% 完成率 約3%	<b>港湾施設 (復旧工事)</b> 復旧事業の概要 期間 H23～27年度 復旧費 約884億円	被災箇所数: 292箇所	箇所ベース 着手率 約70% 完成率 約37% 金額ベース 着手率 約57% 完成率 約22%
<b>海岸保全施設 (復旧工事)</b> 復旧事業の概要 期間 H23～27年度 復旧費 約797億円	被災箇所数: 74施設	箇所ベース 着手率 約92% 完成率 約7% 金額ベース 着手率 約80% 完成率 約1%	<b>公共土木施設 (道路橋梁、河川、海岸、砂防、下水道、港湾、公園)</b> 復旧事業の概要 期間 H23～27年度 復旧費 約5,376億円	被災箇所数: 2,322箇所	箇所ベース 着手率 約94% 完成率 約79% 金額ベース 着手率 約64% 完成率 約21%
<b>砂防・地滑・急傾斜施設 (復旧工事)</b> 復旧事業の概要 期間 H23～24年度 復旧費 約8億円	被災箇所数: 8施設	箇所ベース 着手率 100% 完成率 100% ※ 金額ベース 着手率 100% 完成率 100%	<b>沿岸部</b> 箇所ベース 着手率 約90% 金額ベース 約62%	<b>内陸部</b> 箇所ベース 着手率 100% 金額ベース 約90%	凡例 着手 (薄緑) 完成 (濃緑)

※終了したものは100%表示

(空白)

# 土木部最重点項目

# 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築の推進

平成28年9月末現在

市町名	津波対策			復興まちづくり事業			災害公営住宅の整備		
	箇所数	上段：済・率 (応急工事を含む工事着手) 下段：済・率 (本相工事着手)	進捗率	計画地区数	上段：済・率 (造成工事着手等) 下段：済・率 (住宅等建築工事可能)	進捗率	計画戸数	上段：済・率 (事業着手) 下段：済・率 (建築工事着手)	進捗率
気仙沼市	7	7 100.0% 4 57.1%	24 88.9% 20 74.1%	52	51 98.1% 1 1.9%	3 100.0% 3 100.0%	2,168	2,088 96.3% 235 10.8%	2,088 96.3% 235 10.8%
南三陸町	10	9 90.0% 7 70.0%	6 100.0% 5 83.3%	26	26 100.0% 6 23.1%	1 100.0% 1 100.0%	770	719 93.4% 224 29.1%	719 93.4% 224 29.1%
石巻市	8	7 87.5% 4 50.0%	14 63.6% 8 36.4%	56	53 94.6% 4 7.1%	15 12 80.0% 11 73.3%	4,000	2,871 71.8% 2,037 50.9%	2,871 71.8% 2,037 50.9%
女川町	1	1 100.0% 1 100.0%	4 66.7% 3 50.0%	21	21 100.0% 3 14.3%	1※2 100.0% 1 100.0%	945	489 51.7% 225 23.8%	489 51.7% 225 23.8%
東松島市	4	4 100.0% 4 100.0%	5 71.4% 3 42.9%	7	7 100.0% 5 71.4%	5 2 40.0% 2 40.0%	1,010	657 65.0% 415 41.1%	657 65.0% 415 41.1%
松島町	1	1 100.0% 1 100.0%	2 18.2% 2 18.2%				52	52 100.0% 52 100.0%	52 100.0% 52 100.0%
利府町							25	25 100.0% 25 100.0%	25 100.0% 25 100.0%
雄勝町				2	2 100.0% 0 0%	2 100.0% 1 50.0%	420	346 82.4% 94 22.4%	346 82.4% 94 22.4%
七ヶ浜町				5	5 100.0% 4 80.0%	4 100.0% 3 75.0%	212	212 100.0% 212 100.0%	212 100.0% 212 100.0%
多賀城市	1	1 100.0% 1 100.0%				1 100.0% 0 0%	532	482 90.6% 482 90.6%	482 90.6% 482 90.6%
仙台市	2	2 100.0% 2 100.0%	2 66.7% 2 66.7%	14	14 100.0% 7 50.0%	1 100.0% 0 0%	3,180	3,116 98.0% 2,584 81.3%	3,116 98.0% 2,584 81.3%
名取市	3	3 100.0% 3 100.0%	1 100.0% 1 100.0%	2	2 100.0% 1 50.0%	1 100.0% 1 100.0%	716	92 12.8% 92 12.8%	92 12.8% 92 12.8%
岩沼市	3	3 100.0% 2 66.7%	2 100.0% 2 100.0%	2	2 100.0% 2 100.0%		210	210 100.0% 210 100.0%	210 100.0% 210 100.0%
亶理町				5	5 100.0% 5 100.0%		477	477 100.0% 477 100.0%	477 100.0% 477 100.0%
山元町	2	2 100.0% 1 50.0%	2 100.0% 2 100.0%	3	3 100.0% 0 0%		484	401 82.9% 159 32.9%	401 82.9% 159 32.9%
その他6市町(※1)							360	336 93.3% 336 93.3%	336 93.3% 336 93.3%
合計	42	40 95.2% 30 71.4%	78 61.9% 57 45.2%	195	191 97.9% 38 19.5%	34 28 82.4% 23 67.6%	15,561	12,573 80.8% 7,859 50.5%	12,573 80.8% 7,859 50.5%

※1: 登米市、栗原市、大崎市、大郷町、涌谷町、美里町  
 ※2: 女川町は事業認可を申請しているが、1地区として計上している。  
 ●津波復興拠点整備事業は、8市町12地区が計画され、8地区が事業認可済みとなっており、うち6地区が工事着手となっている。

(空白)

# 災害公営住宅の整備状況について

(平成26年9月30日現在)

- 災害公営住宅については、平成26年9月末時点で21市町、220地区、12,573戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、21市町、148地区、7,859戸について着工し、14市町、47地区、1,794戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

## ○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		うち、工事着手戸数		うち、工事完了戸数	
			進捗率		進捗率		進捗率
01 仙台市	3,180戸	3,116戸	98.0%	2,584戸	81.3%	701戸	22.0%
02 石巻市	4,000戸	2,871戸	71.8%	2,037戸	50.9%	152戸	3.8%
03 塩竈市	420戸	346戸	82.4%	94戸	22.4%	31戸	7.4%
04 気仙沼市	2,168戸	2,088戸	96.3%	235戸	10.8%	0戸	
05 名取市	716戸	92戸	12.8%	92戸	12.8%	0戸	
06 多賀城市	532戸	482戸	90.6%	482戸	90.6%	0戸	
07 岩沼市	210戸	210戸	100.0%	210戸	100.0%	0戸	
08 登米市	84戸	60戸	71.4%	60戸	71.4%	38戸	45.2%
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	657戸	65.0%	415戸	41.1%	254戸	25.1%
11 大崎市	170戸	170戸	100.0%	170戸	100.0%	40戸	23.5%
12 亘理町	477戸	477戸	100.0%	477戸	100.0%	112戸	23.5%
13 山元町	484戸	401戸	82.9%	159戸	32.9%	91戸	18.8%
14 松島町	52戸	52戸	100.0%	52戸	100.0%	0戸	
15 七ヶ浜町	212戸	212戸	100.0%	212戸	100.0%	0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	25戸	100.0%	0戸	
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	3戸	100.0%
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	48戸	100.0%	8戸	16.7%
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	945戸	489戸	51.7%	225戸	23.8%	225戸	23.8%
21 南三陸町	770戸	719戸	93.4%	224戸	29.1%	84戸	10.9%
計	15,561戸	12,573戸	80.8%	7,859戸	50.5%	1,794戸	11.5%

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

## ○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ
市町数	9市町	8市町	12市町	10市町	1市
地区数	30地区	33地区	44地区	116地区	5地区
戸数	2,591戸	3,161戸	1,980戸	4,692戸	149戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。
