

平成 29 年度公共事業評価部会の審議結果について

平成 30 年 4 月 12 日
公共事業評価部会

1 審議対象事業及び事業概要

事業種別	事業名	事業実施箇所	事業採択年度	完成予定年度	事業目的・事業概要	全体事業費(億円)	進捗率(%)
道路	地域高規格道路 宮城県北高速幹線道路主要地方道築館登米線Ⅳ期(築館工区)道路改良事業	栗原市	H25	H30	東北縦貫自動車道及び三陸縦貫自動車道とともに、広域交通ネットワークを形成し、沿道の自動車関連産業等の企業立地を支援する道路及び復興支援道路として整備を行うもの。 延長L=1.7km 車道幅員6.5m (全体幅員8.5m)	69.0	74.2

2 審議結果(答申概要)

「事業継続」とした県の評価を「妥当」とした。
なお、事業の実施に関する意見は、次のとおり。

今後の事業の実施に関する意見

事業全般

事業費が増額となる原因の整理、分析を進め、当該データの蓄積を行うとともに、庁内における情報共有を図り、事業費の見積り精度を高めるよう努めること。

3 部会審議の経過

平成 29 年 10 月 31 日 諮問

1 1 月 1 日 第 1 回部会開催(審議)

1 2 月 22 日 第 2 回部会開催(審議及び答申取りまとめ)


平成 30 年 1 月 19 日 答申

宮城県北高速幹線道路位置図

位置図



図

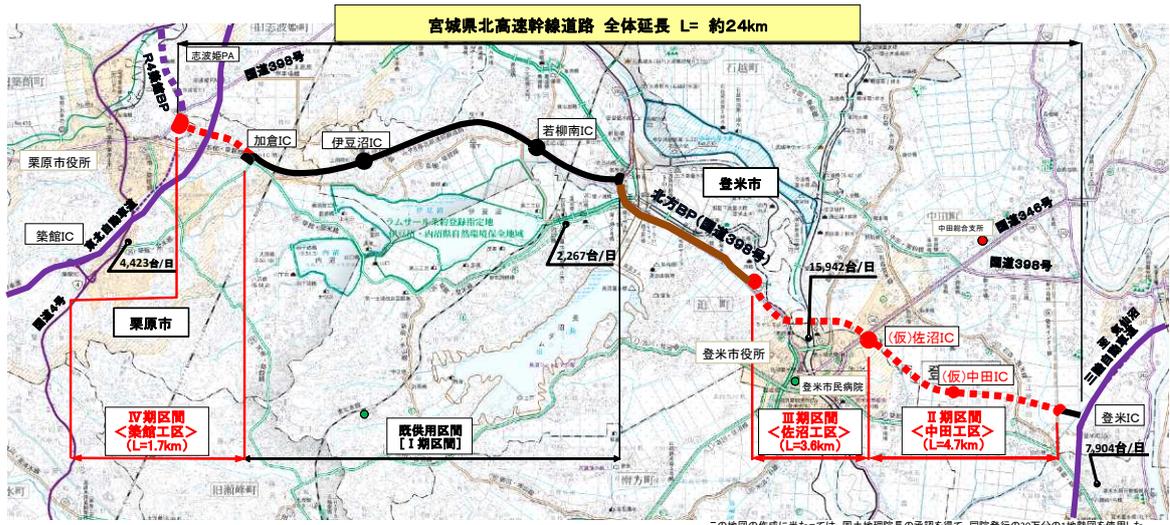

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の20万分の1地勢図を使用した。
(承認番号 平25第 第15号)
