



仙台塩釜港復興だより 第28号

－ 港湾は人の心も結んでいます －

災害復旧事業の進捗状況

仙台塩釜港湾事務所では、現在、東日本大震災で被災した公共土木施設の災害復旧工事を進めており、令和3年2月末時点で185箇所のうち182箇所(約98%)が完成しました。

残りは塩釜港区の港湾施設が2箇所(76箇所のうち74箇所完成)、塩釜港区の海岸保全施設が1箇所(33箇所のうち32箇所完成)の計3箇所となっており、引き続き、残る施設の早期復旧に向け事業進捗を図ってまいります。

◎箇所数ベース(令和3年3月末) (単位:箇所)

施設別	事業箇所数			箇所ベース	
	全体	着手済	うち完了	着手率(%)	完了率(%)
港湾施設	130	130	128	100	98
海岸保全施設	45	45	44	100	98
公園・緑地等	10	10	10	100	100
合計	185	185	182	100	98

◎事業費ベース(令和3年3月末) (単位:億円)

施設別	事業費			金額ベース	
	全体	着手済	うち完了	着手率(%)	完了率(%)
港湾施設	188	0	184	100	98.2
海岸保全施設	162	0	141	100	87.2
公園・緑地等	8	0	8	100	100.0
合計	357	357	333	100	93.3

※事業費は令和2年度災害再調査額含み

○仙台港区及び松島港区

仙台港区(49箇所)は平成29年度末、松島港区(26箇所)は平成30年度末までに全て完成しました。

◎箇所数ベース (箇所)		◎箇所数ベース (箇所)							
	全体	うち完了	完成率(%)		全体	うち完了	完成率(%)		
仙台	港湾施設	37	37	100%	松島	港湾施設	17	17	100%
	海岸保全施設	3	3	100%		海岸保全施設	9	9	100%
	公園・緑地等	9	9	100%		合計	26	26	100%
	合計	49	49	100%					

○塩釜港区

塩釜港区(110箇所)のうち、港湾施設2箇所・海岸保全施設1箇所の計3箇所は令和3年度完成予定で


◎箇所数ベース (箇所)

	全体	うち完了	完成率(%)	
塩釜	港湾施設	76	74	97%
	海岸保全施設	33	32	97%
	公園・緑地等	1	1	100%
	合計	110	107	97%

復興事業（新規防潮堤整備等）の進捗状況

事務所管内では、災害復旧と併せて復興事業の新規防潮堤整備を進めています。また、仙台港区では臨港地区外への貨物流出防止と臨港道路の早期啓開を図ることを目的とした津波漂流物対策施設の整備も併せて進めています。

これまで、全体延長5.1kmのうち3.8kmが完成しており、残る1.3kmについても早期完成に向け事業進捗を図ってまいります。

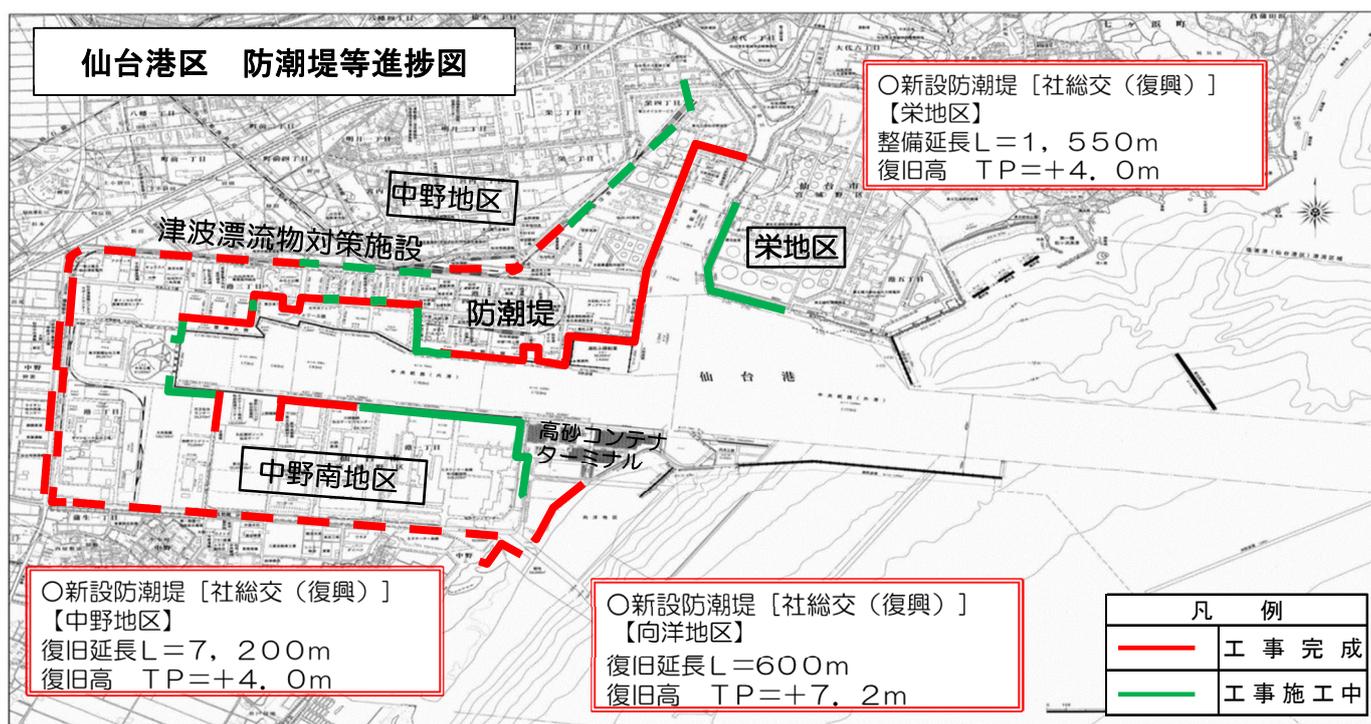

◎延長ベース


		全体延長 (km)	完成延長 (km)	完成率 (%)	残延長 (km)
港区全体	防潮堤(km)	14.4	10.3 (7.4)	72 (51)	4.1
	漂流物対策施設(km)	5.1	3.8 (3.6)	75 (71)	1.3
仙台港区	防潮堤(km)	9.2	5.1 (2.6)	55 (28)	4.1
	漂流物対策施設(km)	5.1	3.8 (3.6)	75 (71)	1.3
塩釜港区	防潮堤(km)	5.1	5.1 (4.7)	100 (92)	—
松島港区	防潮堤(km)	0.1	0.1 (0.1)	100 (100)	—

※()はR2.3末時点


復旧・復興事業の状況

■災害復旧事業


貞山通(A)胸壁外災害復旧工事(その2)
[着手前] [完成]




貞山通(A)胸壁外災害復旧工事(その3)
[着手前] [完成]



石浜護岸外災害復旧工事
[着手前] [完成]



代々崎船たまり(A)防潮堤外災害復旧工事
[着手前] [完成]



■復興事業


海岸通水門外工事
[着手前] [完成]




要害浦地区防潮堤工事
[着手前] [完成]




栄東地区防潮堤工事(その2)
[着手前] [施工中]



栄西地区防潮堤工事
[着手前] [施工中]




ふ頭5号線・中野緑地歩道外整備工事
[着手前] [完成]




仙台港区陸閘被制御局上屋新築工事(その2)
[着手前] [完成]



中野南地区外防潮堤工事(その2)
[着手前] [施工中]



津波漂流物対策設置工事(その6)
[着手前] [施工中]




仙台港区高砂コンテナターミナル拡張事業の進捗状況

令和2年のコンテナ取扱貨物量は、新型コロナウイルスの影響を受けたものの、対前年度比約7%減の27万TEUを維持しました。

一方、コンテナ貨物取扱量の増加に伴うターミナル拡張工事(21→約27ha)は、令和2年4月に新たなトラックゲート(実入り:4→8ゲート)、12月に税関検査場などが入る多目的置場(CFS等)が完成しました。これらに伴いターミナルの機能向上が図られセミトレーラーのゲート待ちによる臨港道路の渋滞緩和効果が現れ始めました。

引き続き、令和3年度末の完了を目指し、空コンゲート(5ゲート)などの整備を進めてまいります。

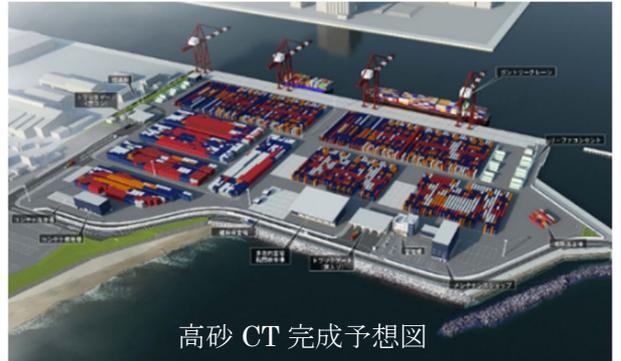


高砂 CT 完成予想図




◎多目的置場 (CFS 等)

R2(速報値): 27万TEU[対前年比93%]

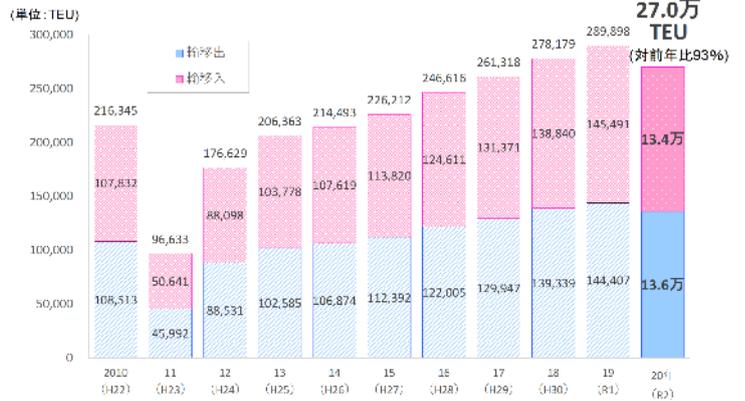

また、向洋地区ふ頭再編改良事業[高砂3号岸壁(-14m×190m)、ふ頭用地造成4ha]については、塩釜・港湾空港整備事務所(国交省)が地盤改良やケーソン据付などを進めております。


令和3年度からは、県事業として背後の埋立工事(4ha)に着手します。

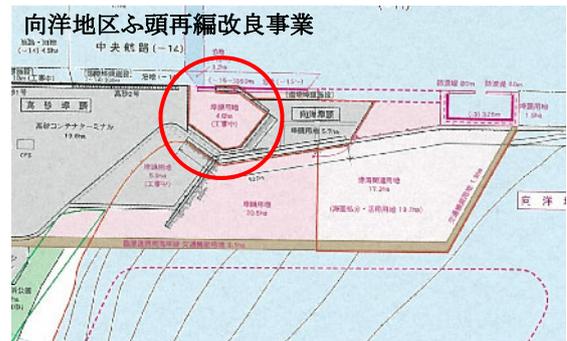

R2.6.23 撮影(GC3号機より)



R3.3.3 撮影(GC3号機より)



中野緑地及びスリーエム仙台港パーク（中央公園）

仙台港周辺の賑わい創出を図るため、「仙台港周辺地域賑わい創出コンソーシアム」による『人に親しまれる街づくり』の検討結果を踏まえ、整備を進めてきた中野緑地やスリーエム仙台港パークの改修工事が完了しました。

【主な施設】キッチンカースペース 5 台分，ロングベンチ 2 基，照明灯 9 基

イメージパース



■ 中野緑地着工前



■ 中野緑地完成



■ 着工前(航空写真)



■ 完成(航空写真)



仙台港開港 50 周年

仙台港は、7月に開港50周年を迎えることになりました。

振り返ると昭和39年の新産業都市「仙台湾地区」指定ののち、昭和42年から『掘込港湾』として建設工事に着手、昭和46年7月に開港に至りました。

仙台港の歩んできた道のりは、東日本大震災による被災など平坦なものではなかったものの、仙台港の礎を築いた方々を始めとする多くの関係者の努力により、東北をけん引する国際拠点港湾仙台塩釜港（仙台港区）として今日まで発展し続けてきました。

今年8月18日（水）には、開港50周年記念イベント『開港祭』を開催するので、是非、仙台港にお越しください。



©宮城県・旭プロダクション



着手当時の仙台港(1969.4)



開港直後の仙台塩釜港(1972)



水門・陸閘自動閉鎖システムの運用開始

仙台塩釜港(塩釜港区)の一部が完成したことから、3月29日(月)に塩釜1エリア(1基)及び2エリア(5基)の計6基についてシステム運用を開始しました。

この運用により、仙台塩釜港湾事務所が管理する水門・陸閘閉鎖システム全52基のうち、陸閘30基が完成しました。引き続き、残る陸閘21基と水門ゲート1基については、早期運用開始に向け整備に取り組んでまいります。

■自動化陸閘システム運用状況

令和3年3月末現在

港区名	地区名	エリア	全体	水門・陸閘別	供用済(基)	未供用(基)
仙台港区	中野	仙台港1	4	陸閘	-	4
		仙台港2	6	陸閘	-	6
		仙台港3	9	陸閘	-	9
		仙台港4	2	陸閘	-	2
塩釜港区	海岸通・港町	塩釜港1	2	陸閘	1	1
		塩釜港2	10	陸閘	5	5
		海岸通水門エリア	1	水門	-	-
	中の島・貞山通	塩釜港3	1	陸閘	1	-
		塩釜港4	5	陸閘	5	-
		塩釜港5	8	陸閘	8	-
	要害浦	七ヶ浜1	4	陸閘	4	-
	東宮・代ヶ崎浜	七ヶ浜2	1	陸閘	1	-
	代ヶ崎浜	七ヶ浜4	1	陸閘	1	-
	花測浜・吉田浜	七ヶ浜5	4	陸閘	4	-
計		7地区 14エリア 52基		6地区 9エリア 30基	2地区 6エリア 22基	



■海岸通・港町地区 N=6基(塩釜市)

■陸閘全体の運用状況

令和3年3月末現在

	自動化(基)	電動(基)	人力(基)	計(基)
供用済	30	41	33	104
工事中	22	32	0	54
全体	52	73	33	158
進捗率	58%	56%	100%	66%

※エリア：制御局1つで受け持つことができる区域

◎自動化陸閘遠隔操作状況



仙台塩釜港湾事務所内



仙台土木事務所(代替事務所)の状況

編集事務局

宮城県仙台塩釜港湾事務所 企画担当チーム

〒983-0001 仙台市宮城野区港三丁目1-3 仙台港国際ビジネスサポートセンター5階

TEL: 022-254-3131 FAX: 022-254-3136

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgkown E-mail: sdsgkown@pref.miyagi.lg.jp
