

仙台土木復旧・復興のあゆみ

Vol.21



平成28年7月20日発行

宮城県仙台土木事務所

◇災害復旧工事の進捗状況（平成28年6月30日現在）

○災害復旧工事の**着手率**は、
道路及び河川関係を合わせて
箇所ベースで約99%、
金額ベースで約86%です。

※着手率：（完了＋工事中）／全体の割合を示す。
※事業箇所数、事業費については、
平成28年6月30日現在で時点修正している。

		完了	工事中	全体	完了率	着手率
道路関係	箇所	357	2	361	99%	99%
	金額(億円)	141.9	16.1	188.5	75%	84%
河川関係	箇所	83	23	109	76%	97%
	金額(億円)	49.6	963.6	1,174.4	4%	86%
全体	箇所	440	25	470	94%	99%
	金額(億円)	191.5	979.7	1,362.9	14%	86%

◇関東・東北豪雨災害関係（一級河川鳴瀬川水系善川他）

■災害復旧助成事業他

平成27年9月9日から11日にかけての台風18号及び豪雨の影響により、管内北部の黒川郡、仙台市泉区を中心に甚大な被害が発生し、県管理施設では95箇所、約48億円の災害査定決定額となりました。

また、善川沿川では、堤防の低い箇所からの越水により、住宅、農地、公共施設等が被災したため、原型に復旧する災害復旧事業のみでは事業効果が限定されることから、一連の区間において築堤等を行う災害復旧助成事業が採択され、現在、復旧に向けて入札公告を行っております。

その他の被災箇所についても2月から工事発注を行っておりますが、東日本大震災による復旧工事が最盛期を向かえるなどの要因もあり、5割を越える入札不調が発生し、予定どおり工事着手が出来ない状況です。今後とも早期の災害復旧に向け、関係機関との調整を行い、着実に進めてまいります。



善川浸水状況




吉田川被災状況

■他県からの応援職員のみなさん

仙台土木事務所では、地方自治法に基づき、今年度も18都県32名の応援をいただいております。

宮城県の早期の復旧・復興に向け一丸となって邁進してまいります。

山形県、新潟県、埼玉県、群馬県、東京都、
神奈川県、石川県、愛知県、三重県、岐阜県、
兵庫県、山口県、愛媛県、香川県、福岡県、
大分県、宮崎県、鹿児島県

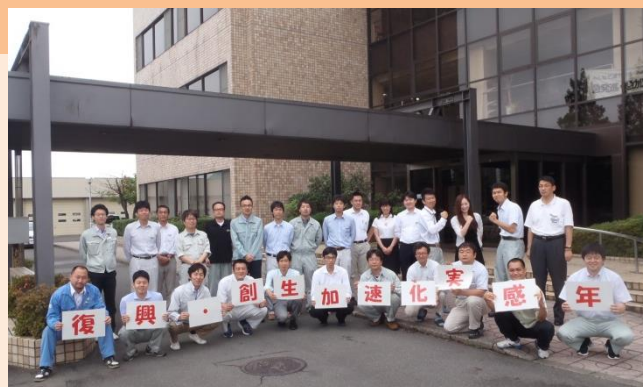


◇道路事業関係（一般県道 大衡仙台線）

■事業紹介 宮床道路改良事業

一般県道大衡仙台線は、仙台北部地域と仙台市中心部を結び、国道4号のバイパスとしての役割を担う重要な道路で、現在宮床工区を進めています。

宮床工区は、仙台側の小野工区に続く国道457号までの延長約2.3kmで、平成24年度に着手しています。本工区の開通による周辺道路の混雑緩和や物流、交流の円滑化による経済活動の活性化が期待されており、平成30年度中の供用を目標に、現在は2箇所で橋梁工事を進めております。

完成イメージ

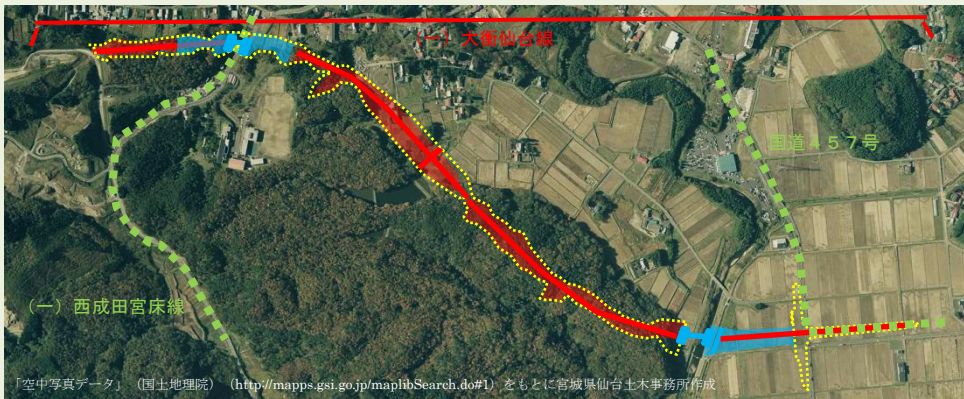

◇復興事業関係

■貞山運河「桜」植樹会～復興・そして未来へ～を開催しました

貞山運河への桜植樹は、東日本大震災からの復興の象徴となるとともに津波防災意識の醸成や未来への震災体験の伝承を目的として、平成24年度から官民連携で取り組んで来ました。

今年は、平成28年3月19日（土）に多賀城市貞山公園を会場として、宮城県議会建設企業委員長、多賀城市議会議長をはじめ、貞山運河への桜植樹にご協力いただいているボランティアの小林製薬株式会社様、株式会社伊藤園様、NPO法人MERRY PROJECT様、公園を利用している子供たちなど、約100名が参加し、ヤマザクラ19本、オオシマザクラ23本の合計42本を無事植樹することができました。



○問い合わせ先

宮城県仙台土木事務所 企画担当チーム

TEL:022-297-4143

E-mail:sddbkc@pref.miyagi.jp

HP :http://www.pref.miyagi.jp/snd-doboku/

