

# 仙台土木復旧・復興のあゆみ

特集：今回も沿岸市町毎の事業進捗状況付き

## Vol.19



平成27年10月15日発行

宮城県仙台土木事務所


### ◇災害復旧工事の進捗状況（平成27年9月30日現在）

○災害復旧工事の着手率は、道路及び河川関係を合わせて箇所ベースで約99%、金額ベースで約81%です。

※着手率：（完了＋工事中）／全体の割合を示す。

※事業箇所数、事業費については、平成27年5月31日現在で時点修正している。

		完了	工事中	全体	完了率	着手率
道路関係	箇所	354	5	361	98%	99%
	金額(億円)	139.6	14.1	171.9	81%	89%
河川関係	箇所	78	28	109	72%	97%
	金額(億円)	34.8	799.5	1040.8	3%	80%
全体	箇所	432	33	470	92%	99%
	金額(億円)	174	814	1,213	14%	81%

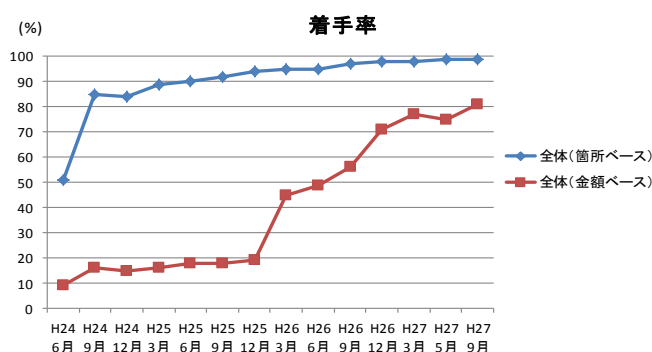

○台風18号による被害は、管内北部の河川を中心に発生し、土木施設は189箇所、約48億円の被害がありました。

(H27.10.8現在)

		道路	河川	砂防	公園	合計
県・市町村	箇所	42	139	2	6	189
	金額(千円)	240,405	4,556,920	1,650	24,800	4,823,775

### ◇復興事業関係（主要地方道相馬亘理線）

■相馬亘理線復興道路事業に係る用地説明会（第1回）を開催しました。


本道路事業は、山元町震災復興計画において、減災を含めた多重防御の一環として福島県境から亘理町境付近までの延長約11.3kmについて、高盛土道路として計画されています。事業の進捗に伴い平成27年9月29日に第1回用地説明会を山元町立坂元中学校にて開催しました。説明会では、事業概要のほか買収面積・買収単価及び土地の譲渡所得に伴う課税の特例等を説明し、今後の用地契約会に向けたスケジュールをご案内したところです。同様の説明会を今後も地域毎に予定しておりますので、関係の皆様におかれましては、事業へのご協力をよろしくお願いいたします。



## ◇道路事業関係（主要地方道岩沼蔵王線）

### ■事業紹介 大師姥ヶ懐道路改良事業

主要地方道岩沼蔵王線は、沿岸部と内陸部の交流促進を担う路線であります。本事業区間の岩沼市志賀字大師～村田町小泉字姥ヶ懐区間は、現道幅員が3.0m程度の峠道であり、車のすれ違いが大変難しく、見通しも悪い道路でありました。そのため、沿岸部の復興を支援する道路としての必要性から、平成24年度に事業着手し、地元のご理解、ご協力を得ながら用地取得を鋭意進めております。現在、42筆の内39筆の取得が完了しており、残る共有地3筆（関係者144名）のご協力をいただき、今年度中にトンネル部分の工事着手を予定しております。（工事施工は大河原土木事務所が行う。）

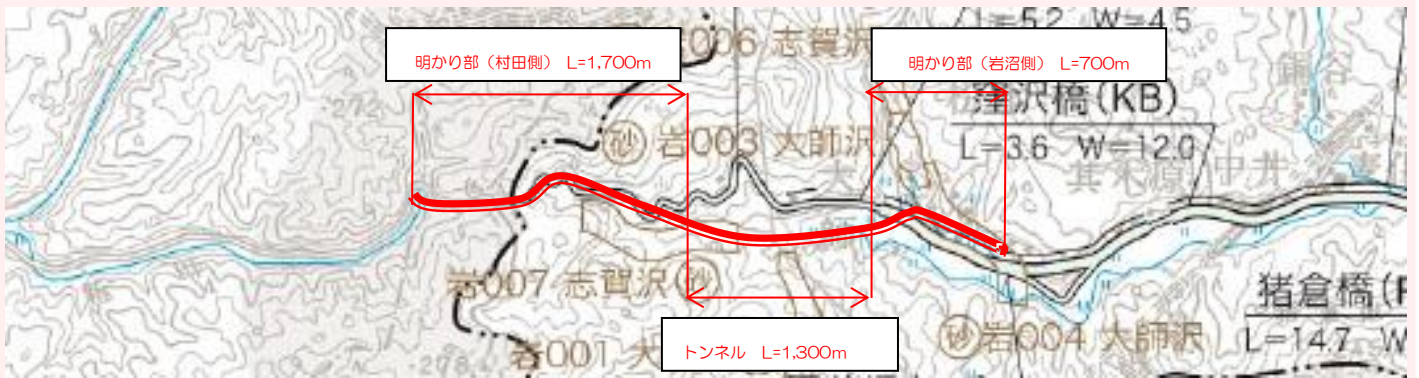

道路規格 第3種第2級 W=6.5 (8.0m)

### ■他県からの応援職員のみなさん

離任(涙)

～7月末



宮居さん【愛媛】

中野さん【愛媛】

～9月末



山口さん【鹿児島】

西原さん【兵庫】

平林さん【兵庫】

豊田さん【岐阜】

着任


8月～



菊地さん【愛媛】

片桐さん【愛媛】

10月～



玉川さん【兵庫】

福崎さん【兵庫】

林さん【岐阜】

尾崎さん【鹿児島】



米山さん【新潟】

復旧・復興のため応援をいただいていた愛媛県の2名が7月末に、岐阜県1名、兵庫県2名及び鹿児島県1名の4名が9月末に任期を終えられ仙台を後にしました。ご尽力をいただき本当にありがとうございました。

8月、10月からは新たに派遣いただいた新潟県の1名も加えて7名が応援に駆けつけてくれました。よろしく申し上げます。

○問い合わせ先

宮城県仙台土木事務所 企画担当チーム

TEL:022-297-4143

E-mail:sddb@pref.miyagi.jp

HP :http://www.pref.miyagi.jp/snd-doboku/

