

気仙沼大島大橋
舗装工事了！

1 災害復旧事業の進捗状況

- 災害復旧事業の着手率は、平成30年12月末現在で箇所数ベースで約99%、事業費ベースで約88%となっています。
- 道路・橋梁施設については、全箇所の約99%に着手し、約83%が完了しています。
- 河川・海岸施設については、全箇所に着手し、約32%が完了しています。
- 港湾施設については、全箇所に着手し、約55%が完了しています。
- 今後も、地権者を始めとします関係者の皆様の御協力を頂きながら、早期完了に向けて、復旧事業の着実な進捗を図ってまいります。

◎箇所数ベース

(単位：箇所)

	全体	事業中		着手率	完了率
			うち完了		
道路・橋梁	123	122	102	99.2%	82.9%
河川・海岸	53	53	17	100.0%	32.1%
港湾	11	11	6	100.0%	54.5%
合計	187	186	125	99.5%	66.8%

※事業中箇所には、応急工事、調査設計、用地補償を含む

◎事業費ベース

(単位：億円)

	全体	事業中		着手率
			うち完了	
道路・橋梁	133.7	102.7	12.6	76.8%
河川・海岸	2,015.9	1,778.3	133.5	88.2%
港湾	92.1	90.6	20.9	98.4%
合計	2,241.7	1,971.6	167.0	88.0%


※事業中箇所には、応急工事、調査設計、用地補償を含む

※事業費は、現時点での事業費としている

2 一般県道清水浜志津川港線「志津川復興道路」が完成しました

一般県道清水浜志津川港線「志津川復興道路」は、東日本大震災で甚大な被害を受けた南三陸町志津川地区の被災市街地復興土地区画整理事業と一体的に整備を行っている事業延長0.8kmの復興道路です。

このたび、平成30年10月31日に工事が完了しました。これにより、安全で円滑な交通確保が図られるとともに、志津川地区の復興を加速させ、水産業や観光振興に大きく寄与することが期待されます。

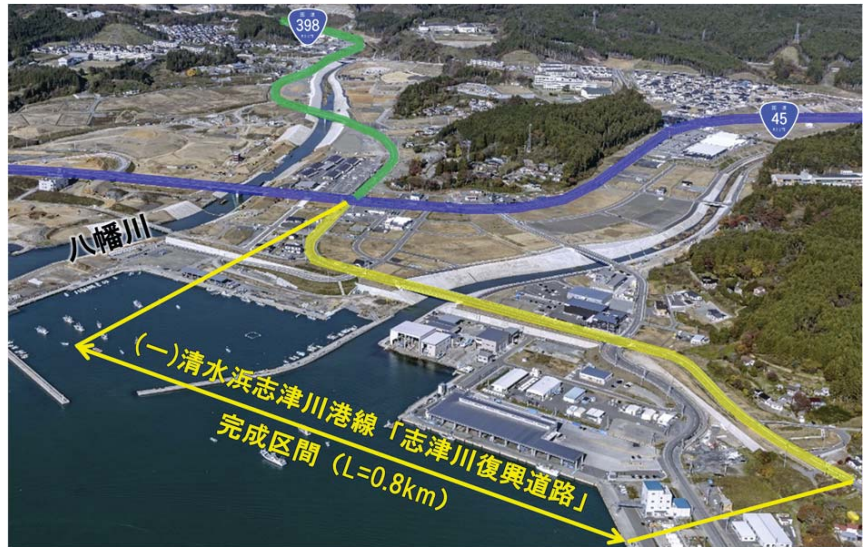

3 気仙沼港海岸護岸災害復旧事業(小々汐地区・梶ヶ浦地区)が完成しました

気仙沼港海岸護岸災害復旧事業について、小々汐地区は平成27年10月に、梶ヶ浦地区は平成26年7月にそれぞれ護岸工事に着工し、平成30年12月26日に最後に残った陸閘工事が完成しました。小々汐地区、梶ヶ浦地区とも東日本大震災により沈下した護岸の機能回復を図りました。

小々汐地区

梶ヶ浦地区

着手前



完成



着手前



完成





4 工事が進む災害復旧箇所の状況

[気仙沼市内の主な工事状況]

青野沢川 (気仙沼市唐桑町釜石地内)

一部区間完成
国道周辺を整備中



只越橋と只越川 (気仙沼市唐桑町只越地内)

河川堤防と旧県道部を整備中



浪板橋と鹿折川 (気仙沼市東みなと町地内)

浪板橋完成
河川堤防を整備中



大川 (気仙沼市川口二丁目地内)

河川堤防を整備中



神山川 (気仙沼市神山地内)

河川堤防と神山橋を整備中



片浜地区海岸 (気仙沼市片浜地先)

海岸防潮堤天端を整備中



面瀬橋と面瀬川 (気仙沼市松崎片浜地内)

河川堤防と道路を整備中



亀山磯草地先海岸 (気仙沼市亀山地先外)

亀山の海岸防潮堤を整備中



高井浜大向地先海岸 (気仙沼市高井地先)

高井の海岸防潮堤を整備中



千岩田地区海岸 (気仙沼市岩月千岩田地先)

海岸防潮堤、樋門周辺を整備中



最知地区海岸 (気仙沼市最知森合地先)

平成30年12月14日完成



沖ノ田川 (気仙沼市本吉町野ノ下地内)

河川堤防を整備中



大谷地区海岸 (気仙沼市本吉町三島地先)

海岸防潮堤を整備中



中島地区海岸 (気仙沼市本吉町中島地内)

海岸防潮堤が完成



津谷川 (気仙沼市本吉町中島地内)

河川堤防を整備中





4 工事が進む災害復旧箇所の状況

[南三陸町内の主な工事状況]

港川 (南三陸町歌津字港地内)

下流側の護岸工が完成
国道周辺を整備中



長須賀地区海岸 (南三陸町歌津字大沼地先)

海岸防潮堤を整備中



荒砥地区海岸 (南三陸町志津川字蒲の沢地内)

海岸防潮堤を整備中



伊里前川 (南三陸町歌津字伊里前地内)

河川堤防を整備中



桜川 (南三陸町志津川字松井田地内外)

河川堤防・道路を整備中



水尻川 (南三陸町志津川字大久保地内)

河川堤防を整備中



新井田川 (南三陸町志津川字本浜町地内)

河川堤防を整備中



八幡川 (南三陸町志津川字汐見町地内)

河川堤防を整備中



志津川復興道路 (南三陸町志津川字汐見町地内)

国道を切り替えながら整備中



塩入復興道路 (南三陸町志津川字塩入地内)

県道を整備中(国道側は完成)



折立川 (南三陸町志津川地内)

河川堤防・国道迂回路を整備中



戸倉地区海岸 (南三陸町戸倉字小涼地先)

海岸防潮堤を整備中



水戸辺川 (南三陸町志津川地内)

河川堤防を整備中



長清水川 (南三陸町戸倉字長清水地内)

河川堤防を整備中




東日本大震災からの復旧工事は、現在61箇所を進めております。河川や海岸では、36箇所盛土へのコンクリート被覆などを進めており、道路は、20箇所橋梁や舗装等を行っております。また、港湾では気仙沼港の岸壁や海岸護岸など5箇所工事を進めております。

5 大島架橋事業（磯草地区）の状況

大島架橋事業における磯草道路改良工事は、気仙沼大島大橋から大島島内の一般県道大島線へ接続する延長約700mの工事です。平成30年7月に函渠の設置が完了し、現在は土工工事を行っております。土工が完了した後、舗装工事を行う予定です。

また、平成30年12月には、磯草道路改良工事（その2）に着手しました。本工事では、延長約770mの土工や地盤改良等を行い、一日も早い事業完了を目指し進めてまいります。

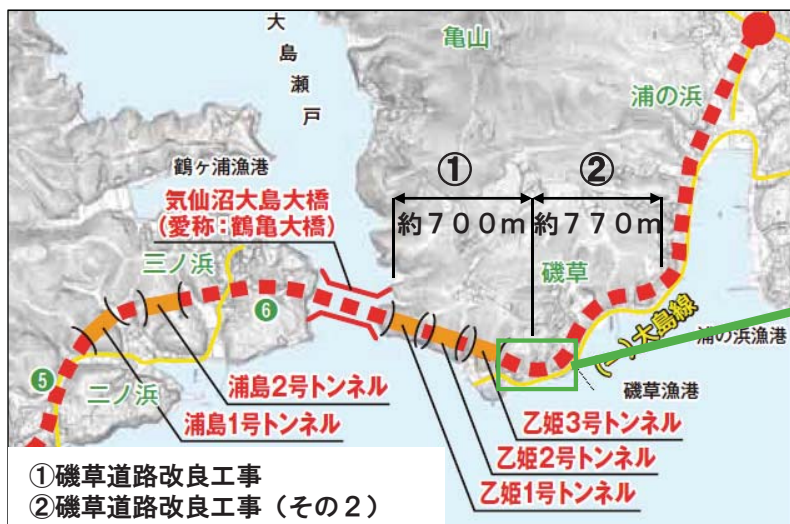

6 浪板橋災害復旧事業が完成しました

主要地方道気仙沼唐桑線の鹿折地区において、これまで通行を切り替えながら、浪板橋の復旧工事を進めてまいりました。平成30年9月、浪板橋の完成に伴い、再び通行の切り替えを実施し、10月中旬から仮設橋の撤去工事を行いました。このたび、仮設橋の撤去工事完了をもって、12月12日に浪板橋災害復旧事業が完了しました。

鹿折地区におきましては、鹿折川河川災害復旧工事や大島架橋事業などを引き続き進めてまいりますので、今後ともご協力をいただきますようお願いいたします。



7 一般県道志津川登米線「塩入復興道路」が一部開通しました

一般県道志津川登米線「塩入復興道路」は、被災市街地復興土地区画整理事業で整備される志津川地区と、保呂毛・田尻畑地区を接続する事業延長1.3kmの復興道路です。

このたび、平成30年12月26日に一部区間(L=0.5km)が開通しました。これにより、安全で円滑な交通確保が図られるとともに、保呂毛地区、田尻畑地区へのアクセスの向上が期待されます。



※お気付きの点やご意見などがありましたら、何なりとご連絡下さい。
※今後とも、皆様のご協力をよろしく申し上げます。

宮城県気仙沼土木事務所 企画担当チーム

〒988-0181

宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

TEL: 0226-22-2622

Mail: ksdbk@pref.miyagi.lg.jp

ホームページ: <http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/>
