

# 気仙沼土木復旧・復興だより

## 第31号

令和4年6月1日発行  
宮城県気仙沼土木事務所  
(令和4年3月末現在)



### 1 災害復旧事業の進捗状況

- 災害復旧事業の道路・橋梁施設、港湾施設については、**全て完了**しました。
- 河川・海岸施設については、**約93%が完了**しています。
- 今後も、地権者の皆様を始めとした関係者の皆様の御協力を頂きながら、復旧事業の全箇所の完成に向けて着実な進捗を図ってまいります。


◎箇所数ベース				(単位:箇所)	◎事業費ベース				(単位:億円)	
	全体	事業中	うち完了	完了率		全体	契約額	うち完了	契約率	完了率
道路・橋梁	123	123	123	100.0%	道路・橋梁	129.6	129.6	129.6	100.0%	100.0%
河川・海岸	53	53	49	92.5%	河川・海岸	2,274.7	2,197.9	2,104.0	96.6%	92.5%
港湾	11	11	11	100.0%	港湾	90.2	90.2	90.2	100.0%	100.0%
合計	187	187	183	97.9%	合計	2,494.5	2,417.7	2,323.8	96.9%	93.2%

※事業費は、現時点での事業費としている

(令和4年3月末現在)

### 2 鹿折道路災害復旧工事が完了しました。

鹿折川の浪板橋付近に位置する鹿折道路災害復旧工事は、県道気仙沼唐桑線L=340mと県道大島浪板線L=395mの合計L=735mを復旧してまいりました。令和元年に工事を開始し、市道の付け替え工事を含めて令和4年3月に完成しました。

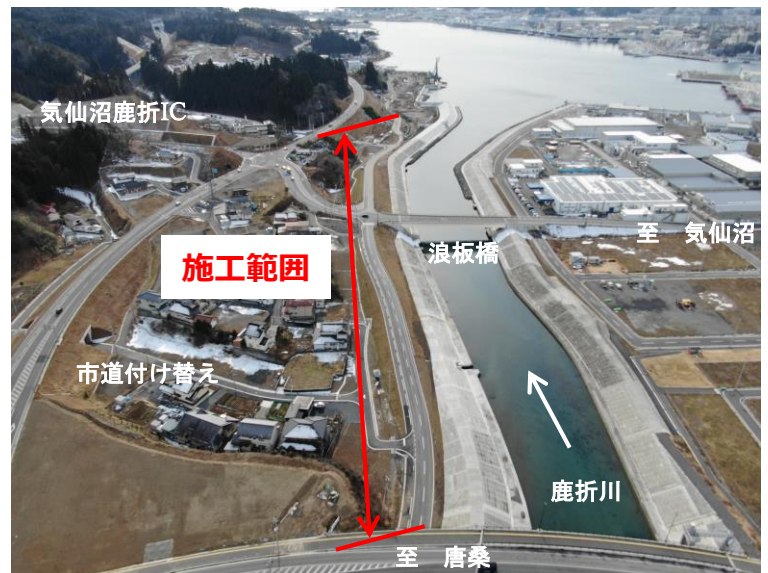

### 3 伊里前川の河川災害復旧工事が完了しました。

南三陸町歌津に位置する伊里前川復旧事業は、延長L=1,173m、下流側の計画高TP+8.7m、上流側の計画高TP+6.9mとして堤防の整備を行ってまいりました。平成27年に工事が始まり、国道45号復旧事業・町道寄木線事業をはじめ、地元・関係機関との協議を重ねながら工事を進め、令和4年1月に完成しました。



## 4 折立川の河川災害復旧事業が完了しました。

南三陸町戸倉地内に位置する折立川復旧事業は、延長L=1,062m、下流側の計画高TP+8.7m、上流側の計画高TP+7.3mとして堤防の整備を行ってまいりました。平成26年に工事が始まり、国道45号復旧事業をはじめ、地元・関係機関との協議を重ねながら工事を進め、令和4年3月に完成しました。



## 5 津谷川の河川災害復旧事業が完了しました。

気仙沼市本吉町に位置する津谷川復旧事業は、隣接する外尾川復旧事業と併せ、延長L=3,472m（津谷川L=2,419m、外尾川L=1,053m）、下流側の計画高TP+14.7m、上流側の計画高TP+10.7~TP+7.84mとして堤防の整備を行ってまいりました。平成26年に工事が始まり、国道45号復旧事業・三陸道沿岸道路事業・BRT事業をはじめ、地元・関係機関との協議を重ねながら工事を進め、令和4年3月に完成しました。



## 6 気仙沼市・南三陸町の災害復旧箇所状況

大川（気仙沼市川口二丁目地内）

防潮堤を整備中



港川（南三陸町歌津字港地内）

国道45号の仮設橋梁を撤去中



管内の復旧事業は残すところ4箇所、復興事業は1箇所となりました。全箇所の完成に向けて、引き続き工事を進めてまいりますので、地域の皆様には、今後とも御協力いただきますようお願いいたします。



※お気付きの点やご意見などがありましたら、何なりとご連絡下さい。  
※今後とも、皆様のご協力をよろしく申し上げます。

宮城県気仙沼土木事務所 企画担当チーム  
〒988-0181  
宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6  
TEL: 0226-22-2622  
Mail: ksdbk@pref.miyagi.lg.jp

ホームページ: <http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/>
