

# 東日本大震災からの復旧・復興事業の進捗状況

(平成27年11月末現在)


公共土木施設の災害復旧事業の進捗状況及び土木部最重点項目の「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」を推進するための津波対策，復興まちづくり事業，災害公営住宅の整備について，平成27年11月末現在の状況を以下のとおり取りまとめた。

## 1 公共土木施設の災害復旧事業（県事業）

- 公共土木施設全体 2,314箇所のうち，**2,237箇所**（全体の約97%）に着手しており，そのうち**1,968箇所**（全体の約85%）が完成している。なお，金額ベースでは，全体事業費6,492億円に対して，着手率が約81%，完成率が約18%となっている。

<内陸・沿岸部別>

- 内陸部では，808箇所の**全てにおいて着手**しており，そのうち**806箇所**（全体の約99%）が完成している。
- 沿岸部では，1,506箇所のうち，**1,429箇所**（全体の約95%）に着手しており，そのうち**1,162箇所**（全体の約77%）が完成している。

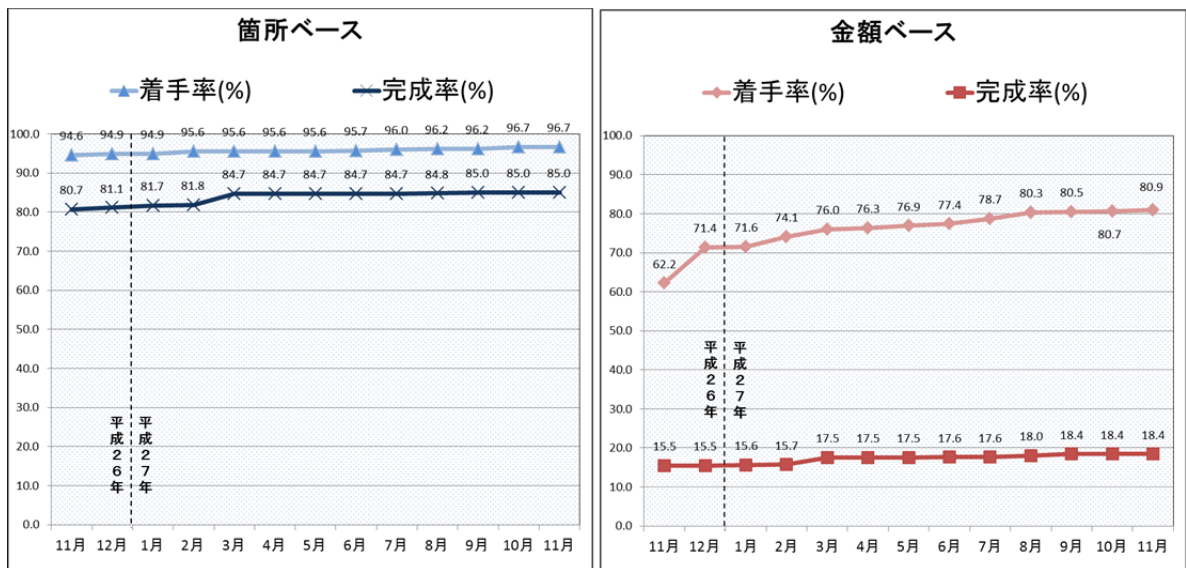

公共土木施設の災害復旧工事全体（県事業）の着手率・完成率（%）の推移

### 現場の状況（写真）



菖蒲田地区海岸 災害復旧工事状況  
(七ヶ浜町)



新北上大橋 災害復旧工事状況  
(石巻市)

## 2 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築

### (1) 津波対策※

#### <河川施設>

- 全体42箇所のうち、41箇所（全体の約98%）について、本格工事に着手している。

#### <海岸（建設・港湾）施設>

- 全体99地区海岸のうち、82地区（全体の約83%）について、本格工事に着手している。  
（※津波対策の対象施設は、災害復旧事業により実施する海岸や河川堤防のほか、復興事業により新設する堤防も含む）

### (2) 復興まちづくり事業

#### <防災集団移転促進事業>

- 12市町195地区で計画されており、**全地区で造成工事等に着手\***している。

（※造成工事着手等とは、工事請負契約の締結が完了した状態のことを示す）

- 住宅等建築工事可能※地区数は、気仙沼市や石巻市などにおいて9地区増加し、県全体で12市町**137地区**（全体の約70%）となった。（※住宅等建築工事可能とは、造成工事が完了する等、建築工事の準備が整った状態のことを示す）



竹浦地区  
（女川町）

#### <土地区画整理事業>

- 11市町34地区で計画されており、事業認可地区は、県全体で11市町**32地区**（全体の約94%）となっている。
- 工事着工地区数は、県全体で11市町**30地区**（全体の約88%）となっている。



南気仙沼地区  
（気仙沼市）

#### <津波復興拠点整備事業>

- 8市町12地区で計画されており、事業認可地区数は、県全体で8市町**11地区**（全体の92%）となっている。
- 工事着工地区数は、県全体で7市町**10地区**（全体の約83%）となっている。

### (3) 災害公営住宅の整備事業

- 現時点の整備計画戸数15,924戸のうち、21市町243地区、**12,224戸**の工事に着手している。
- 工事完了戸数は、21市町169地区、**7,784戸**となっている。



寒風沢地区（塩竈市）



東矢本駅北地区（東松島市）

# 公共土木施設の復旧工事の進捗状況

(公共土木施設災害復旧事業：県事業)

【平成27年11月末現在】

○「次世代に豊かさを引き継ぐことのできる持続可能なみやぎの県土づくり」の理念のもと、県民の命と生活を守り、震災を乗り越え、更なる発展につなげる県土づくりを目指して取り組んでいます。

項目 (最大被害等)	(着手・完成) / (復旧箇所・復旧費)	進捗率	項目 (最大被害等)	(着手・完成) / (復旧箇所・復旧費)	進捗率
<b>道路・橋梁施設 (復旧工事)</b> 復旧事業の概要 期間 H23～29年度 復旧費 約773億円	被災箇所数: 道路 1,415箇所 橋梁 123箇所	箇所ベース 着手率 約99% 完成率 約95% 金額ベース 着手率 約78% 完成率 約49%	<b>下水道施設 (復旧工事)</b> 復旧事業の概要 期間 H23～25年度 復旧費 約396億円	被災箇所数: 121箇所	箇所ベース 着手率 100% 完成率 100% 金額ベース 着手率 100% 完成率 100%
<b>河川施設 (復旧工事)</b> 復旧事業の概要 期間 H23～29年度 復旧費 約3,416億円	被災箇所数: 274箇所	箇所ベース 着手率 約98% 完成率 約80% 金額ベース 着手率 約76% 完成率 約2%	<b>港湾施設 (復旧工事)</b> 復旧事業の概要 期間 H23～29年度 復旧費 約884億円	被災箇所数: 292箇所	箇所ベース 着手率 約84% 完成率 約47% 金額ベース 着手率 約81% 完成率 約31%
<b>海岸保全施設 (復旧工事)</b> 復旧事業の概要 期間 H23～29年度 復旧費 約999億円	被災箇所数: 74施設	箇所ベース 着手率 約95% 完成率 約18% 金額ベース 着手率 約92% 完成率 約7%	<b>公共土木施設 (道路橋梁、河川、海岸、砂防、下水道、港湾、公園)</b> 復旧事業の概要 期間 H23～29年度 復旧費 約6,492億円	被災箇所数: 2,314箇所	箇所ベース 着手率 約97% 完成率 約85% 金額ベース 着手率 約81% 完成率 約18%
<b>砂防・地滑・急傾斜施設 (復旧工事)</b> 復旧事業の概要 期間 H23～24年度 復旧費 約8億円	被災箇所数: 8施設	箇所ベース 着手率 100% 完成率 100% 金額ベース 着手率 100% 完成率 100%	<b>沿岸部</b> 箇所ベース 着手率 約95% 金額ベース 約80%	<b>内陸部</b> 箇所ベース 着手率 100% 金額ベース 約99%	凡例 着手 (浅緑) 完成 (深緑)

(空白)



# 土木部最重点項目

# 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築の推進

平成27年11月末現在

市町名	津波対策※1				復興まちづくり事業				災害公営住宅の整備			
	土木部所管 河川		土木部所管 海岸(建設・港湾)		防災集団移転促進事業		土地区画整理事業		災害公営住宅		災害公営住宅	
	箇所数	上段：済・率 (応急工事を含む工事着手)	下段：済・率 (本格工事着手)	箇所数	上段：済・率 (応急工事を含む工事着手)	下段：済・率 (本格工事着手)	計画地区数	上段：済・率 (事業認可)	下段：済・率 (工事着工)	計画戸数	上段：済・率 (事業着手)	下段：済・率 (建築工事着手)
気仙沼市	7	7 100.0%	7 100.0%	24	21 87.5%	21 87.5%	3	3 100.0%	3 100.0%	2,139	2,139 100.0%	1,321 61.8%
南三陸町	10	10 100.0%	10 100.0%	7	7 100.0%	7 100.0%	1	1 100.0%	1 100.0%	738	738 100.0%	522 70.7%
石巻市	8	8 100.0%	7 87.5%	28	24 85.7%	24 85.7%	14	14 100.0%	12 85.7%	4,500	3,437 76.4%	3,388 75.3%
女川町	1	1 100.0%	1 100.0%	7	7 100.0%	7 100.0%	1※2	1 100.0%	1 100.0%	864	655 75.8%	305 35.3%
東松島市	4	4 100.0%	4 100.0%	8	8 100.0%	7 87.5%	5	3 60.0%	3 60.0%	1,010	831 82.3%	831 82.3%
松島町	1	1 100.0%	1 100.0%	2	2 100.0%	2 100.0%				52	52 100.0%	52 100.0%
利根町										25	25 100.0%	25 100.0%
塩竈市				12	8 66.7%	7 58.3%	2	2 100.0%	2 100.0%	420	420 100.0%	390 92.9%
七ヶ浜町				8	7 87.5%	5 62.5%	4	4 100.0%	4 100.0%	212	212 100.0%	212 100.0%
多賀城市	1	1 100.0%	1 100.0%				1	1 100.0%	1 100.0%	532	532 100.0%	482 90.6%
仙台市	2	2 100.0%	2 100.0%	3	2 66.7%	2 66.7%	1	1 100.0%	1 100.0%	3,179	3,179 100.0%	3,179 100.0%
名取市	3	3 100.0%	3 100.0%				1	1 100.0%	1 100.0%	716	409 57.1%	92 12.8%
岩手市	3	3 100.0%	3 100.0%				1	1 100.0%	1 100.0%	210	210 100.0%	210 100.0%
重理町										477	477 100.0%	477 100.0%
山元町	2	2 100.0%	2 100.0%							490	490 100.0%	402 82.0%
その他6市町										360	360 100.0%	336 93.3%
<b>合計</b>	<b>42</b>	<b>42 100.0%</b>	<b>41 97.6%</b>	<b>99</b>	<b>86 86.9%</b>	<b>82 82.8%</b>	<b>34</b>	<b>32 94.1%</b>	<b>30 88.2%</b>	<b>15,924</b>	<b>14,166 89.0%</b>	<b>12,224 76.8%</b>

※1：復興事業による新設工事を含む  
 ※2：釜米市、栗原市、大崎市、大郷町、涌谷町、美里町  
 ※3：津波復興拠点整備事業は、8市町12地区が計画され、11地区が事業認可済みとなっており、うち10地区が工事着手となっており、うち10地区が事業認可済みとなっている。完成戸数7,784戸(83.9%)  
 ※4：クラフ中の■は先月に済ませる増加分を示す

(空白)

# 災害公営住宅の整備状況について

(平成27年11月30日現在)

- 災害公営住宅については、平成27年11月末時点で21市町、259地区、14,166戸(前月末比+13戸)において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、21市町、243地区、12,224戸(前月末比+41戸)について着工し、21市町、169地区、7,784戸(前月末比+108戸)については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

## ○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		うち、工事着手戸数		うち、工事完了戸数	
			進捗率		進捗率		進捗率
01 仙台市	3,179戸	3,179戸	100.0%	3,179戸	100.0%	<u>2,760戸</u>	<u>86.8%</u>
02 石巻市	4,500戸	<u>3,437戸</u>	<u>76.4%</u>	3,388戸	75.3%	<u>1,667戸</u>	<u>37.0%</u>
03 塩竈市	420戸	420戸	100.0%	<u>390戸</u>	<u>92.9%</u>	<u>110戸</u>	<u>26.2%</u>
04 気仙沼市	2,139戸	2,139戸	100.0%	1,321戸	61.8%	438戸	20.5%
05 名取市	716戸	409戸	57.1%	92戸	12.8%	92戸	12.8%
06 多賀城市	532戸	532戸	100.0%	482戸	90.6%	208戸	39.1%
07 岩沼市	210戸	210戸	100.0%	210戸	100.0%	210戸	100.0%
08 登米市	84戸	84戸	100.0%	60戸	71.4%	60戸	71.4%
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	831戸	82.3%	831戸	82.3%	<u>574戸</u>	<u>56.8%</u>
11 大崎市	170戸	170戸	100.0%	170戸	100.0%	170戸	100.0%
12 亘理町	477戸	477戸	100.0%	477戸	100.0%	477戸	100.0%
13 山元町	490戸	490戸	100.0%	<u>402戸</u>	<u>82.0%</u>	363戸	74.1%
14 松島町	52戸	52戸	100.0%	52戸	100.0%	52戸	100.0%
15 七ヶ浜町	212戸	212戸	100.0%	212戸	100.0%	138戸	65.1%
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	25戸	100.0%	25戸	100.0%
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	3戸	100.0%
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	48戸	100.0%	48戸	100.0%
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	<u>864戸</u>	<u>655戸</u>	<u>75.8%</u>	<u>305戸</u>	<u>35.3%</u>	230戸	<u>26.6%</u>
21 南三陸町	738戸	738戸	100.0%	522戸	70.7%	104戸	14.1%
計	<u>15,924戸</u>	<u>14,166戸</u>	<u>89.0%</u>	<u>12,224戸</u>	<u>76.8%</u>	<u>7,784戸</u>	<u>48.9%</u>

※計画戸数は各市町の供給計画の見直しにより変更になることがあります。

※前月末から変更になった戸数等には下線が引いてあります。

## ○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ
市町数	9市町	8市町	15市町	10市町	1市
地区数	27地区	40地区	58地区	<u>141地区</u>	5地区
戸数	2,258戸	3,757戸	2,611戸	<u>5,391戸</u>	149戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。
