

東日本大震災からの復旧・復興事業の進捗状況

(平成29年4月末現在)


公共土木施設の災害復旧事業の進捗状況及び土木部最重点項目の「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」を推進するための津波対策，復興まちづくり事業，災害公営住宅の整備について，平成29年4月末現在の状況を以下のとおり取りまとめた。

1 公共土木施設の災害復旧事業（県事業）

- 公共土木施設全体 2,303箇所のうち，**2,285箇所**（全体の約99%）に着手しており，そのうち**2,015箇所**（全体の約88%）が完成している。金額ベースでは，全体事業費7,279億円に対して，完成率が約20%となっている。
- なお，現時点における金額ベースの完成見通しは，平成29年度末約7割，平成30年度末約9割を予定している（※現時点の予定であり，今後変更する場合もある）。

<内陸・沿岸部別>

- 内陸部では，808箇所**全てにおいて着手**しており，そのうち**807箇所**（全体の約99%）が完成している。
- 沿岸部では，1,495箇所のうち，**1,477箇所**（全体の約99%）に着手しており，そのうち**1,208箇所**（全体の約81%）が完成している。

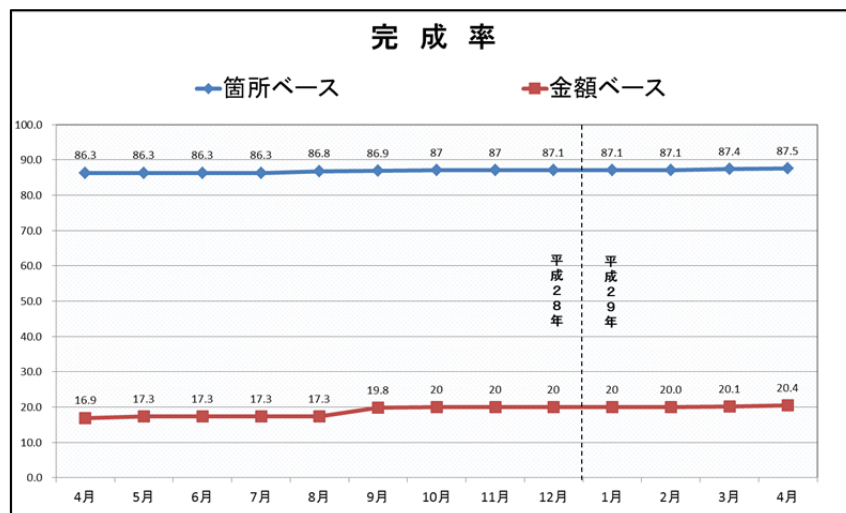


公共土木施設の災害復旧工事全体（県事業）の完成率（%）の推移

現場の状況（写真）



新北上大橋
(石巻市)

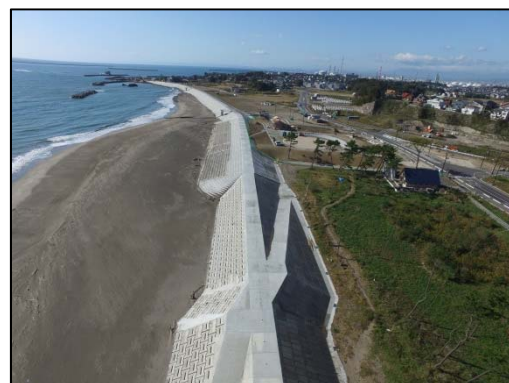

葛蒲田地区海岸
(七ヶ浜町)

2 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築

(1) 津波対策※

<河川施設>

- 全体42箇所**全てにおいて本格工事に着手**している。

<海岸（建設・港湾）施設>

- 全体99地区海岸のうち、92地区（全体の約93%）において、本格工事に着手している。
（※津波対策の対象施設は、災害復旧事業により実施する海岸や河川堤防のほか、復興事業により新設する堤防も含む）

(2) 復興まちづくり事業

<防災集団移転促進事業>

- 12市町195地区で計画されており、**全地区で造成工事等に着手***している。

（※造成工事着手等とは、工事請負契約の締結が完了した状態のことを示す）

- 住宅等建築工事可能※地区数は、女川町において1地区増加し、県全体で12市町**189地区**（全体の約97%）となっている。（※住宅等建築工事可能とは、造成工事が完了する等、建築工事の準備が整った状態のことを示す）

<土地区画整理事業>

- 11市町34地区で計画されており、**全地区で事業認可**となっており、工事着工地区数は、県全体で11市町**33地区**（全体の約97%）となっている。
- 住宅等建築工事可能（使用収益開始）地区数は、10市町**24地区**（全体の約71%）となっており、**4地区**で換地処分が完了している。

<津波復興拠点整備事業>

- 8市町12地区で計画されており、**全地区で事業認可・工事着工**となっている。
- 住宅等建築工事可能（供用開始）地区数は、8市町**11地区**（全体の約92%）となっており、事業完了地区数は県全体で**3地区**となっている。

(3) 災害公営住宅の整備事業

- 現時点の整備計画戸数16,149戸のうち、
- 21市町304地区、15,250戸の工事に着手している。
- 工事完了戸数は、21市町281地区、13,867戸となっている。



宮ヶ崎地区
(女川町)



鹿折地区
(気仙沼市)



小屋取地区
(女川町)



南町二丁目地区
(気仙沼市)

公共土木施設の復旧工事の進捗状況

(公共土木施設災害復旧事業：県事業)

【平成29年4月末現在】

○「次世代に豊かさを引き継ぐことのできる持続可能なみやぎの県土づくり」の理念のもと、県民の命と生活を守り、震災を乗り越え、更なる発展につなげる県土づくりを目指して取り組んでいます。

| 項目 (最大被害等) | (着手・完成) / (復旧箇所・復旧費) | 進捗率 | 項目 (最大被害等) | (着手・完成) / (復旧箇所・復旧費) | 進捗率 |
|---|----------------------------------|--|---|--|--|
| 道路・橋梁施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～32年度 復旧費 約862億円 | 被災箇所数: 道路 1,411箇所 橋梁 123箇所 | 箇所ベース 着手率 約99% 完成率 約96% 金額ベース 着手率 約99% 完成率 約48% | 下水道施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～25年度 復旧費 約351億円 | 被災箇所数: 121箇所 | 箇所ベース 着手率 100% 完成率 100% 金額ベース 着手率 100% 完成率 100% |
| 河川施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～32年度 復旧費 約3,822億円 | 被災箇所数: 273箇所 | 箇所ベース 着手率 約99% 完成率 約83% 金額ベース 着手率 約99% 完成率 約6% | 港湾施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～30年度 復旧費 約1,035億円 | 被災箇所数: 287箇所 | 箇所ベース 着手率 約96% 完成率 約55% 金額ベース 着手率 約98% 完成率 約32% |
| 海岸保全施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～30年度 復旧費 約1,184億円 | 被災箇所数: 73施設 | 箇所ベース 着手率 約99% 完成率 約33% 金額ベース 着手率 約99% 完成率 約11% | 公共土木施設 (道路橋梁、河川、海岸、砂防、下水道、港湾、公園) 復旧事業の概要 期間 H23～32年度 復旧費 約7,279億円 | 被災箇所数: 2,303箇所 | 箇所ベース 着手率 約99% 完成率 約88% 金額ベース 着手率 約99% 完成率 約20% |
| 砂防・地滑・急傾斜施設 (復旧工事) 復旧事業の概要 期間 H23～24年度 復旧費 約8億円 | 被災箇所数: 8施設 | 箇所ベース 着手率 100% 完成率 100% 金額ベース 着手率 100% 完成率 100% | 沿岸部 箇所ベース 着手率 約99% 金額ベース 約99% 箇所ベース 完成率 約81% 金額ベース 約18% | 内陸部 箇所ベース 着手率 100% 金額ベース 100% 箇所ベース 完成率 約99% 金額ベース 約98% | 凡例 着手 (浅緑) 完成 (深緑) |

(空白)

土木部最重点項目

災害に強いまちづくり宮城モデルの構築の推進

平成29年4月末現在

津波対策※1

| 市町名 | 土木部所管 河川 | | 土木部所管 海岸(建設・港湾) | |
|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | 箇所数 | 上段：済・率(応急工事を含む工事着手) 下段：済・率(本格工事着手) | 箇所数 | 上段：済・率(応急工事を含む工事着手) 下段：済・率(本格工事着手) |
| 気仙沼市 | 7 | 7 100.0% 7 100.0% | 24 | 23 95.8% 23 95.8% |
| 南三陸町 | 10 | 10 100.0% 10 100.0% | 7 | 7 100.0% 7 100.0% |
| 石巻市 | 8 | 8 100.0% 8 100.0% | 26 | 24 92.3% 24 92.3% |
| 女川町 | 1 | 1 100.0% 1 100.0% | 9 | 9 100.0% 9 100.0% |
| 東松島市 | 4 | 4 100.0% 4 100.0% | 8 | 8 100.0% 8 100.0% |
| 松島町 | 1 | 1 100.0% 1 100.0% | 2 | 2 100.0% 2 100.0% |
| 利根町 | | | | |
| 塩竈市 | | | 12 | 8 66.7% 8 66.7% |
| 七ヶ浜町 | | | 8 | 8 100.0% 8 100.0% |
| 多賀城市 | 1 | 1 100.0% 1 100.0% | | |
| 仙台市 | 2 | 2 100.0% 2 100.0% | 3 | 3 100.0% 3 100.0% |
| 名取市 | 3 | 3 100.0% 3 100.0% | | |
| 岩沼市 | 3 | 3 100.0% 3 100.0% | | |
| 亶理町 | | | | |
| 山元町 | 2 | 2 100.0% 2 100.0% | | |
| その他6市町 | | | | |
| 合計 | 42 | 42 100.0% 42 100.0% | 99 | 92 92.9% 92 92.9% |

※1:復興事業による新設工事を含む

復興まちづくり事業

| 市町名 | 防災集団移転促進事業 | | 土地区画整理事業 | |
|-----------|------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| | 計画地区数 | 上段：済・率(造成工事着手等) 下段：済・率(住宅等建築工事可能) | 計画地区数 | 上段：済・率(工事着手) 下段：済・率(住宅等建築工事可能) |
| 気仙沼市 | 51 | 51 100.0% 50 98.0% | 3 | 3 100.0% 3 100.0% |
| 南三陸町 | 26 | 26 100.0% 26 100.0% | 1 | 1 100.0% 1 100.0% |
| 石巻市 | 56 | 56 100.0% 54 96.4% | 15 | 15 100.0% 10 66.7% |
| 女川町 | 22 | 22 100.0% 19 86.4% | 1※2 | 1 100.0% 1 100.0% |
| 東松島市 | 7 | 7 100.0% 7 100.0% | 3 | 3 100.0% 3 100.0% |
| 松島町 | | | | |
| 利根町 | | | | |
| 塩竈市 | 2 | 2 100.0% 2 100.0% | 2 | 2 100.0% 2 100.0% |
| 七ヶ浜町 | 5 | 5 100.0% 5 100.0% | 4 | 4 100.0% 0 0.0% |
| 多賀城市 | | | 1 | 1 100.0% 1 100.0% |
| 仙台市 | 14 | 14 100.0% 14 100.0% | 1 | 1 100.0% 1 100.0% |
| 名取市 | 2 | 2 100.0% 2 100.0% | 2 | 2 100.0% 2 100.0% |
| 岩沼市 | 2 | 2 100.0% 2 100.0% | 1 | 1 100.0% 1 100.0% |
| 亶理町 | 5 | 5 100.0% 5 100.0% | | |
| 山元町 | 3 | 3 100.0% 3 100.0% | | |
| その他6市町 | | | | |
| 合計 | 195 | 195 100.0% 189 96.9% | 34 | 33 97.1% 24 70.6% |

●津波復興拠点整備事業は、8市町12地区が計画され、全地区で事業認可・工事着手となっており、11地区は住宅等建築認可を4地区取得しているが、1地区として計している。
※2:釜川町は事業認可4地区取得しているが、1地区として計している。
クマフクは5月に計上する箇所数を示す

災害公営住宅の整備

| 市町名 | 災害公営住宅 | |
|-----------|---------------|--|
| | 計画戸数 | 上段：済・率(工事着手) 下段：済・率(工事完了) |
| 気仙沼市 | 2,087 | 2,087 100.0% 1,936 92.8% |
| 南三陸町 | 738 | 738 100.0% 738 100.0% |
| 石巻市 | 4,700 | 4,174 88.8% 3,712 79.0% |
| 女川町 | 860 | 827 96.2% 504 58.6% |
| 東松島市 | 1,122 | 1,001 89.2% 831 74.1% |
| 松島町 | 52 | 52 100.0% 52 100.0% |
| 利根町 | 25 | 25 100.0% 25 100.0% |
| 塩竈市 | 390 | 390 100.0% 390 100.0% |
| 七ヶ浜町 | 212 | 212 100.0% 212 100.0% |
| 多賀城市 | 532 | 532 100.0% 532 100.0% |
| 仙台市 | 3,179 | 3,179 100.0% 3,179 100.0% |
| 名取市 | 715 | 496 69.4% 219 30.6% |
| 岩沼市 | 210 | 210 100.0% 210 100.0% |
| 亶理町 | 477 | 477 100.0% 477 100.0% |
| 山元町 | 490 | 490 100.0% 490 100.0% |
| その他6市町 | 360 | 360 100.0% 360 100.0% |
| 合計 | 16,149 | 15,250 94.4% 13,867 85.9% |

※2:釜川市、栗原市、大崎市、大郷町、涌谷町、美里町

(空白)

災害公営住宅の整備状況について

(平成29年4月30日現在)

- 災害公営住宅については、平成29年4月末時点で21市町、308地区、15,541戸(前月末比±0戸)において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、21市町、304地区、15,250戸(前月末比+74戸)について着工し、21市町、281地区、13,867戸(前月末比+83戸)については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を住宅課のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/juutaku/>

○ 市町別整備状況

| 市町名 | 計画戸数 | 事業着手戸数 | | うち、工事着手戸数 | | うち、工事完了戸数 | |
|---------|---------|---------|--------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | 進捗率 | | 進捗率 | | 進捗率 |
| 01 仙台市 | 3,179戸 | 3,179戸 | 100.0% | 3,179戸 | 100.0% | 3,179戸 | 100.0% |
| 02 石巻市 | 4,700戸 | 4,302戸 | 91.5% | <u>4,174戸</u> | <u>88.8%</u> | <u>3,712戸</u> | <u>79.0%</u> |
| 03 塩竈市 | 390戸 | 390戸 | 100.0% | 390戸 | 100.0% | 390戸 | 100.0% |
| 04 気仙沼市 | 2,087戸 | 2,087戸 | 100.0% | 2,087戸 | 100.0% | <u>1,936戸</u> | <u>92.8%</u> |
| 05 名取市 | 715戸 | 643戸 | 89.9% | 496戸 | 69.4% | 219戸 | 30.6% |
| 06 多賀城市 | 532戸 | 532戸 | 100.0% | 532戸 | 100.0% | 532戸 | 100.0% |
| 07 岩沼市 | 210戸 | 210戸 | 100.0% | 210戸 | 100.0% | 210戸 | 100.0% |
| 08 登米市 | 84戸 | 84戸 | 100.0% | 84戸 | 100.0% | 84戸 | 100.0% |
| 09 栗原市 | 15戸 | 15戸 | 100.0% | 15戸 | 100.0% | 15戸 | 100.0% |
| 10 東松島市 | 1,122戸 | 1,001戸 | 89.2% | 1,001戸 | 89.2% | 831戸 | 74.1% |
| 11 大崎市 | 170戸 | 170戸 | 100.0% | 170戸 | 100.0% | 170戸 | 100.0% |
| 12 亶理町 | 477戸 | 477戸 | 100.0% | 477戸 | 100.0% | 477戸 | 100.0% |
| 13 山元町 | 490戸 | 490戸 | 100.0% | 490戸 | 100.0% | 490戸 | 100.0% |
| 14 松島町 | 52戸 | 52戸 | 100.0% | 52戸 | 100.0% | 52戸 | 100.0% |
| 15 七ヶ浜町 | 212戸 | 212戸 | 100.0% | 212戸 | 100.0% | 212戸 | 100.0% |
| 16 利府町 | 25戸 | 25戸 | 100.0% | 25戸 | 100.0% | 25戸 | 100.0% |
| 17 大郷町 | 3戸 | 3戸 | 100.0% | 3戸 | 100.0% | 3戸 | 100.0% |
| 18 涌谷町 | 48戸 | 48戸 | 100.0% | 48戸 | 100.0% | 48戸 | 100.0% |
| 19 美里町 | 40戸 | 40戸 | 100.0% | 40戸 | 100.0% | 40戸 | 100.0% |
| 20 女川町 | 860戸 | 843戸 | 98.0% | <u>827戸</u> | <u>96.2%</u> | <u>504戸</u> | <u>58.6%</u> |
| 21 南三陸町 | 738戸 | 738戸 | 100.0% | 738戸 | 100.0% | 738戸 | 100.0% |
| 計 | 16,149戸 | 15,541戸 | 96.2% | <u>15,250戸</u> | 94.4% | <u>13,867戸</u> | <u>85.9%</u> |

※計画戸数は各市町の供給計画の見直しにより変更になることがあります。

※前月末から変更になった戸数等には下線が引いてあります。

○ 整備手法別整備状況

| | 県受託 | UR買取り | 市町建設 | 民間買取り | 民間借上げ |
|-----|--------|--------|--------|--------|-------|
| 市町数 | 9市町 | 8市町 | 15市町 | 10市町 | 1市 |
| 地区数 | 27地区 | 41地区 | 58地区 | 189地区 | 8地区 |
| 戸数 | 2,229戸 | 3,926戸 | 2,756戸 | 6,424戸 | 206戸 |

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。
