

## 東日本大震災及び令和元年東日本台風災からの復旧・復興事業の進捗状況

(令和3年6月末現在)

公共土木施設の災害復旧事業の進捗状況及び土木部最重点項目の「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」を推進するための津波対策，復興まちづくり事業，災害公営住宅の整備について，令和3年6月末現在の状況を以下のとおり取りまとめた。


### I 東日本大震災関係

#### 1 東日本大震災 災害復旧事業（県事業）

- 被災公共土木施設全体の **2,296箇所** 全てにおいて工事に着手しました。  
そのうち，**2,249箇所**（全体の約98%）が完成しています。

#### <内陸・沿岸部別>

- 内陸部は，**808箇所** 全てが完成しました。
- 沿岸部は，**1,488箇所** 全てにおいて工事に着手しました。  
そのうち，**1,441箇所**（全体の約97%）が完成しています。

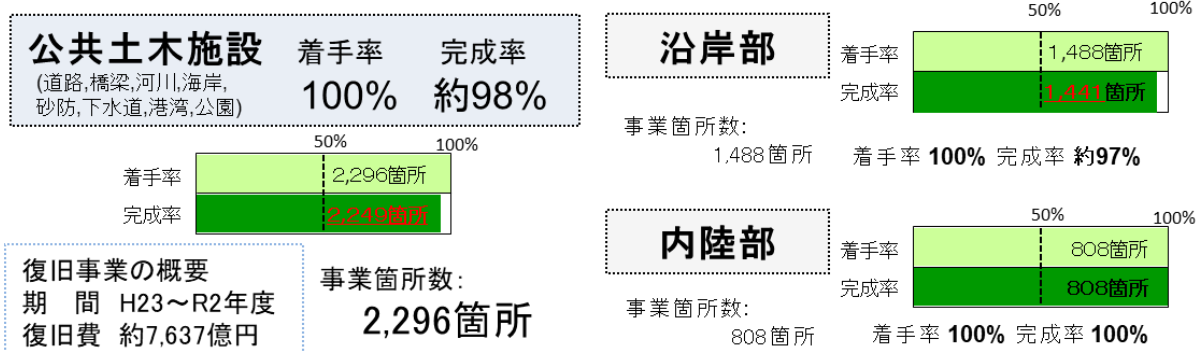

### ●公共土木施設の復旧工事の進捗状況



朴島海岸（塩竈市）



志津川海岸荒砥地区海岸（南三陸町）

※下線部分は，前月からの変更点

## 2 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築

### (1) 津波対策※

#### <河川施設>

- 全体42箇所の **全てにおいて工事に着手** しました。
- そのうち、**25箇所** (全体の約60%) が完成しています。

#### <海岸(建設・港湾)施設>

- 全体98地区海岸 **全てにおいて工事に着手** しました。
- そのうち、県全体で**82地区** (全体の約84%) が完成しています。

(※津波対策の対象施設は、災害復旧事業により実施する海岸や河川堤防のほか、復興事業により新設する堤防も含まれます。)

### (2) 復興まちづくり事業

#### <防災集団移転促進事業>

- 計画されていた12市町195地区 **全地区で住宅等建築工事可能** となっています。  
(※住宅等建築工事可能とは、造成工事が完了する等、建築工事の準備が整った状態のことをいいます。)

#### <土地区画整理事業>

- 計画されていた11市町35地区 **全地区で住宅等建築工事可能** となっています。
- 換地処分完了地区数は、そのうち、**30地区** となっています。

#### <津波復興拠点整備事業>

- 計画されていた8市町12地区 **全地区で事業完了** しています。


### (3) 災害公営住宅の整備事業

- 整備計画戸数15,823戸の**全戸で整備が完了** しています。

## Ⅱ 令和元年東日本台風関係

### 1 令和元年東日本台風 災害復旧事業（県事業）

#### ●公共土木施設の復旧工事の進捗状況



- 被災公共土木施設全体の **718箇所**のうち、**716箇所**（全体の99%）に着手しました。（残2箇所については、廃工及び契約手続き中のため、実質100%となります。）  
 工事完成箇所は、県全体で**387箇所**（全体の約54%）となっています。



(主) 気仙沼陸前高田線 (気仙沼市)



(一) 青根蔵王線 (柴田郡川崎町)



南沢川 (登米市)



湊川 (石巻市)

※下線部分は、前月からの変更点



# 令和元年

# 災

# 復旧工事

公共土木施設災 復旧事業 事業

|                                      |       |       |  |     |     |      |       |
|--------------------------------------|-------|-------|--|-----|-----|------|-------|
| <b>公共土木施設</b><br>道路橋梁 河川<br>砂防 港湾 公園 | 着手率 約 | 完成率 約 | (復旧事業の概要)<br>期間 R元～R3年度<br>復旧費 約201億円<br>事業箇所数 718箇所 | 着手率 | 50% | 100% | 716箇所 |
|                                      |       |       |  |     | 完成率 |      |       |

| 項目  | (着手・完成箇所数) / (被災箇所数)                       | 項目  | (着手・完成箇所数) / (被災箇所数)                 |
|---|--|---|--------------------------------------|
| <b>道路施設 (復旧工事)</b><br>復旧事業の概要<br>期間 R元～R3年度<br>復旧費 約61億円  | 着手率 約 162箇所<br>完成率 約 104箇所<br>事業箇所数: 164箇所 | <b>砂防施設 (復旧工事)</b><br>復旧事業の概要<br>期間 R元～R3年度<br>復旧費 約2億円 | 着手率 約 9箇所<br>完成率 約 4箇所<br>事業箇所数: 9箇所 |
| <b>橋梁施設 (復旧工事)</b><br>復旧事業の概要<br>期間 R元～R3年度<br>復旧費 約1億円   | 着手率 1箇所<br>完成率 0箇所<br>事業箇所数: 1箇所           | <b>公園施設 (復旧工事)</b><br>復旧事業の概要<br>期間 R元～R2年度<br>復旧費 約1億円 | 着手率 4箇所<br>完成率 4箇所<br>事業箇所数: 4箇所     |
| <b>河川施設 (復旧工事)</b><br>復旧事業の概要<br>期間 R元～R3年度<br>復旧費 約135億円 | 着手率 535箇所<br>完成率 約 270箇所<br>事業箇所数: 535箇所   | <b>港湾施設 (復旧工事)</b><br>復旧事業の概要<br>期間 R元～R2年度<br>復旧費 約1億円 | 着手率 5箇所<br>完成率 5箇所<br>事業箇所数: 5箇所     |

**凡例:**  着手  完成  
 (グラフ中の ■ は前月に対する増加分を示している)

# 土木部最重点項目

# 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築の推進

令和3年6月末現在

| 市町名       | 津波対策※1    |                                   |                 |                                   | 復興まちづくり事業  |  |           |  | 災害公営住宅の整備     |  |              |  |
|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|--|-----------|--|---------------|--|--------------|--|
|           | 土木部所管 河川  |                                   | 土木部所管 海岸(建設・港湾) |                                   | 防災集団移転促進事業 |  | 土地区画整理事業  |  | 災害公営住宅        |  |              |  |
|           | 箇所数       | 上段：済・率(本格工事着手)<br>下段：済・率(工事完了)    | 箇所数             | 上段：済・率(本格工事着手)<br>下段：済・率(工事完了)    | 計画地区数      | 上段：済・率(工事着手(造成工事着手等))<br>下段：済・率(住宅等建築工事可能) | 計画地区数     | 上段：済・率(工事着手(造成工事着手等))<br>下段：済・率(住宅等建築工事可能) | 計画戸数          | 上段：済・率(工事着手)                             | 下段：済・率(工事完了) |  |
| 気仙沼市      | 7         | 7 100%<br>0 0.0%                  | 24              | 24 100%<br>21 87.5%               | 51         | 51 100%<br>51 100%                         | 4         | 4 100%<br>4 100%                           | 2,087         | 2,087 100%<br>2,087 100%                 |              |  |
| 南三陸町      | 10        | 10 100%<br>5 50.0%                | 7               | 7 100%<br>7 100.0%                | 26         | 26 100%<br>26 100%                         | 1         | 1 100%<br>1 100%                           | 738           | 738 100%<br>738 100%                     |              |  |
| 石巻市       | 8         | 8 100%<br>5 62.5%                 | 26              | 26 100%<br>17 65.4%               | 56         | 56 100%<br>56 100%                         | 15        | 15 100%<br>15 100%                         | 4,456         | 4,456 100%<br>4,456 100%                 |              |  |
| 女川町       | 1         | 1 100%<br>1 100%                  | 9               | 9 100%<br>9 100%                  | 22         | 22 100%<br>22 100%                         | 1※2       | 1 100%<br>1 100%                           | 859           | 859 100%<br>859 100%                     |              |  |
| 東松島市      | 4         | 4 100%<br>3 75.0%                 | 8               | 8 100%<br>7 87.5%                 | 7          | 7 100%<br>7 100%                           | 3         | 3 100%<br>3 100%                           | 1,101         | 1,101 100%<br>1,101 100%                 |              |  |
| 松島町       | 1         | 1 100%<br>1 100%                  | 2               | 2 100%<br>2 100%                  |            |  |           |  | 52            | 52 100%<br>52 100%                       |              |  |
| 利府町       |           |                                   |                 |                                   |            |  |           |  | 25            | 25 100%<br>25 100%                       |              |  |
| 塩竈市       |           |                                   | 11              | 11 100%<br>10 90.9%               | 2          | 2 100%<br>2 100%                           | 2         | 2 100%<br>2 100%                           | 390           | 390 100%<br>390 100%                     |              |  |
| 七ヶ浜町      |           |                                   | 8               | 8 100%<br>8 100.0%                | 5          | 5 100%<br>5 100%                           | 4         | 4 100%<br>4 100%                           | 212           | 212 100%<br>212 100%                     |              |  |
| 多賀城市      | 1         | 1 100%<br>1 100%                  |                 |                                   |            |  | 1         | 1 100%<br>1 100%                           | 532           | 532 100%<br>532 100%                     |              |  |
| 仙台市       | 2         | 2 100%<br>2 100.0%                | 3               | 3 100%<br>1 33.3%                 | 14         | 14 100%<br>14 100%                         | 1         | 1 100%<br>1 100%                           | 3,179         | 3,179 100%<br>3,179 100%                 |              |  |
| 名取市       | 3         | 3 100%<br>3 100.0%                |                 |                                   | 2          | 2 100%<br>2 100%                           | 2         | 2 100%<br>2 100%                           | 655           | 655 100%<br>655 100%                     |              |  |
| 岩沼市       | 3         | 3 100%<br>3 100%                  |                 |                                   | 2          | 2 100%<br>2 100%                           | 1         | 1 100%<br>1 100%                           | 210           | 210 100%<br>210 100%                     |              |  |
| 亶理町       |           |                                   |                 |                                   | 5          | 5 100%<br>5 100%                           |           |  | 477           | 477 100%<br>477 100%                     |              |  |
| 山元町       | 2         | 2 100%<br>1 50.0%                 |                 |                                   | 3          | 3 100%<br>3 100%                           |           |  | 490           | 490 100%<br>490 100%                     |              |  |
| その他6市町    |           |                                   |                 |                                   |            |  |           |  | 360<br>※3     | 360 100%<br>360 100%                     |              |  |
| <b>合計</b> | <b>42</b> | <b>42 100%</b><br><b>25 59.5%</b> | <b>98</b>       | <b>98 100%</b><br><b>82 83.7%</b> | <b>195</b> | <b>195 100%</b><br><b>195 100%</b>         | <b>35</b> | <b>35 100%</b><br><b>35 100%</b>           | <b>15,823</b> | <b>15,823 100%</b><br><b>15,823 100%</b> |              |  |

※1:復興事業による新設工事も含む

事業計画の国交省大臣同意は全地区で得ている

※2女川町は事業認可を4箇所取得しているが、1地区として計上している。

※3:登米市、栗原市、大崎市、大郷町、涌谷町、美里町

●津波復興拠点整備事業は、計画されていた8市町12地区 全地区で事業が完了している。

グラフ中の■は先月に対する増加分を示す
