


【唐桑海岸 藤浜地区海岸】 進捗状況


事業概要

復旧延長	L=224.5m	消波ブロック(3t型)	N=600個
離岸堤(1工区)	L=68.8m		N=208個
離岸堤(2工区)	L=65.7m		N=157個
離岸堤(3工区)	L=62.5m		N=161個
離岸堤(4工区)	L=27.5m		N= 74個

計画平面図

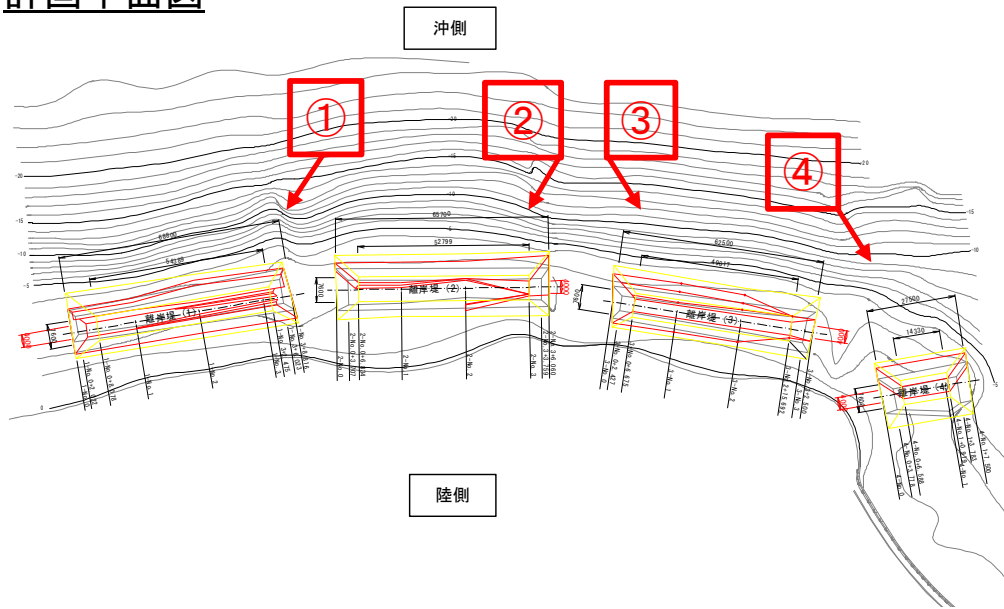

計画横断図

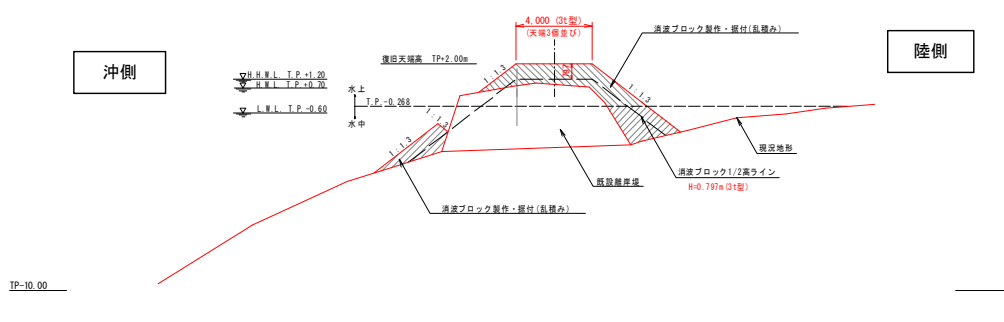

事業位置



唐桑海岸 藤浜地区海岸
気仙沼市唐桑町鮪立地先

① 着手前 平成25年3月

離岸堤(1)



② 着手前 平成25年3月

離岸堤(2)



③ 着手前 平成25年3月

離岸堤(3)



④ 着手前 平成25年3月

離岸堤(4)



【唐桑海岸 藤浜地区海岸】 進捗状況

進捗状況

平成26年1月に完成しました。

① 完成 平成26年1月完成

離岸堤(1)



② 完成 平成26年1月完成

離岸堤(2)



③ 完成 平成26年1月完成

離岸堤(3)



④ 完成 平成26年1月完成

離岸堤(4)

