

【高石浜地先海岸災害復旧工事】進捗状況

事業概要

復旧延長 L=119.7m
 護岸工 直立堤(H=3.8m ~ H=4.5m) L=50.5m
 被覆ブロック N=187個 斜路工 L=25.3m
 カルバート工 L=6.7m 消波工 N=434個


事業位置



高石浜地先海岸
 気仙沼市唐桑町松園地先

計画平面図

計画横断図

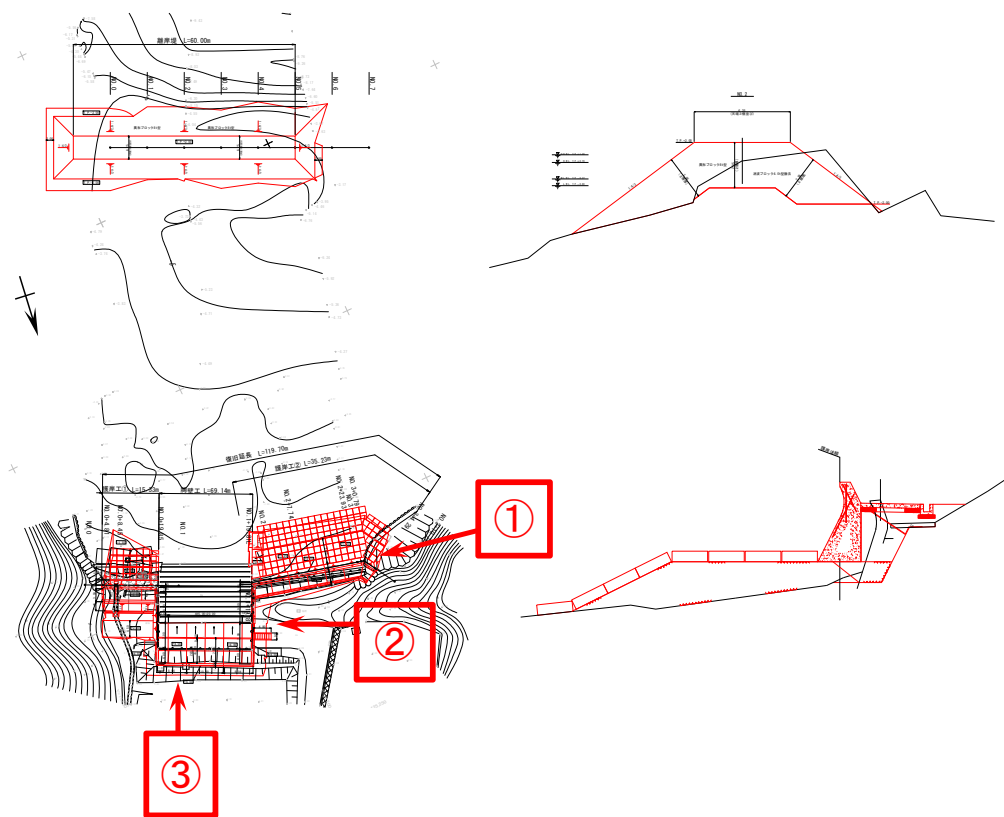

① 着手前 平成26年8月



② 着手前 平成26年8月



③ 着手前 平成26年8月



【高石浜地先海岸災害復旧工事】進捗状況

進捗状況

平成29年10月完成

① 平成29年10月完成



護岸工(西側)

② 平成29年10月完成



斜路工 および
護岸工(東側)

③ 平成29年10月完成



離岸堤(南側)
