

一級河川名取川水系 増田川 樽水ダムの効果(令和8年8月14日)【速報】

宮城県

○樽水ダムでは、令和8年8月12日から令和8年8月14日に発生した大雨により流域平均の累計雨量が77mm、**最大時間雨量16mm**を記録しました。これによるダムへの最大流入量は、計画170m³/sに対し、**20.95m³/s**を記録しております。

○今回の洪水調節により**最大流入量の99.2%(20.79m³/s)**を貯留し、下流河川の水位上昇を軽減しております。

ダムの位置図



ダムの状況写真




洪水後(14日8:00頃)

樽水ダムの洪水調節実績

・洪水調節	開始	13日 23時 20分	終了	14日 1時 40分
・ダム流域累計雨量		77 mm		(12日 14時 ~ 14日 2時)
・最大時間雨量		16 mm		(13日 23時 ~ 14日 0時)
・ダムへの最大流入量		20.95 m ³ /s		(14日 0時 10分)
・最大流入時の放流量		0.16 m ³ /s		
・ダムによる最大調節量		20.79 m ³ /s		(約 99.2%)

樽水ダムによる調節量

最大流入時に、流入量の **99.2%** をダムに貯留しました。

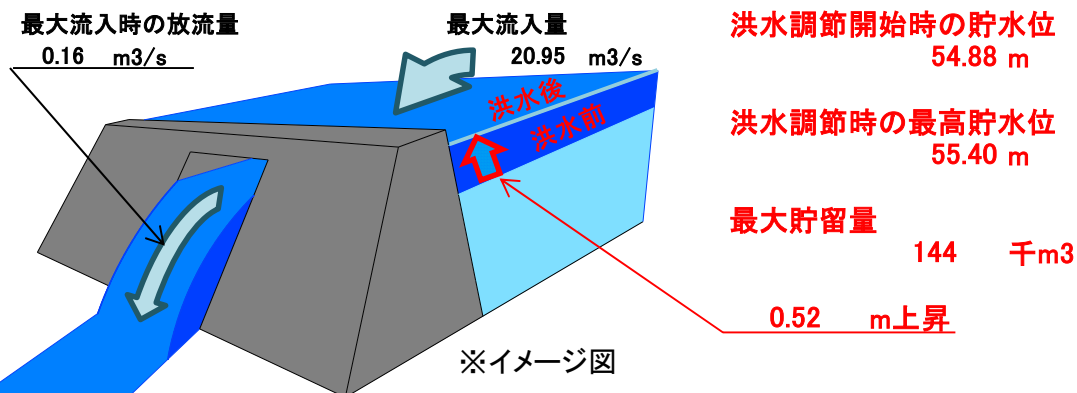

一級河川名取川水系 増田川 樽水ダムの効果(令和8年8月14日)【速報】

宮城県

○樽水ダムの洪水調節等により、この上増田地点で、**水位を約1.0m低減させる効果**があったものと推測され、河川がはん濫する危険を軽減し、増田川沿川市街地の洪水被害の防止に努めました。


河川の様況写真(洪水調節後:8月14日8:00頃)



増田川(上増田水位観測所)



増田川(上増田地点)の水位低減効果

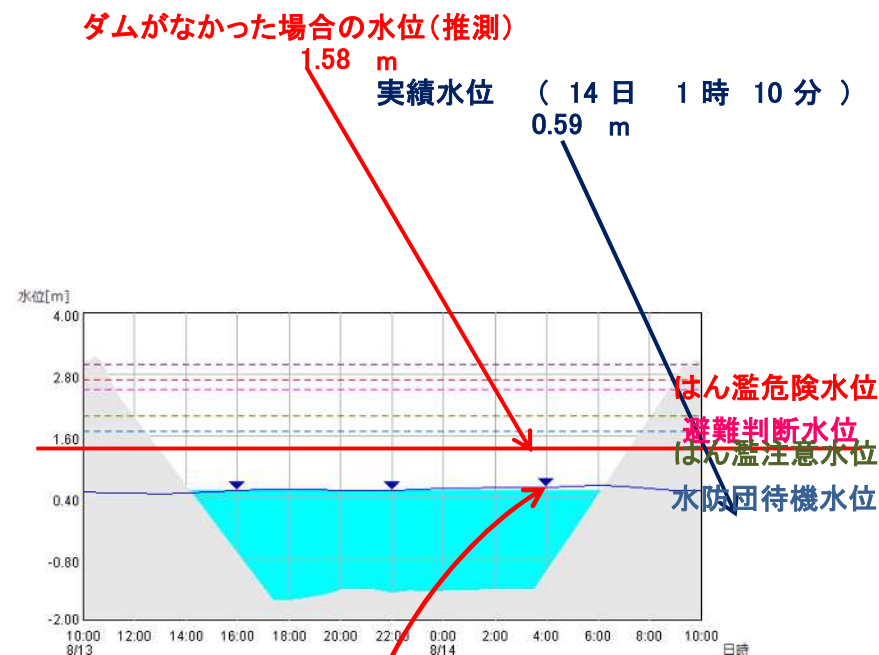

ダムにより約1.0mの
水位低減効果を推測
