

令和7年度 迫川流域下水道事業

宮城県東部下水道事務所

事業箇所処理区域名	迫川流域下水道		
	迫川		
	全体計画	認可計画	R5年度末(実績)
行政人口(人)	47,300	128,089	134,072
計画処理面積(ha)	2,186.7	1,795.5	1,480.0
計画処理人口(人)	24,400	26,163	28,399
計画処理水量(m ³ /日)	12,026	12,405	
処理能力(m ³ /日)	14,475	14,475	9,650
流入量			6,712
系列数	3	3	2
管渠延長(m)	55,470	55,470	55,470
放流渠延長(m)			
ポンプ場(箇所)	10	10	10
事業期間	H5~R17	H5~R7	
処理場名	石越浄化センター		
所在地	登米市石越町東郷		
敷地面積(ha)	7.20		
処理方式	オキシデーションディッチ法		

(目的)

栗原市(旧 築館町・若柳町・栗駒町・一迫町・鶯沢町・金成町・志波姫町・花山村)及び登米市(旧石越町)の2市を対象に、生活環境の改善並びにラムサール条約指定湖沼である伊豆沼・内沼及び迫川等の公共用水域の水質保全を図る。

(事業経過)


平成5年度 事業計画策定、都市計画決定、事業着手
 平成12年度 7月に供用開始(築館町、志波姫町、若柳町、石越町)
 平成14年度 一迫町、金成町供用開始
 第2系列供用開始
 平成15年度 幹線管渠全区間完成、栗駒町供用開始

令和6年度事業概要(実績)
 事業費 C=302百万円


令和7年度事業概要

事業費 C=302百万円
 令和6年度繰越分 C=140百万円
 交付金 C=145百万円
 県単独費 C=17百万円

迫川流域下水道

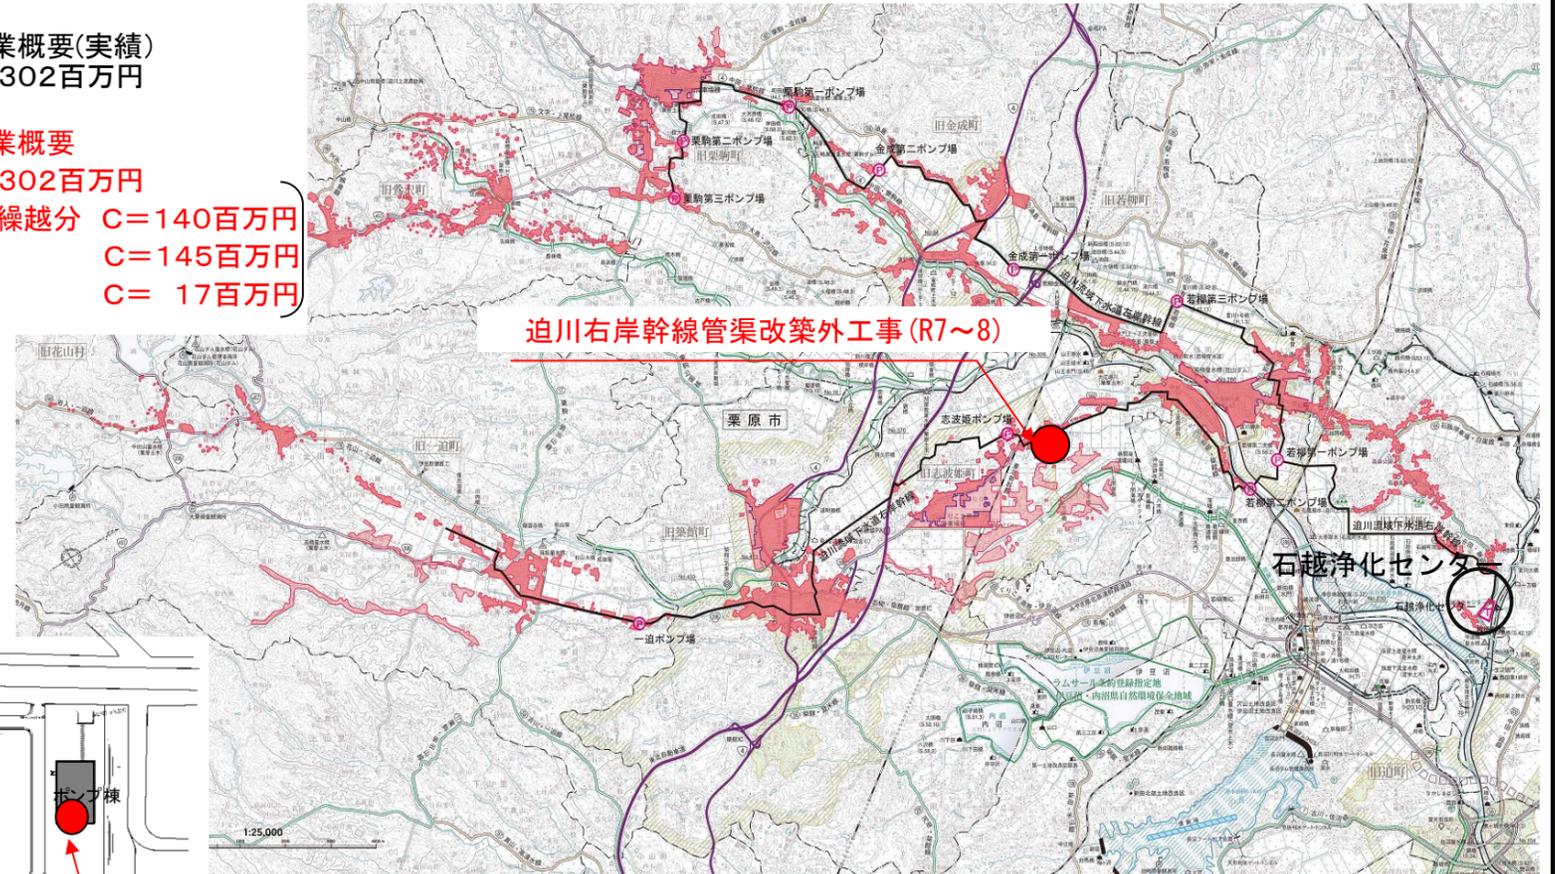

石越浄化センター一般平面図

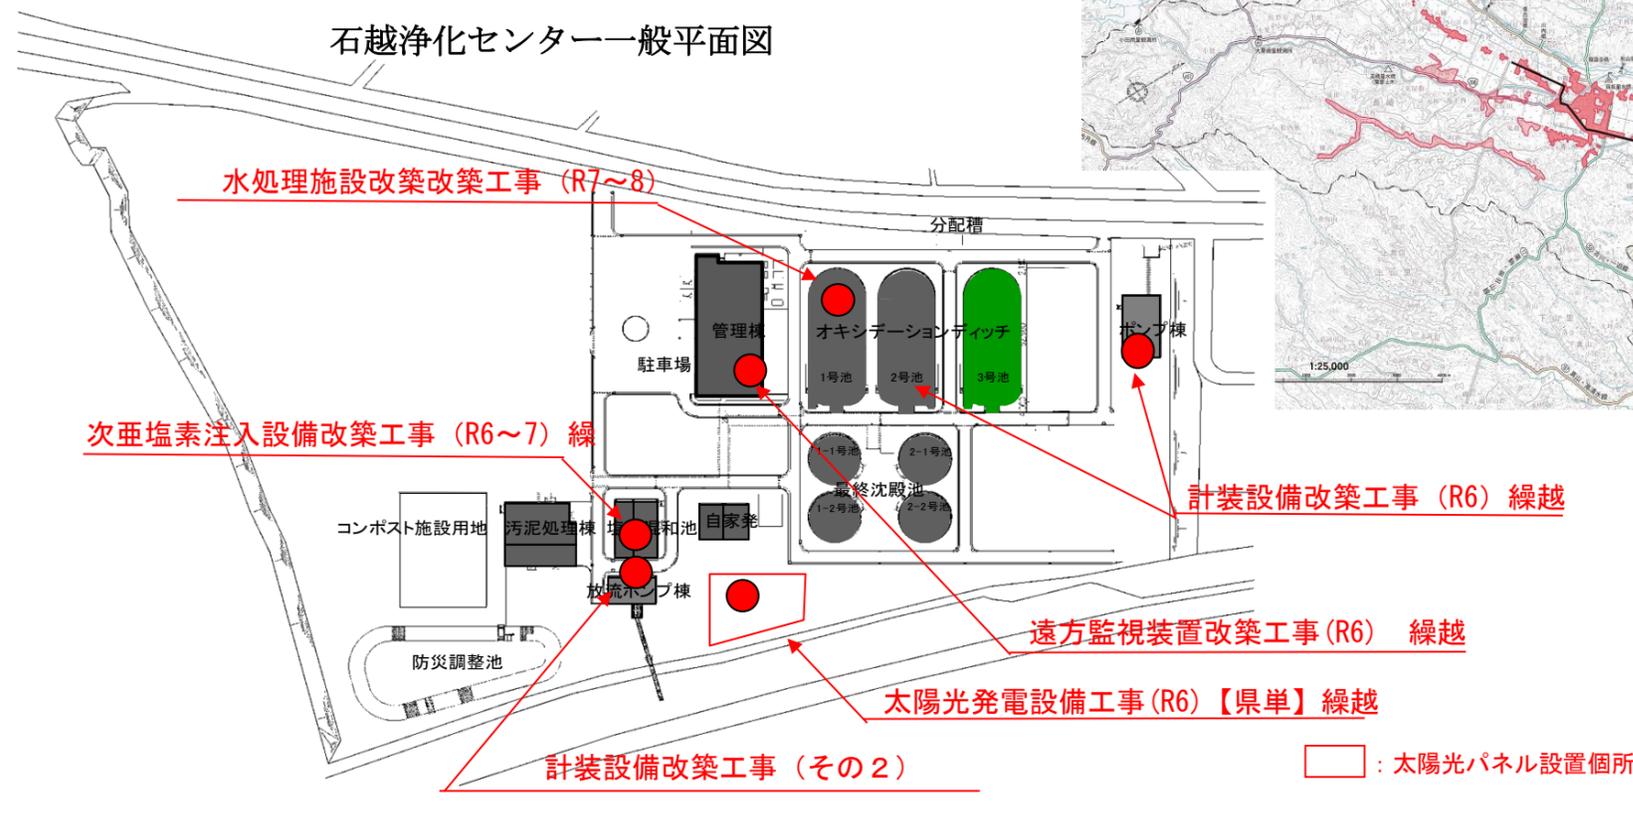

図例	計	画	区	域	
-----	行	政	区	域	
■	設	管	備	渠	
■					R5年度まで施工済み
■					R6年度(実績)
■				R7年度(実施予定)	
■	全体計画				
P	ポ	ン	プ	場	
T	終	末	処	理	
	場				
