令 和 7 年 6 月 17 日
宮 城 県 農 政 部
農村振興課広域水利調整班

農業用水の状況について （令和7年6月16日現在）

1. これまでの降水状況について

2025.4.1から
2025.6.16まで

仙台日降水量（mm/日）

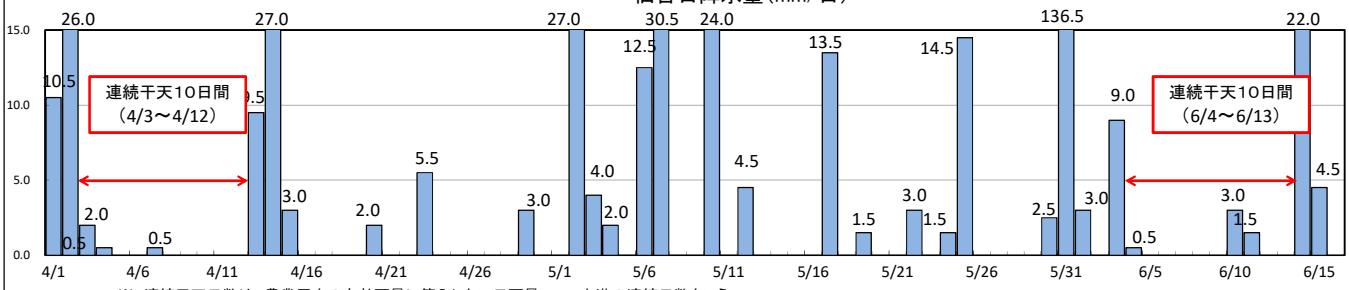

※ 連続干天日数は、農業用水の有効雨量に算入しない日雨量5mm未満の連続日数をいう。

＜今後の天候の見通し＞

◆令和7年6月12日仙台管区気象台発表の東北地方の1か月予報（令和7年6月14日～令和7年7月13日）によると、平年と同様に曇りや雨の日が多く、降水量はほぼ平年並の見込みです。
・向こう1か月降水量確率　『少ない：30%、平年並：40%、多い：30%』

2. 県内主要ダムの貯水状況

◆県内の主要ダム17か所の6月16日時点の平均貯水率は75．4%（前回6月2日調査：85．9%）で、平年比は106．4%となっています。

2025.6.16現在

ダム名（完成年月）	河川名（かんがい補給面積ha）	利水容量 ①（千m3）	現在の貯水量 ②（千m3）	貯水率 ②/①	傾向	流域面積 流入量（m3/s）	放流量（m3/s）	平年貯水量 ③（千m3）	平年比 ②/③	備 考
栗駒ダム（S37.3）	三迫川 3,079	EL 198.00m 7,618	EL 191.93m 4,471	**58.7%**	↓	53.0 km2 2.61	5.04	EL 191.80m 4,414	**101.3%**	
荒砥沢ダム（H10.11）	二迫川 1,989	EL274.40m 11,969	EL 265.29m 7,041	**58.8%**	↓	20.4 km2 0.58	1.39	EL 263.33m 6,159	**114.3%**	
花山ダム（S33.1）	迫川 8,845	EL 124.60m 22,000	EL 119.99m 13,795	**62.7%**	↓	126.9 km2 4.55	8.20	EL 120.35m 14,415	**95.7%**	
小田ダム（H18.3）	長崎川 1,112	EL 163.50m 8,000	EL 159.50m 5,096	**63.7%**	↓	23.4 km2 0.63	1.25	EL 158.54m 4,528	**112.5%**	
菅生ダム（H7.3）	小山田川 619	EL 164.20m 1,370	EL 162.07m 1,010	**73.7%**	↓	4.3 km2 0.03	0.03	EL 161.25m 890	**113.4%**	
宿の沢ダム（H16.3）	宿の沢川 314	EL 45.70m 1,170	EL 44.20m 878	**75.0%**	↓	1.3 km2 0.12	0.12	EL 42.99m 665	**132.0%**	
鳴子ダム（S32.10）	江合川 9,618	EL 254.00m 33,000	EL 245.20m 17,098	**51.8%**	↓	210.1 km2 6.82	11.24	EL 244.71m 16,328	**104.7%**	
岩堂沢ダム（H21.9）	岩堂沢 807	EL407.50m 13,000	EL 407.50m 13,000	**100.0%**	→	10.1 km2 0.19	0.13	EL 405.02m 11,395	**114.1%**	
二ツ石ダム（H21.3）	二ツ石川 1,039	EL239.00m 9,700	EL 238.99m 9,695	**99.9%**	→	19.1 km2 0.28	0.21	EL 236.00m 8,163	**118.8%**	
漆沢ダム（S56.3）	鳴瀬川 9,225	EL270.50m 12,100	EL 266.60m 9,577	**79.1%**	↓	58.9 km2 2.28	4.85	EL 264.89m 8,518	**112.4%**	
南川ダム（S63.3）	南川 1,210	EL 94.20m 4,800	EL 93.61m 4,409	**91.8%**	↓	22.5 km2 0.00	0.95	EL 92.42m 3,656	**120.6%**	
宮床ダム（H12.3）	宮床川 513	EL 98.00m 3,000	EL 94.83m 2,153	**71.8%**	↓	10.8 km2 0.00	0.37	EL 93.22m 1,794	**120.0%**	
七北田ダム（S60.3）	七北田川 1,574	EL 243.00m 5,800	EL 239.98m 4,663	**80.4%**	↓	20.0 km2 0.13	1.13	EL 238.56m 4,179	**111.6%**	
大倉ダム（S37.3）	大倉川 2,674	EL 270.60m 25,000	EL 266.96m 19,513	**78.0%**	↓	88.5 km2 3.18	5.55	EL 265.95m 18,167	**107.4%**	
釜房ダム（S45.12）	碁石川 3,062	EL 149.80m 32,523	EL 146.35m 21,151	**65.0%**	↓	195.3 km2 1.72	9.85	EL 146.40m 21,297	**99.3%**	
村田ダム（S55.3）	荒川 482	EL 119.00m 1,507	EL 118.76m 1,468	**97.4%**	→	8.5 km2 0.19	0.23	EL 117.10m 1,245	**117.9%**	
七ヶ宿ダム（H4.3）	白石川 2,800	EL 293.50m 64,500	EL 291.50m 58,799	**91.2%**	↓	236.6 km2 6.75	9.22	EL 290.67m 56,327	**104.4%**	
計(17)	48,962	257,057	193,817	**75.4%**				182,142	**106.4%**	

※貯水量は午前9時現在値である。「傾向」は前回貯水量に対する現在貯水量の変化を示したもの。→：±5.0%、↑：+5.1%以上、↓：−5.1%以上

3. 県内主要ため池の貯水状況

◆県内のため池は約5，400か所で、主要なため池9か所の6月16日平均貯水率は90．9%（前回6月2日調査：97．5%）、平年比は、129．5%（前回6月2日調査：130．7%）です。

2025.6.16現在

ため池名	河川名（設置河川）	市町村名	受益面積 (ha)	満水貯水量 ①(千m3)	現在貯水量 ②(千m3)	**貯水率 ③=②／①**	平年貯水率 ④	**平年比 ③／④**	傾　向※
高松溜池	二迫川（　－　）	栗原市	40	103.0	103.0	**100.0%**	92.0%	**108.6%**	→
菖蒲沢溜池	沖ノ田川（沖ノ田川）	気仙沼市	156	141.0	119.3	**84.6%**	81.7%	**103.5%**	↓
海上連溜池	夏川（　－　）	登米市	30	78.5	78.5	**100.0%**	100.0%	**100.0%**	→
孫沢溜池	孫沢川（孫沢川）	加美町	607	685.0	601.9	**87.9%**	71.6%	**122.7%**	↓
釜谷溜池	北上川（　－　）	石巻市	47	184.0	152.0	**82.6%**	60.3%	**136.9%**	↓
牛野ダム	吉田川（善川）	大衡村	600	500.0	470.0	**94.0%**	73.2%	**128.3%**	↓
愛子ダム	広瀬川（斉勝川）	仙台市	536	1,080.0	736.0	**68.1%**	41.9%	**162.8%**	↓
嘉太神ダム	吉田川（　－　）	大和町	650	719.0	719.0	**100.0%**	75.9%	**131.8%**	→
川原子ダム	白石川（川原子沢川）	白石市	277	2,150.0	2,150.0	**100.0%**	79.4%	**126.0%**	→
9 施設　計			2,943	5,640.5	5,129.7	**90.9%**	70.2%	**129.5%**	↓

※貯水量は午前9時現在値である。「傾向」は前回貯水量に対する現在貯水量の変化をしたもの。→：±5.0%、↑：+5.1%以上、↓：−5.1%以上

※例年は、10か所のため池で観測していますが、工事等を実施している1か所（内町溜池）を除いています。

4. 仙台観測所の月別降水量と降雪量

◆仙台観測所における令和7年6月16日までの今年の累計降水量は、平年比119．4%となっています。

（表－3）降水量　2025.6.16まで

月区分	**R7 (mm)**	前年（R6） (mm)	渇水年(H6) (mm)	**平年 (mm)**	平年比 (%)
1　月	27.0	82.5	11.0	**42.3**	63.8%
2　月	7.0	39.0	52.5	**33.9**	20.6%
3　月	66.0	104.5	80.5	**74.4**	88.7%
4　月	89.5	100.5	6.5	**90.2**	99.2%
5　月	277.5	82.0	111.0	**110.2**	251.8%
6　月	43.5	93.0	79.0	**143.7**	30.3%
7　月		130.0	61.0	**178.4**	0.0%
8　月		127.0	102.5	**157.8**	0.0%
9　月		140.0	638.5	**192.6**	0.0%
10　月		82.0	61.5	**150.6**	0.0%
11　月		43.5	5.5	**58.7**	0.0%
12　月		3.5	29.5	**44.1**	0.0%
合　計	**510.5**	1,028	1,239	(427.6)　**1,276.9**	(119.4%)　40.0%

※アメダスデータによる。　※（）内は6月16日までの合計値

（表－4）降雪量　2025.4.1まで

月区分	**R7 (cm)**	前年(R6) (cm)	渇水年(H6) (cm)	**平年 (cm)**	平年比 (%)
11月(前年)	**0**	0	0	**0**	―
12月(前年)	**0**	2	11	**9**	0.0%
1　月	**12**	16	14	**21**	57.1%
2　月	**13**	20	19	**18**	72.2%
3　月	**5**	9	0	**11**	45.5%
4　月	**0**	0	0	**1**	0.0%
小　計	**30**	47	44	**60**	50.0%

※アメダスデータによる。

5. 主要ダム近傍の積雪深（1月～3月）

◆主要ダム近傍（10か所）の積雪深を比較すると、令和7年3月31日時点の積雪深さは**4．0cm**で、過去10年の平均値を下回っています。

（表－5）ダム近傍の積雪深　2025.3.31まで

ダム名	観測地点	積雪深(cm) R7 1/6	R7 2/3	R7 3/3	R7 3/31	平均 1/1	平均 2/1	平均 3/1	平均 3/31	平均比 3/31現在
栗駒ダム	玉山	**5.0**	**13.0**	**0.0**	**0.0**	**15.1**	**17.5**	**9.9**	**0.6**	0.0%
荒砥沢ダム	耕英	**126.0**	**158.0**	**200.0**	**35.0**	**64.2**	**118.4**	**108.6**	**30.0**	116.7%
花山ダム	花山	**1.0**	**4.0**	**0.0**	**0.0**	**16.8**	**22.6**	**9.1**	**0.6**	0.0%
菅生ダム	築館	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**2.2**	**1.9**	**0.2**	**0.7**	0.0%
鳴子ダム	鳴子	**30.0**	**63.0**	**79.0**	**4.0**	**41.1**	**68.3**	**70.1**	**24.7**	16.2%
漆沢ダム	漆沢	**47.0**	**59.0**	**109.0**	**1.0**	**59.7**	**94.1**	**71.5**	**4.0**	25.0%
南川ダム	嘉太神	**51.0**	**57.0**	**63.0**	**0.0**	**46.7**	**64.8**	**34.8**	**0.0**	0.0%
大倉ダム	作並	**42.0**	**50.0**	**57.0**	**0.0**	**29.3**	**50.1**	**37.9**	**2.0**	0.0%
釜房ダム	川崎	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**5.7**	**9.7**	**2.1**	**0.5**	0.0%
七ヶ宿ダム	関	**3.0**	**10.0**	**15.0**	**0.0**	**20.2**	**44.7**	**26.6**	**1.0**	0.0%
10か所平均値		**30.5**	**41.4**	**52.3**	**4.0**	**30.1**	**49.2**	**37.1**	**6.4**	62.4%

※積雪深は、当該ダム近傍の道路観測点データ（道路課HP）である。

6. 主要河川の河川水位

◆主要河川の河川水位は、前回に比べ全ての地点で減少傾向となっています。

（表－6）主要河川の河川水位　2025.6.16現在

河川名	観測地点	渇水年等 (m) H6/8/18	渇水年等 (m) H13/5/8	渇水年等 (m) H18/8/27	R7年(m) 5／7	R7年(m) 5／15	R7年(m) 6／2	**6／16**
北上川	大泉	−1.01	0.36	−0.62	0.77	0.94	0.91	**0.03**
旧北上川	和渕	1.22	1.65	1.63	1.89	1.65	2.37	**1.48**
迫川	剣先	―	1.63	1.50	1.83	1.77	2.50	**1.55**
旧迫川	三方江	―	―	2.70	2.71	2.64	4.19	**2.68**
江合川	涌谷	0.38	0.96	0.40	1.04	0.85	1.20	**0.58**
鳴瀬川	野田橋	−0.30	0.70	0.31	0.74	0.48	0.89	**0.42**
吉田川	粕川	0.60	0.88	0.86	1.18	0.97	1.55	**1.03**
七北田川	岩切	―	0.41	0.29	0.00	0.00	0.05	**0.00**
広瀬川	広瀬橋	―	−1.00	−0.96	−0.94	−1.06	−0.96	**−1.17**
名取川	名取橋	―	―	―	3.82	3.64	4.06	**3.64**
白石川	船岡大橋	―	8.24	8.05	8.12	8.07	8.19	**8.05**
阿武隈川	舘矢間	―	15.56	15.31	15.18	15.07	15.20	**15.39**

※観測値は当該日毎時刻の最低値データである。

7. 県内各河川施設の取水状況について

◆主要河川の17取水施設の取水割合は75．7%となっています。

（表－7）県内各河川施設の取水状況　2025.6.16現在

河川名	取水施設名	かんがい区域	受益面積 (ha)	水利権水量（m3/S） 代かき期(最大)	水利権水量（m3/S） 普通期	水利権水量（m3/S） 非かんがい期	現在の水利権水量	取水割合 (%)	備考
北上川	大泉揚水機	登米市	2,467	9.147	8.133	3.334	8.133	77.8%	
旧北上川	中山揚水機	石巻市・東松島市	3,111	8.883	7.309	2.800	7.309	91.0%	
三迫川	軽辺頭首工	栗原市	1,057	3.569	2.678	0.847	2.678	37.8%	
迫川	伊豆野頭首工	栗原市	2,182	7.674	6.749	2.012	6.749	62.9%	
迫川	山吉田揚水機	登米市	2,202	7.980	5.450	−	5.450	72.7%	
江合川	大堰頭首工	大崎市	3,368	11.504	6.767	2.497	6.767	80.4%	
江合川	三丁目頭首工	大崎市・美里町	4,069	11.362	8.074	2.198	8.074	80.5%	
江合川	佐平治揚水機場	涌谷町	280	0.866	0.571	−	0.571	87.6%	
鳴瀬川	下流頭首工(右岸)	大崎市・松島町	565	3.390	2.146	0.800	2.146	62.5%	
鳴瀬川	下流頭首工(左岸)	美里町・大崎市	2,568	9.273	5.238	3.238	5.238	70.6%	
鳴瀬川	才勝筒揚水機	東松島市	233	0.590	0.400	−	0.400	46.8%	
吉田川	若針揚水機	東松島市	260	0.500	0.300	−	0.300	36.7%	
吉田川	行井堂堰	大郷町	300	1.000	0.878	0.600	0.878	0.0%	取水停止日
広瀬川	愛宕堰	仙台市	2,145	7.139	5.195	−	5.195	77.0%	
名取川	名取川頭首工	仙台市・名取市・岩沼市	2,681	7.251	6.305	4.209	6.305	91.0%	
白石川	内親堰	柴田町	297	1.146	0.858	0.560	0.858	88.2%	
阿武隈川	坪石揚水機	角田市	767	2.440	1.220	1.000	1.220	100.0%	
17施設　計			28,551				68.271	75.7%	

※取水割合は，午前9時（現在）の取水量を基に（現在の取水量/現在の水利権水量）算出したものである。
